



УДК 624.21—15:625.745.12(083.96)

МОНТАЖ СБОРНЫХ ОПОР АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на основе применения методов научной организации труда и предназначена для использования при разработке проектов производства работ и организации труда на объекте.

Карта составлена на строительство сборных опор высотой 6—12 м под автодорожные пролетные строения 20 и 30 м в соответствии с типовым проектом Ленгипротрансмоста инв. № 238, выпуск 1962 г.

Монтаж сборных элементов осуществляется автомобильным краном К-104 с удлиненной стрелой. Полости опор заполняют бетонными блоками или монолитным бетоном (рис. 1).

Контурные блоки-оболочки имеют узкую нижнюю постель с нижним скосом с внутренней стороны, толщина стенок оболочек 40 см, высота—50 см (эта высота может быть и больше 50 см, в зависимости от мощности кранового оборудования и других местных условий).

Помимо основных блоков-оболочек предусмотрены железобетонные переходные блоки, укладываемые в местах изменения размеров опор, и подферменные блоки.

Ригели (подферменники) опор представляют собой консоли коробчатого сечения, открытые сверху.

Полости коробок заполняют бетонной смесью с предварительной укладкой в них арматурных каркасов.

Консоли состоят из четырех железобетонных блоков. При наличии соответствующего кранового оборудования консоли можно изготовлять двухблочными и одноблочными.

В карте приведены три варианта монтажа ригеля.

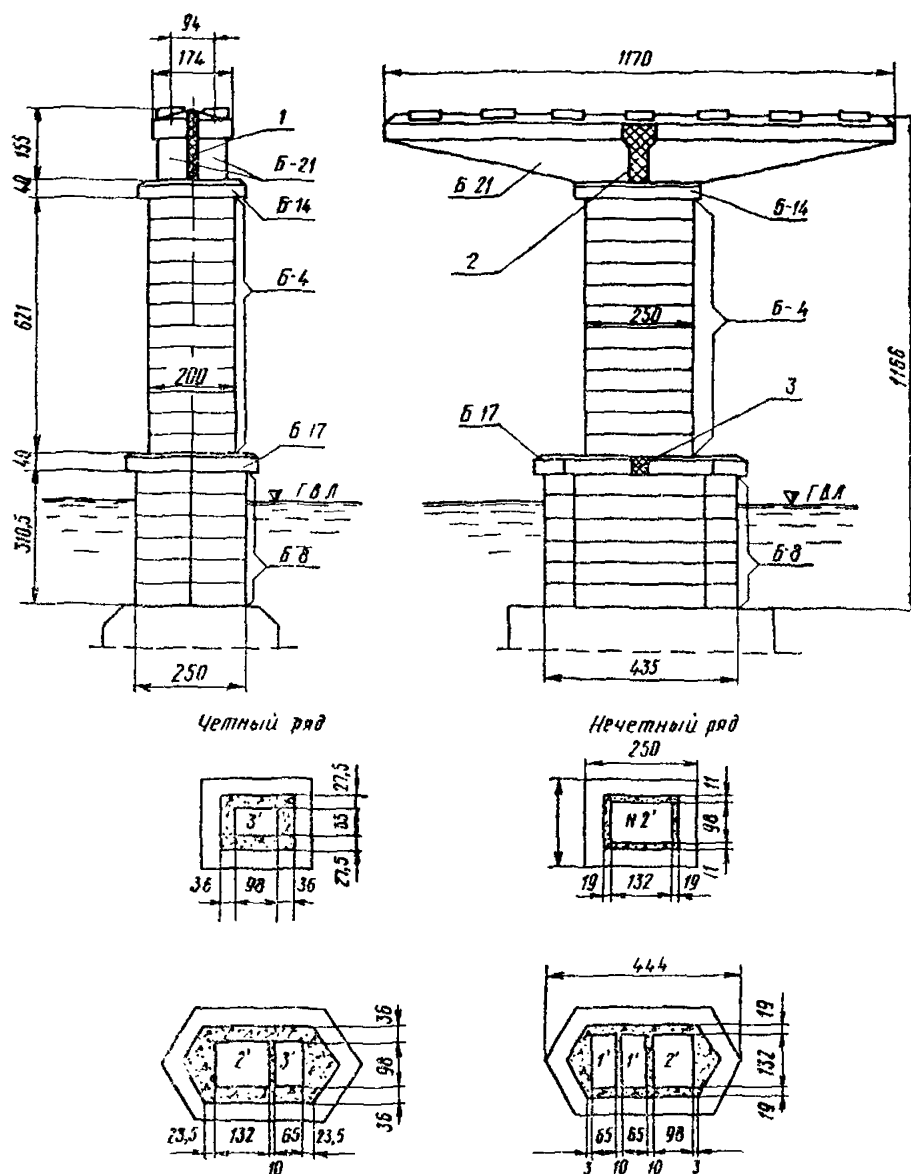


Рис. 1. Общий вид опоры:

1—продольный шов ригеля; 2—поперечный шов ригеля; 3—шов прокладного ряда; Б-4, Б-8—блоки-оболочки; Б-14, Б-17—переходные блоки; Б-21—блоки ригеля; 1', 2', 3'—блоки заполнения

Применяемые контурные блоки-оболочки и бетонные блоки заполнения для сооружения двух ярусов опоры характеризуются следующими данными:

| № бло-ков | Наименование | Размер блоков, см | Материал | Объем блока, м³ | Вес блока, т | Количество блоков на опору | Общий объем, м³ |
|-----------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| 4 | Контурные блоки-оболочки | 200×250×50 | Железобетон марки 300 | 1,28 | 3,1 | 12 | 15,4 |
| 8 | То же | 250×435×50 | То же | 1,8 | 4,3 | 6 | 10,8 |

| № бло- ков | Наименование | Размер блоков, см | Материал | Объем блока, м ³ | Вес блока, т | Коли- чество блоков на опору | Общий объем, м ³ |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| 14 | Переходные блоки | 220×270×40 | Железо- бетон марки 300 | 1,98 | 1,7 | 1 | 1,98 |
| 17 | То же | 270×213×40 | То же | 1,44 | 3,6 | 2 | 2,88 |
| Итого | | | | | | | 21 |
| 1 | Блоки заполнения | 65×132×50 | Бетон марки 150 | 0,43 | 1,1 | 6 | 2,55 |
| 2 | То же | 98×132×50 | То же | 0,65 | 1,6 | 11 | 7,15 |
| 3 | » | 65×98×50 | » | 0,32 | 0,8 | 8 | 2,6 |
| Итого | | | | | | | 25 |
| 21 | Блоки ригеля | 565×74×140 | Железо- бетон марки 400 | 1,6 | 4,0 | 2 | 3,2 |
| 21а | То же | | То же | 1,6 | 4,0 | 2 | 3,2 |
| Итого | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 6,4 |

Опору сооружают в шпунтовом ограждении. Работы по сооружению фундамента, подферменников, рабочих мостиков, изготовлению и транспортировке бетона и раствора, расшивке швов опоры в карте не учтены.

Объемы работы в калькуляции взяты из чертежей и сводных ведомостей проекта инв. № 238.

Калькуляция составлена на основании единых норм и расценок на строительные и монтажные работы (Сборники 4—4, 5—4 выпуска 1969 г.) и наблюдений Новосибирской НИС.

Элементы доставляют по воде, причем очередность заезда должна быть увязана с технологической последовательностью их монтажа.

Все работы по сооружению опоры осуществляются поточно-звеньевым методом комплексной бригады в составе 9 чел., состоящей из двух звеньев, оснащенных необходимыми механизмами и приспособлениями.

До начала монтажа опор должны быть выполнены работы по возведению фундаментов и сооружению рабочих мостиков или установке автокрана на плавсредства.

Привязка карты к местным условиям строительства состоит в уточнении объемов работ, затрат труда и материально-технических ресурсов.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

А. Сооружение тела опоры при блочном заполнении ядра

Перед монтажом опоры из блоков-оболочек проверяют отметки и разбивку осей опоры.

Первый нижний ряд блоков должен быть уложен на подготовленное по нивелиру основание. Последующие ряды укладывают по уровню и отвесу с перевязкой швов и выравниванием по наружным видимым граням опор. Через каждые 4—5 рядов верх возводимой кладки нивелируют. Отклонения блоков по высоте в рядах (уступы) не должны превышать 0,5 см; в кордонных камнях уступы не допускаются. Блоки следует укладывать на слой раствора всей постелью сразу в проектное положение. Дополнительная подливка раствора под блок, а также его смещение после схватывания раствора не допускается.

Неправильно установленный блок должен быть удален, очищен от раствора и поставлен на очищенную и покрытую свежим раствором поверхность.

Оболочки укладывают друг на друга на цементном растворе марки 200 со средней толщиной шва 1,5 см.

Толщина отдельных швов должна быть не более 20 и не менее 10 мм.

Блоки заполнения устанавливают после установки двух последующих рядов блоков-оболочек.

Блоки заполнения укладывают на пластичном цементном растворе марки 100.

После монтажа нижнего яруса опоры устанавливают нижний переходной железобетонный блок, состоящий из двух половинок, монолитизируемых на месте.

По окончании установки переходного блока монтируют второй ярус опоры из прямоугольных блоков-оболочек с последующим заполнением блоками; после этого устанавливают верхний железобетонный переходной блок.

Все вертикальные швы, а также пространство между оболочками и блоками заполняют бетонной смесью с тщательным уплотнением вибраторами.

Перед монтажными работами все сборные элементы должны быть обязательно осмотрены для проверки соответствия их марок, фактических размеров, а также пригодности для укладки их в сооружение.

Допускаемые отклонения от проектных размеров в элементах сборных конструкций не должны превышать по высоте ± 5 мм, по остальным измерениям ± 10 мм.

Поверхности укладываемых элементов должны быть очищены.

Марка раствора должна соответствовать проектной и быть не ниже 150, а водо-цементное отношение в пределах 0,45—0,6. Крупность зерен песка не должна превышать 2,5 мм, подвижность раствора (осадка конуса) в пределах 6—8 см для горизонтальных швов и 11—13 см—для вертикальных. Для блоков заполнения можно использовать раствор марки 100.

Раствор тщательно уплотняют плоской штыковкой длиной 70 см, шириной 10 см и толщиной 4 мм. Наружные швы расширяют по окончании сооружения опоры (в теплое время года) жестким цементно-песчаным раствором марки 300 с инвентарных передвижных подмостей после заполнения полости опор.

После этого швы зачеканивают раствором с оформлением наружной поверхности по вогнутому или выпуклому мениску.

При разработке в зимних условиях при температуре ниже -15°C можно омоноличивать сборные конструкции цементно-песчаным раствором с солевыми добавками без прогрева монтируемых блоков и без последующего укрытия или обогрева конструкции. Подвижность раствора при этом должна быть в пределах 3—8 см для горизонтальных швов омоноличивания и 2—4 см—для расшивки вертикальных и горизонтальных швов.

Работы с применением цементно-песчаного раствора, твердеющего на морозе, разрешается производить только под контролем лаборатории.

При температурах от -15° до -40°C наружные поверхности опоры защищают утеплителем, а блоки отогревают и укрывают с таким расчетом, чтобы раствор швов набрал прочность не ниже 50 кг/см^2 до понижения его температуры ниже -15°C .

Б. Сооружение тела опоры при монолитном заполнении ядра

При монолитном заполнении нижний ярус сооружают на полную высоту с установкой переходного блока. Ядро опоры заполняют бетонной смесью до переходного ряда.

Ядро второго яруса заполняют после укладки каждой трех оболочек.

Укладку бетонной смеси ведут с легких переставных подмостей (рис. 2).

Бетонную смесь уплотняют глубинными вибраторами.

При заполнении ядра бетонной смесью необходимо для уменьшения трещинообразования опор применять бетон марки не выше 150 с содержанием цемента не более 280 кг/м³ и водо-цементным отношением не более 0,45.

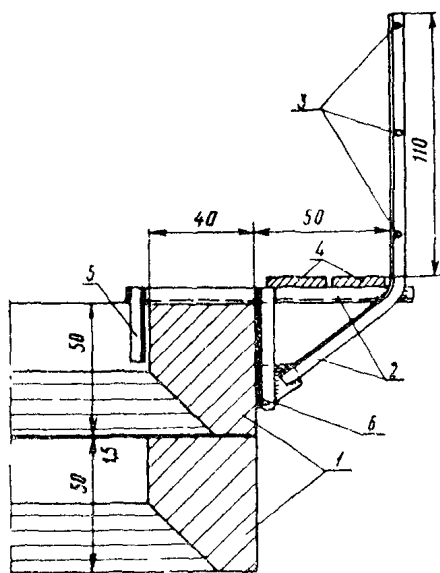


Рис. 2. Пересаживаемые подмости:
1—блок-оболочка; 2—переставные подмости;
3—перильное заполнение; 4—настил из
досок; 5—уголок-фиксатор, 6—шпиль-фиксатор

В качестве вяжущих при заполнении полости опор бетонной смесью можно применять портландцемент, пластифицированный портландцемент, сульфатостойкий пуццолановый портландцемент, глиноземистый цемент марок не выше 300, удовлетворяющий требованиям СНиП и действующих ГОСТ.

Для повышения пластичности смеси рекомендуется применять поверхностно-активные пластифицирующие добавки. Вид и дозировку добавок следует устанавливать по данным лаборатории в зависимости от физико-механических характеристик применяемого цемента. В состав смеси также рекомендуется вводить воз-

духововлекающие или газообразующие добавки, дозировка которых устанавливается проектной лабораторией.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной не более 30 см на всю высоту яруса опоры без перерыва бетонирования.

Заполнение ядра бетонной смесью при температуре наружного воздуха выше -15°C ведут без утепления наружной поверхности опоры. После монтажа очередного яруса верх опоры закрывают инвентарным утепленным перекрытием с люками для подачи бетонной смеси. Внутренние поверхности блоков обогревают горячим воздухом или паром, затем заполняют ядро бетонной смесью, имеющей температуру в момент укладки не ниже $+15^{\circ}\text{C}$.

При температуре воздуха от -15°C и ниже ядро бетонируют в тепляке до набора бетоном не менее 70% проектной прочности.

В качестве инвентарных утеплителей рекомендуется применять мягкие переносные тепляки, состоящие из набора по-

лотнищ, сшитых из двух слоев брезента с прокладкой толя, тонкого слоя войлока или шлаковаты. Полотнища соединяют на застежках и подвешивают к верхнему перекрытию.

Монтаж ригеля

Ригель опоры представляет собой консоли коробчатого сечения открытые сверху. Полости коробок заполняют бетонной смесью с предварительной укладкой арматурных каркасов.

Консоли состоят из четырех железобетонных блоков. При наличии соответствующего кранового оборудования консоли можно изготовлять двухблочными и одноблочными.

В карте разработаны три варианта сооружения ригеля.

В а р и а н т I

Сборка ригеля из четырех блоков выполняется в следующей последовательности (рис. 3):

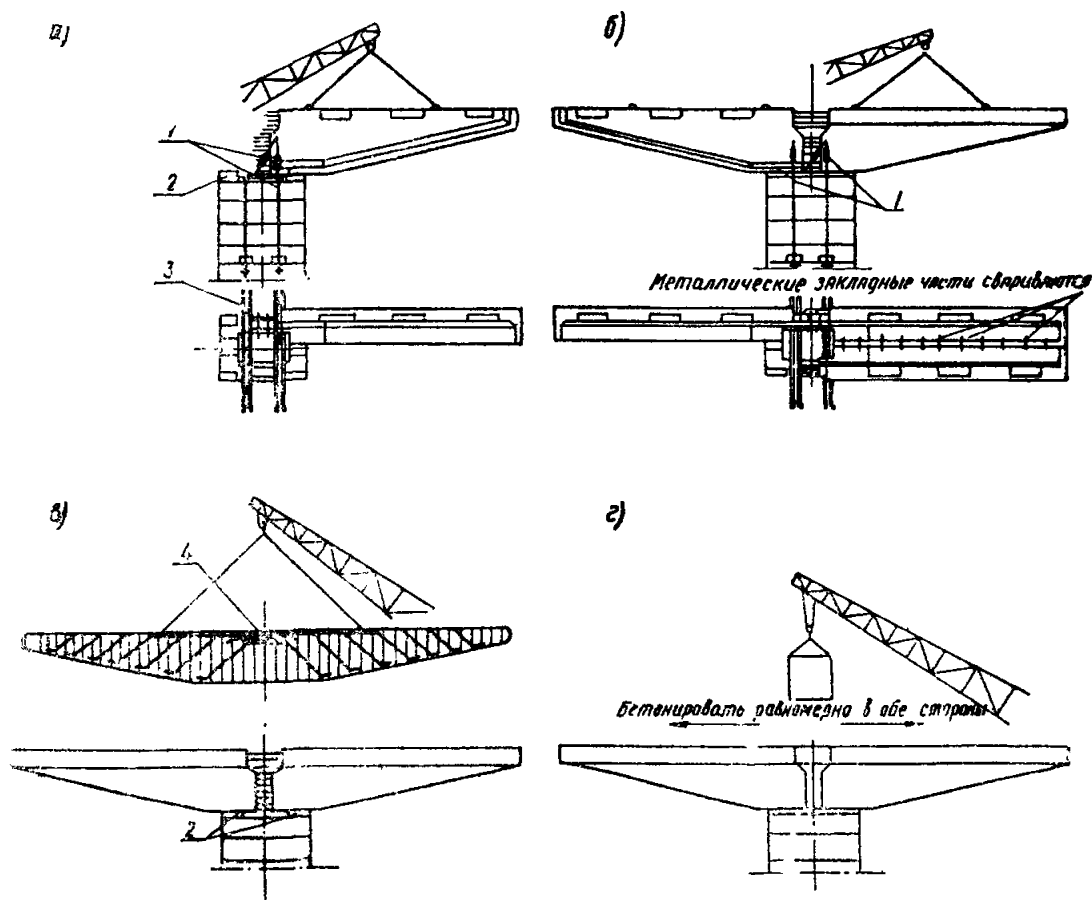


Рис. 3. Монтаж ригеля:

а—установка первого блока; б—установка третьего блока; в—установка арматурного каркаса; г—бетонирование ригеля; 1—металлические тяги; 2—бетонные прокладки; 3—монтажная рама; 4—арматурный каркас монолитной части ригеля

на опоре закрепляют стальную монтажную раму и укладывают на растворе бетонные прокладки. Блок ригеля краном устанавливают на опору и раскрепляют в проектном положении при помощи стальных тяг;

устанавливают второй блок ригеля, раскрепляют на опоре тягами и сваривают выпуски рабочей арматуры блоков;

устанавливают третий блок ригеля, крепят на тягах к монтажной раме и сваривают металлические закладные части блоков;

устанавливают и закрепляют на опоре четвертый блок, сваривают выпуски рабочей арматуры блоков и закладные части;

снимают тяги, раскрепляющие блоки на опоре, вынимают монтажную раму, краном укладывают в ригель арматурный каркас и сваривают поперечную арматуру каркаса с выпусками ригеля; арматурный каркас вяжут в виде отдельного блока и целиком устанавливают в ригель.

Устанавливают опалубку в стыках блоков и равномерно в обе стороны от поперечной оси бетонируют внутреннюю полость ригеля.

Для лучшего сцепления сборного железобетона с монолитным внутреннюю поверхность сборных блоков следует обработать насечкой и тщательно промыть.

Омоноличивание ригеля и верхних блоков опоры производят одновременно.

Учитывая большую насыщенность арматурой, необходимо тщательно вибрировать бетон заполнения оболочки ригеля.

При установке блоков ригеля необходимо вести постоянный геодезический контроль.

При монтаже пролетных строений установку балок нужно вести в обе стороны от середины ригеля.

В а р и а н т II

Ригель изготавливают в виде двух отдельных блоков и доставляют к месту монтажа.

Вначале устанавливают и тщательно закрепляют на опоре первый блок, затем устанавливают второй блок, сваривают выпуски рабочей арматуры блоков и закладные части. После этого устанавливают второй блок, сваривают выпуски рабочей арматуры блоков и закладные части. После этого устанавливают арматурный каркас и сваривают поперечную арматуру каркаса с выпусками ригеля.

Затем устанавливают опалубку и после этого бетонируют оболочку ригеля.

В а р и а н т III

Ригель изготавливают в виде оболочки или собирают из двух или четырех отдельных блоков. Монтаж ведут двумя кранами К-104 или одним краном К-252. Преимущество это-

го способа заключается в том, что отпадает необходимость устройства сложных приспособлений для закрепления ригеля и значительно сокращается время монтажа ригеля, по сравнению с вариантами I и II.

Установку арматурного каркаса и бетонирование ригеля выполняют также, как в вариантах I и II.

При сооружении опор следует руководствоваться СНиП III-Д.-62 «Мосты и трубы, правила организации и производства работ, приемка в эксплуатацию», СНиП III-А.11-62 «Правила техники безопасности в строительстве» и «Правилами техники безопасности и производственной санитарии при сооружении мостов и труб», Оргтрансстрой, 1969 г.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Опору сооружают поточно-звеньевым методом за два цикла комплексной бригадой из 9 чел., состоящей из двух звеньев, возглавляемых рабочими 4 и 5 разр. Звенья должны быть оснащены необходимыми механизмами и приспособлениями.

Звено I выполняет монтаж тела опоры из блоков-оболочек и заполнение ядра опор бетонными блоками или бетонной смесью.

Состав звена: монтажники конструкций: 3 разр.—2, 4 разр.—2. Рабочие должны владеть второй профессией бетонщиков.

В состав звена включается машинист крана К-104 6 разр.

При монтаже блоков-оболочек тела опоры звено работает в полном составе. Двое монтажников (4 разр.—1 и 3 разр.—1) работают снаружи опоры (внизу), стропуют блоки-оболочки и с помощью веревочных оттяжек сопровождают их к месту установки. Двое монтажников работают на верху (4 разр.—1 и 3 разр.—1), расстилают раствор и устанавливают блоки-оболочки.

При установке блоков заполнения один монтажник расстиляет раствор, второй внизу стропует блоки, третий на опоре направляет блок в секцию опоры, а четвертый устанавливает, расстроповывает блок в опоре и загибает петли.

При заполнении ядра опоры бетонной смесью один монтажник стропует бабьи с бетоном, второй на опоре принимает их и направляет в секцию опоры и двое укладывают бетонную смесь.

При выполнении этих работ следует использовать легкие переставные подмости.

Звено 2 производит монтаж ригеля, установку арматурного каркаса и заполнение бетонной смесью оболочки ригеля.

Состав звена: монтажники конструкций: 5 разр.—1, 4 разр.—2, 3 разр.—2. Рабочие должны владеть профессией плотников и бетонщиков. В состав звена включается машинист крана 6 разр.

При монтаже блоков ригеля занято звено в полном составе. Двое монтажников (3 и 4 разр.) стропуют блок за три монтажных петли и краном поднимают и подают к месту установки, сопровождая его при помощи оттяжек из пенькового каната.

Установленный блок закрепляют с помощью монтажной рамы. Эту операцию выполняют 3 монтажника (5, 4 и 3 разр.).

Также последовательно устанавливаются и следующие блоки.

По окончании монтажа блоков ригеля устанавливают арматурный каркас, который изготавливают в виде отдельного блока, после этого устанавливают подмости (рис. 4), с которых производится установка опалубки стыков и бетонирование ригеля. Работу выполняет звено в полном составе.

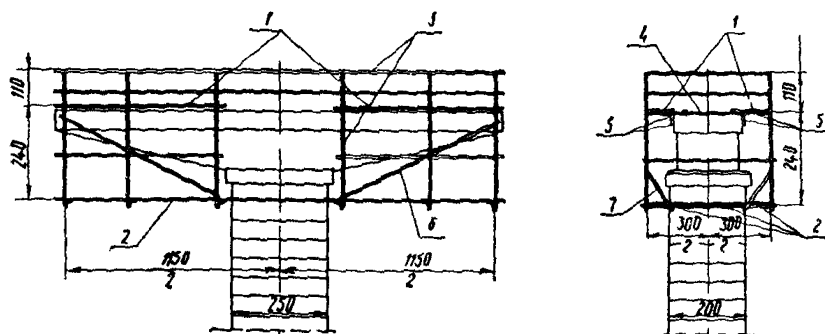


Рис. 4. Двухъярусные навесные подмости для установки опалубки и бетонирования оболочки ригеля:

1—верхний настил; 2—нижний настил; 3—обстройка; 4—несущий элемент; 5—угловой фиксаторы; 6—продольная связь; 7—поперечная связь

При бетонировании один монтажник 3 разр. находится внизу, принимает, стропует бады с бетоном, а четверо монтажников сверху принимают и укладывают бетонную смесь в оболочку ригеля.

Все работы по сооружению ригеля звено выполняет в полном составе. Одноблочный ригель монтируют двумя кранами К-104, которые должны работать синхронно.

При установке блоков-оболочек тела опоры и блоков ригеля необходим тщательный геодезический контроль.

Монтаж тела опоры и ригеля необходимо вести под непосредственным руководством мастера или прораба.

IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА МОНТАЖ СБОРНОЙ ОПОРЫ

а) При оловочном заполнении

| № пп | Наименование операций | Едини- ца из- мере- ния | Объем работ | Трудоем- ность на весь объем работ в чел.-дн. | Состав звена (бригады) | Рабочие смены | | | | |
|---------|---|----------------------------------|----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж блоков-оболочек Б-8 (нижний ярус) | блок | 6 | $\frac{1,32}{0,33}$ | Монтажники конструкций: 4 разр.-2 3 " -2 | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | | | |
| 2 | Монтаж блоков Б-17 переходного ряда. Омоноличивание | " | 2 | $\frac{0,6}{0,15}$ | | | $\frac{4}{1}$ | | | |
| 3 | Монтаж блоков-оболочек Б-4, Б-14 (верхний ярус) | " | 13 | $\frac{3,4}{0,85}$ | | | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ |
| 4 | Укладка оловков заполнения на цементном растворе | " | 25 | $\frac{3,6}{0,9}$ | Машинист крана 6 разр.-1 | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ |
| 5 | Заполнение полости оболочки бетоном | м³ | 23,7 | $\frac{3,6}{0,9}$ | | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ |
| Итого | | чел.-дн. | - | $\frac{12,52}{3,13}$ | | | | | | |

б) При монолитном заполнении

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Монтаж блоков-оболочек Б-8 (нижний ярус) | блок | 6 | $\frac{1,32}{0,33}$ | Монтажники конструкций: 4 разр.-2 3 " -2 | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | | | |
| 2 | Монтаж блоков Б-17 переходного ряда. Омоноличивание | " | 2 | $\frac{0,6}{0,15}$ | | | $\frac{4}{1}$ | | | |
| 3 | Монтаж блоков-оболочек Б-4, Б-14 (верхний ярус) | " | 13 | $\frac{3,4}{0,85}$ | | | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | |
| 4 | Установка подмостей для бетонирования ядра опоры | I установка | 5 | $\frac{3,2}{0,8}$ | Машинист крана 6 разр.-1 | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ |
| 5 | Бетонирование ядра опоры | м³ | 36 | $\frac{6}{1,5}$ | | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ |
| 6 | Снятие подмостей | I снятие | 5 | $\frac{1,6}{0,4}$ | | | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ | $\frac{4}{1}$ |

Итого

чел.-дн. - $\frac{16,12}{4,03}$

Примечание. В числителе - указаны затраты труда звена монтажников конструкций.
В знаменателе - затраты труда машиниста крана.

IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА МОНТАЖ РИГЕЛЯ

I ВАРИАНТ

| № п/п | Наименование операций | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на весь объем работ в чел.-дн. | Состав звена (бригады) | Р А Б О Ч И Е С М Е Н Ы | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | |
| 1 | Монтаж блоков ригеля | Блок | 4 | <u>8,2</u> 0,64 | Монтажники конструкций: | 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | |
| 2 | Заделка стыков | стык | 3 | 0,7 | 5 разр.-I | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| 3 | Установка арматур каркаса и подмостей | каркас | I | <u>0,4</u> 0,08 | 4 " -2 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4 | Установка опалубки | тумб | 7 | <u>1</u> 0,2 | 3 " -2 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 5 | Бетонирование оболочки ригеля | м³ | 13,8 | <u>2,75</u> 0,55 | Машинист крана | | | | | | | 5 | | | | | |
| 6 | Разборка опалубки | тумб | 7 | 0,44 | 6 разр.-I | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | чел.-дн. | - | <u>8,48</u> 1,47 | | | | | | | | | | | | | |

II ВАРИАНТ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|------|---------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Монтаж блоков ригеля | Блок | 2 | <u>2,25</u> 0,45 | Монтажники конструкций: | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Заделка стыков | стык | I | 0,3 | 5 разр.-I | | 5 | | | | | | | | | | |
| 3 | Установка арматур каркаса и подмостей | каркас | I | <u>0,4</u> 0,08 | 4 " -2 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4 | Установка опалубки | тумб | 7 | <u>1</u> 0,2 | 3 " -2 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 5 | Бетонирование оболочки ригеля | м³ | 13,8 | <u>2,75</u> 0,55 | Машинист крана | | | | | | | 5 | | | | | |
| 6 | Разборка опалубки | тумб | 7 | 0,44 | 6 разр.-I | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | <u>7,14</u> 1,28 | | | | | | | | | | | | | |

III ВАРИАНТ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|------|---------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Монтаж ригеля | Блок | I | <u>1,2</u> 0,48 | Монтажники конструкций: | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Установка арматурного каркаса и подмостей | каркас | I | <u>0,4</u> 0,08 | 5 разр.-I | | 5 | | | | | | | | | | |
| 3 | Установка опалубки | тумб | 7 | <u>1</u> 0,2 | 4 " -2 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 4 | Бетонирование оболочки ригеля | м³ | 13,8 | <u>2,75</u> 0,55 | 3 " -2 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 5 | Разборка опалубки | тумб | 7 | 0,44 | Машинист крана | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | чел.-дн. | - | <u>5,79</u> 1,91 | 6 разр.-2 | | | | | | | | | | | | |

Условные обозначения:
 — работа звена монтажников конструкций
 — работа машиниста крана

Примечание. В числителе — указаны затраты труда звена монтажников конструкций
 В знаменателе — затраты труда машиниста крана.

Применение поточно-звеньевое метода позволяет создать специализированные звенья, что значительно сокращает продолжительность строительства опор.

Основные правила техники безопасности при сооружении сборных опор

1. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться под руководством лиц, ответственных за обеспечение условий проведения этих работ, в соответствии с действующими правилами техники безопасности.

2. Во всех случаях подъема элементов грузовой полиспаст крана должен занимать вертикальное положение. Подтягивание элемента крюком крана запрещается.

3. Перед подъемом любого элемента к нему должны быть прикреплены две оттяжки из пенькового каната диаметром не менее 12 мм и длиной 10—15 м. При опускании элемента запрещается направлять и поворачивать его непосредственно руками. Поворачивать поднятый элемент следует только при помощи оттяжек. Горизонтальное перемещение элементов при помощи оттяжек запрещается.

4. Во время подъема элемента запрещается находиться под стрелой крана и в зоне ее действия.

5. При подъеме и установке элементов в проектное положение монтажники должны находиться на специальных подмостях, предусмотренных для данного способа монтажа опоры.

6. Подвесные и подъемные подмости должны быть сооружены по проекту, прочно и надежно подвешены на расстоянии не более 10 см от монтируемых конструкций.

7. Замена подмостей сгременками с уложенными по ним досками, не скрепленными в щиты настила, а также устройство временных настилов на случайных опорах не допускается.

8. Крюки, петли для подмостей должны быть заранее тщательно осмотрены и испытаны двойной статической нагрузкой в течение не менее 15 мин.

9. Приставные лестницы следует устанавливать с уклоном не менее 4 : 1; их конструкция должна исключать их качание и прогиб во время подъема людей.

10. Плашкоуты, предназначенные для перевозки блоков, должны обеспечивать необходимую грузоподъемность и устойчивость.

11. При работе на воде должны быть обеспечены необходимые спасательные средства (круги, дежурные лодки и т. п.).

12. Все ответственные работы—монтаж блоков-оболочек, монтаж блоков ригелей—должны проходить под непосредственным руководством производителя работ.

V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА МОНТАЖ ТЕЛА ОПОРЫ

А. При блочном заполнении

| № п/п | Шифр норм | Состав звена | Описание работы | Единица измерения | Объем работ | Норма времени, чел-ч | Расценка, руб.—коп. | Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч | Стоимость затрат труда, на полный объем работ, руб.—коп. |
|----------|-------------------------|---|--|----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--|--|
| 1 | ЕНиР, 4—4—7, 26 | Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1 | Монтаж блоков-оболочек Б-8 при весе блока до 5 т (обтекаемые) | блок | 6 | 1,84 0,46 | 1—09 0—36,3 | 11,04 2,76 | 6—54 2—18 |
| 2 | То же | То же | Монтаж переходных блоков Б-17 при весе блока до 5 т (обтекаемые) | » | 2 | 1,84 0,46 | 1—09 0—36,3 | 3,68 0,92 | 2—18 0—73 |
| 3 | ЕНиР, 4—4—28, № 4 | Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1 | Установка арматуры стыка | кг | 6,4 | 0,06 | 0—04 | 0,38 | 0—26 |
| 4 | ЕНиР | Бетонщики: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1 | Бетонирование стыка | м ³ | 0,2 | 3,44 0,86 | 2—10 0—60,4 | 0,69 0,17 | 0—42 0—12 |
| 5 | 4—4—7, 46 | Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1 | Монтаж блоков-оболочек Б-4, Б-14 при весе блока до 5 т (прямоугольные) | блок | 13 | 2,12 0,53 | 1—25 0—41,9 | 27,56 6,89 | 16—25 5—45 |

Продолжение

| № пп | Шифр норм | Состав звена | Описание работы | Единица измерения | Объем работ | Норма времени, чел.-ч | Расценка, руб.—коп. | Норма- тивное время на полный объем работ, чел.-ч | Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп. |
|---------|--------------------|---|---|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|---|---|
| 6 | 4—4—8 | Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1 | Установка блоков заполне- ния Б-1, Б-2, Б-3 | блок | 25 | 1,28 0,32 | 0—75,5 0—25,3 | 32 8 | 18—88 6—33 |
| 7 | 3—1—16, № 1 и 3 | Бетонщики: 3 разр.—1 2 » —1 | Приготовление цементного раствора | м³ | 1,2 | 1,35 | 0—68,5 | 1,62 | 0—82 |
| 8 | 4—2—21, № 17 | Бетонщик 2 разр.—1 | Перегрузка бетона из авто- самосвала в бадью | » | 23,7 | 0,086 | 0—04,2 | 2,04 | 1—00 |
| 9 | 4—4—16, № 1 | Бетонщики: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1 | Заполнение полости оболоч- ки бетоном | » | 23,7 | 1,24 0,31 | 0—73,2 0—21,8 | 29,39 7,35 | 17—35 5—17 |
| Итого | | | | | | | | 108,4 26,09 | 63—70 19—98 |

Б. При монолитном заполнении

| № п/п | Шифр норм | Состав звена | Описание работы | Единица измерения | Объем работ | Норма времени, чел-ч | Расценка, руб.—коп. | Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч | Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп. |
|----------|-----------------------|---|--|----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--|---|
| 1 | 4—4—7, 26 | Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1 | Монтаж блоков-оболочек Б-8 при весе блока до 5 т (обтекаемые) | блоки | 6 | 1,84 | 1—09 | 11,04 | 6—54 |
| | | | | | | 0,46 | 0—36,3 | 2,76 | 2—18 |
| 2 | То же | То же | Монтаж переходных блоков Б-17 при весе блока до 5 т (обтекаемые) | » | 2 | 1,84 | 1—09 | 3,68 | 2—18 |
| | | | | | | 0,46 | 0—36,3 | 0,92 | 0—73 |
| 3 | 4—4—28, № 4 | Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1 | Установка арматуры стыка | кг | 6,4 | 0,06 | 0—04 | 0,38 | 0—26 |
| 4 | 4—4—31, № 1 | Бетонщики: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1 | Бетонирование стыка | м ³ | 0,2 | 3,44 | 2—10 | 0,69 | 0—42 |
| | | | | | | 0,86 | 0—60,4 | 0,17 | 0—12 |
| 5 | ЕНиР, 4—4—7, 46 | Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1 | Монтаж блоков-оболочек Б-4, Б-14 при весе блока до 5 т (прямоугольные) | блоки | 13 | 2,12 | 1—25 | 27,56 | 16—25 |
| | | | | | | 0,53 | 0—41,9 | 6,89 | 5—45 |

Продолжение

| № пп | Шифр норм | Состав звена | Описание работы | Единица измере- ния | Объем работ | Норма времени, чел-ч | Расценка, руб.—коп. | Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч | Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп. |
|---------|--|---|---|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--|---|
| 6 | ЕНиР, 3—1—16, № 1, 3 | Бетонщики: 3 разр.—1 2 » —1 | Приготовление цементного раствора | м³ | 1,25 | 1,35 | 0—68,5 | 1,62 | 0—82 |
| 7 | ЕНиР, 4—4—16, № 1 | Бетонщики: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1 | Заполнение полости оболоч- ки бетоном | » | 36 | 1,24 0,31 | 0—73,2 0—21,8 | 44,64 11,16 | 26—35 7—85 |
| 8 | ЕНиР, 4—2—21, № 17 | Бетонщик 2 разр.—1 | Перегрузка бетонной смеси из автосамосвала в бадью | » | 36 | 0,086 | 0—04,2 | 3,1 | 1—51 |
| 9 | По наблю- дению Но- восибир- ской НИС | Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1 | Установка подмостей для бетонирования опоры | 1 уста- новка | 5 | 5,48 1,37 | 3—23 1—08 | 27,4 6,8 | 16—15 5—40 |
| 10 | То же | То же | Разборка подмостей | 1 раз- борка | 5 | 2,72 0,68 | 1—60 0—54 | 13,6 3,4 | 8—00 2—70 |
| Итого | | | | | | | | 133,71 32,1 | 78—48 24—43 |

Калькуляция затрат труда на монтаж ригеля

| № п/п | Шифр | Состав звена | Описание работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени, чел.-ч | Расценка, руб.—коп. | Норма- тивное время, на полный объем работ, чел.-ч | Стоимость затрат труда, на полный объем работ, руб.—коп. |
|-----------------|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|--|--|
| В а р и а н т I | | | | | | | | | |
| 1 | ЕНиР, 4—4—12, № 1 | Монтажники конструкций: 6 разр.—1 5 » —1 4 » —3 Машинист крана 6 разр.—1 | Монтаж ригеля, вес блока до 6 т | блок | 4 | 6,75 | 4—55 | 27 | 18—20 |
| | | | | | | 1,35 | 1—07 | 5,4 | 4—28 |
| 2 | 4—4—28, № 1 | Арматурщики: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —1 | Установка арматуры стыка | 100 кг | 1,13 | 1,65 | 1—04 | 1,86 | 1—18 |
| 3 | 4—4—27, № 1 | Электросварщик 5 разр.—1 Монтажники конструкции 3 разр.—1 | Сварка стыков | стык | 32 | 0,12 | 0—07,5 | 3,84 | 2—40 |
| 4 | По наблю- дениям Но- восибир- ской НИС | Арматурщики: 5 разр.—1 4 » —1 Машинист крана 6 разр.—1 | Установка арматурного кар- каса | 1 каркас | 1 | 1,65 | 1—09 | 1,65 | 1—09 |
| | | | | | | 0,82 | 0—65 | 0,82 | 0—65 |

Продолжение

| № пп | Шифр | Состав звена | Описание работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени, чел-ч | Расценка, руб.—коп. | Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч | Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп. |
|---------|---|---|--|----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--|---|
| 5 | По наблю- дениям Но- восибир- ской НИС | Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 | Установка подмостей | 1 уста- новка | 1 | 1,65 0,82 | 1—09 0—65 | 1,65 0,82 | 1—09 0—65 |
| 6 | 4—4—30, № 3а | Плотники: 4 разр.—1 3 » —2 | Установка опалубки (про- должный шов) | 1 м | 10,8 | 0,35 | 0—20,2 | 3,78 | 2—18 |
| 7 | 4—4—30, № 6а | То же | Установка опалубки (вер- тикальный шов) | 1 торец | 2 | 0,86 | 0—50,7 | 1,72 | 1—01 |
| 8 | По наблю- дениям Но- восибир- ской НИС | Плотники 4 разр.—3 | Установка опалубки (тумб) | 1 ригель | ригель | 2,53 | 1—57 | 2,53 | 1—57 |
| 9 | 4—4—16, № 2 | Бетонщики: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1 | Бетонирование ригеля: а) оболочка ригеля | м³ | 13,6 | 1,72 0,43 | 1—05 0—30,2 | 23,39 5,85 | 14—28 4—11 |
| | | | б) продолжный шов | » | 0,2 | 3 0,75 | 1—83 0—52,7 | 0,6 0,15 | 0—37 0—11 |
| 10 | 4—4—30, № 3б и 6б | Плотники: 3 разр.—1 2 » —1 | Разборка опалубки: а) продольные швы б) вертикальный шов | м 1 торец | 10,8 2 | 0,185 0,28 | 0—09,7 0—14,7 | 2 0,56 | 1—05 0—29 |

Продолжение

| № пп | Шифр | Состав звена | Описание работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени, чел-ч | Расценка руб.—коп. | Нормативное время на полный объем работ, чел-ч | Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп. |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|--|---|
| | По наблюдениям Новосибирской НИС | Плотники: 3 разр.—1 2 » —1 | в) тумбы | 1 тумба | 7 | 0,15 | 0—08 | 1,05 | 0—56 |
| Итого | | | | | | | | 71,63 13,64 | 45—27 9—80 |

В а р и а н т II

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------------------|--------|-----|------------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | ЕНПР, 4—4—12, № 2 | Монтажники конструкций: 6 разр.—1 5 » —1 4 » —3 Машинист крана 6 разр.—1 | Монтаж ригеля, вес блока до 10 т | блок | 2 | 9,5 1,9 | 6—40 1—50 | 19,0 3,8 | 12—80 3—00 |
| 2 | 4—4—28, № 1 | Арматурщики: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —1 | Установка арматуры стыка | 100 кг | 0,4 | 1,65 | 1—0,4 | 0,66 | 0—41 |
| 3 | 4—4—27 | Электро- сварщик 5 разр.—1 Монтажник конструкций 3 разр.—1 | Сварка стыков | стык | 18 | 0,12 | 0—07,5 | 2,14 | 1—35 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|----------------|------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 4 | По наблюдению Новосибирской НИС | Арматурщики: 5 разр.—1 4 » —1 | Установка арматурного каркаса | 1 каркас | 1 | 1,65 0,82 | 1- 09 0—65 | 1,65 0,82 | 1- 09 0—65 |
| 5 | То же | То же | Установка подмостей | 1 установка | 1 | 1,65 0,82 | 1—09 0—65 | 0,65 0,82 | 1—09 0—65 |
| 6 | 4—4—30, № 3а | Плотники: 4 разр.—1 3 » —2 | Установка опалубки: а) продольный шов | м | 10,8 | 0,35 | 0—20,2 | 3,78 | 2—18 |
| | 4—4—30, № 6а | Плотники: 4 разр.—1 3 » —2 | б) вертикальный шов | торец | 2 | 0,86 | 0—50,7 | 1,72 | 1—01 |
| | По наблюдению Новосибирской НИС | То же | в) тумбы | 1 ригель | 1 | 2,53 | 1—57 | 2,53 | 1—57 |
| 7 | 4—4—16, № 2 | Бетонщики: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1 | Бетонирование ригеля: а) оболочка ригеля | м ³ | 13,6 | 1,72 0,43 | 1—05 0—30,2 | 23,39 5,85 | 14—28 4—11 |
| | | | б) продольный шов | » | 0,2 | 3 0,75 | 1—83 0—52,7 | 0,6 0,15 | 0—37 0—11 |
| 8 | 4—4—30, № 3б, № 6б | Плотники: 3 разр.—1 2 » —1 | Разборка опалубки а) продольные швы | м | 10,8 | 0,185 | 0—09,7 | 2 | 1—05 |
| | | | б) вертикальный шов | 1 торец | 2 | 0,28 | 0—14,7 | 0,56 | 0—29 |

Продолжение

| № п/п | Шифр норм | Состав звена | Описание работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени, чел.-ч | Расценка, руб.—коп. | Норма- тивное время, на полный объем работ, чел.-ч | Стоимость затрат труда, на полный объем работ, руб.—коп. |
|----------|--|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|--|--|
| | По наблюде- ниям Новоси- бирской НИС | Плотники: 3 разр.—1 2 » —1 | в) тумбы | 1 тумба | 7 | 0,15 | 0—08 | 1,05 | 0—56 |
| | | | Итого | | | | | 60,73 11,44 | 38—05 8—52 |

В а р и а н т III

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | По наблю- дениям Но- восибир- ской НИС | Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —3 Машинисты крана 6 разр.—2 | Монтаж ригеля двумя авто- мобильными кранами | 1 ригель | 1 | 9,8 4,90 | 6—31 3—42 | 9,8 4,9 | 6—31 3—42 |
| 2 | То же | Арматурщики: 5 разр.—1 4 » —1 Машинист крана 6 разр.—1 | Установка арматурного каркаса | 1 каркас | 1 | 1,65 0,82 | 1—09 0—65 | 1,65 0,82 | 1—09 0—65 |
| 3 | » | Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 Машинист крана 6 разр.—1 | Установка подмостей | 1 уста- новка | 1 | 1,65 0,82 | 1—09 0—65 | 1,65 0,82 | 1—09 0—65 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------------|----------|------|-------|--------|----------------|---------------|
| 4 | 4—4—30, № 3а, № 6а | Плотники: 4 разр.—1 3 » —2 | Установка опалубки: | | | | | | |
| | | | а) продольный шов | м | 10,8 | 0,35 | 0—20,2 | 3,78 | 2—18 |
| | | | б) вертикальный шов | 1 торец | 2 | 0,86 | 0—50,7 | 1,72 | 1—01 |
| | По наблю- дениям Но- восибир- ской НИС | То же | в) тумбы | 1 ригель | 1 | 2,53 | 1—57 | 2,53 | 1—57 |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 4—4—16, № 2 | Бетонщики: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1 | Бетонирование ригеля: | | | | | | |
| | | | а) оболочки ригеля | м² | 13,6 | 1,72 | 1—05 | 23,39 | 14—28 |
| | | | | | | 0,43 | 0—30,2 | 5,85 | 4—11 |
| | | | б) продольный шов | » | 0,2 | 3 | 1—83 | 0,6 | 0—37 |
| | | | | | | 0,75 | 0—52,7 | 0,15 | 0—11 |
| 6 | 4—4—30, № 3б, № 6б | Плотники: 3 разр.—1 2 » —1 | Разборка опалубки: | | | | | | |
| | | | а) продольные швы | м | 10,8 | 0,185 | 0—09,7 | 2 | 1—05 |
| | | | б) вертикальный шов | 1 торец | 2 | 0,28 | 0—14,7 | 0,56 | 0—29 |
| | По наблю- дениям Но- восибир- ской НИС | То же | в) тумбы | 1 тумба | 7 | 0,15 | 0—08 | 1,05 | 0—56 |
| | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | 48,73 12,54 | 29—80 8—94 |

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Единица измерения | По калькуляции А | По графику Б | На сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (-), чем по калькуляции $\frac{(Б-А)}{А} \times 100$ |
|--|-------------------|------------------|--------------|---|
| А. Тело опоры | | | | |
| I. При блочном заполнении | | | | |
| Трудоемкость работ на 1 м³ бетона и железобетона | чел-дн | 0,2 3,44 | 0,19 3,5 | —5,3 +1,7 |
| Средний разряд рабочих | | | | |
| Среднедневная заработная плата рабочего . . . | руб. | 4—70 | 5—09 | +9,1 |
| Затраты машино-смен на 1 м³ конструкций (кран К-104) | маш-смен | 0,05 | 0,047 | —6 |
| II. При монолитном заполнении | | | | |
| Трудоемкость работ на 1 м³ бетона и железобетона | чел-дн | 0,25 3,43 | 0,24 3,5 | —4 +2 |
| Средний разряд рабочих | | | | |
| Среднедневная заработная плата рабочего . . . | руб. | 4—70 | 4—87 | +3,6 |
| Затраты машино-смен на 1 м³ конструкций (кран К-104) | маш-смен | 0,06 | 0,06 | ±0 |
| Б. Ригель | | | | |
| Вариант I | | | | |
| Трудоемкость работ на 1 м³ бетона и железобетона | чел-дн | 0,43 3,99 | 0,41 3,75 | —4,7 —6 |
| Средний разряд рабочих | | | | |
| Среднедневная заработная плата рабочего . . . | руб. | 5—05 | 5—34 | +5,7 |
| Затраты машино-смен на 1 м³ конструкций (кран К-104) | маш-смен | 0,086 | 0,071 | —17,4 |
| Вариант II | | | | |
| Трудоемкость работ на 1 м³ бетона и железобетона | чел-дн | 0,35 3,99 | 0,34 3,76 | —2,9 —5,8 |
| Средний разряд рабочих | | | | |
| Среднедневная заработная плата рабочего . . . | руб. | 5—00 | 5—33 | +6,6 |
| Затраты машино-смен на 1 м³ конструкций (кран К-104) | маш-смен | 0,065 | 0,061 | —6,2 |

Продолжение

| Наименование показателей | Единица измерения | По калькуляции А | По графику Б | На сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (-), чем по калькуляции $\left(\frac{Б-А}{А} \times 100\%\right)$ |
|---|-------------------|------------------|--------------|---|
| В а р и а н т III | | | | |
| Трудоемкость работ на 1 м ³ бетона и железобетона | чел-дн | 0,29 | 0,28 | —3,4 |
| Средний разряд рабочего | | 3,79 | 3,75 | —1,1 |
| Среднедневная заработная плата рабочего . . | руб. | 4—88 | 5—14 | +5,3 |
| Затраты машинно-смен на 1 м ³ конструкций (кран К-104) | маш-смен | 0,072 | 0,063 | —12,5 |

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Потребность в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных материалах

| Наименование | Марка, ГОСТ | Единица измерения | Количество | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | при блочном заполнении | при монолитном заполнении |
| Контурные блоки-оболочки | Б-4 из железобетона марки 300 | шт | 12 | 12 |
| | Б-8 из железобетона марки 300 | м ³ | 15,36 | 15,36 |
| | Б-8 из железобетона марки 300 | » | 6 | 6 |
| Переходные блоки | Б-14 из железобетона марки 300 | » | 10,8 | 10,8 |
| | Б-14 из железобетона марки 300 | » | 1 | 1 |
| | Б-17 из железобетона марки 300 | » | 1,98 | 1,98 |
| Блоки заполнения | Б-17 из железобетона марки 300 | » | 2 | 2 |
| | Б-1 из железобетона марки 150 | » | 2,88 | 2,88 |
| | Б-1 из железобетона марки 150 | » | 6 | — |
| Блоки ригеля | Б-2 из железобетона марки 150 | » | 2,55 | — |
| | Б-2 из железобетона марки 150 | » | 11 | — |
| | Б-3 из железобетона марки 150 | » | 7,15 | — |
| Бетон железобетонных стыков | Б-3 из железобетона марки 150 | » | 8 | — |
| | Б-21 из железобетона марки 400 | » | 2,6 | — |
| | Б-21 из железобетона марки 400 | » | 2 | 2 |
| Бетон заполнения | Б-21а из железобетона марки 400 | » | 3,2 | 3,2 |
| | Б-21а из железобетона марки 400 | » | 2 | 2 |
| | Б-21а из железобетона марки 400 | » | 2 | 2 |
| Цементный раствор | Железобетон марки 400 | м ³ | 3,2 | 3,2 |
| | Бетон марки 150 | » | 13,8 | 13,8 |
| | Марка 100 | » | 23,7 | 36 |
| | | » | 1,2 | 1,2 |

**Б. Потребность в машинах, оборудовании,
инструментах и приспособлениях**

| Наименование | Марка | Количество |
|--|--|------------|
| Кран на автомобильном ходу | К-104 | 1 |
| Бадьи емкостью до 1 м ³ | Гипросельстрой Минсельстрой СССР | 2 |
| Сварочный трансформатор | — | 1 |
| Центробежный насос для откачки воды производительностью 120 м ³ /ч | 5 гр-12 | 1 |
| Вибрагор глубинный | С-800 | 2 |
| Вибрагор поверхностный | И-7 | 1 |
| Топоры плотничные | ГОСТ 1399—56 | 2 |
| Молотки | ГОСТ 11042—64 | 2 |
| Пилы поперечные типа I-1250 | ГОСТ 279—60 | 1 |
| Пожовки | Горьковский ме- таллургический завод Минчермета | 2 |
| Уровень деревянный длиной 1 м | ГОСТ 9416—60 | 1 |
| Рулетка типа РС-20 | ГОСТ 7502—61 | 1 |
| Лопаты подборочного типа ЛП | ГОСТ 3620—63 | 3 |
| Шуровки металлические | ЦНИИС Мин- транстроя | 2 |
| Воронки металлические плоские | » | 2 |
| Ломы остроконечного типа ЛО | ГОСТ 1405—65 | 2 |
| Конопатки металлические | ГОСТ 11618—65 | 2 |
| Инвентарные стропы | — | 2 |

Технологическая карта разработана Новосибирской нормативно-исследовательской станцией (исполнители А. Н. Бурлака и А. П. Богданов)

*Редактор инж. **О. Н. Добровольский***

Москва 1971

Техн. редактор *Д. В. Панюшева*

Л 108930. Подп. к печати 30 марта 1971 г. Объем 1,75 печ. л. + 1 вкл.
1,92 авт. л. 2,16 уч.-изд. л. Зак. 377. Тир. 1400. Бесплатно.

Типография института «Оргтрансстрой» Министерства транспортного
строительства, г. Вельск Арханг. обл.

ИСПРАВЛЕНИЕ

| Страница | Строка | Напечатано | Следует читать |
|----------|-------------|--|--|
| 8 | 13 снизу | <p>Вначале устанавливают и тщательно закрепляют на опоре первый блок, затем устанавливают второй блок, сваривают выпуски рабочей арматуры блоков и закладные части.</p> <p>После этого устанавливают второй блок сваривают выпуски рабочей арматуры блоков и закладные части.</p> <p>После этого устанавливают арматурный каркас и сваривают поперечную арматуру каркаса с выпусками ригеля.</p> | <p>Вначале устанавливают и тщательно закрепляют на опоре первый блок, затем устанавливают второй блок, сваривают выпуски рабочей арматуры блоков и закладные части.</p> <p>После этого устанавливают арматурный каркас и сваривают поперечную арматуру каркаса с выпусками ригеля.</p> |

Зак. 377. Тир. 1400. Технологич. карта «Монтаж сборных опор автодорожных мостов».
