

ГОССТРОЙ СССР  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ,  
МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ  
БЮРО ВНЕДРЕНИЯ

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПЛИТАМ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ



Москва, Стройиздат, 1973

Технологические карты на устройство рулонных и мастичных кровель по комплексным плитам повышенной заводской готовности для жилых и промышленных зданий. М. Стройиздат, 1973. Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи строительству.

Стр. 116, табл. 112, рис. 53.

Составители: канд. техн. наук Н. Н. ЗАВРАЖИН, руководитель отдела технологии, механизации кровельных и отделочных работ и устройства полов ЦНИИОМТП; канд. техн. наук В. Б. БЕЛЕВИЧ, руководитель лаборатории технологии и механизации кровельных работ, А. Н. ОСЕПЯН старший научный сотрудник, А. В. ЧУЕВА, инженер этой же лаборатории

Альбом состоит из технологических карт на производство кровельных работ по комплексным железобетонным плитам покрытия повышенной заводской готовности в жилых и промышленных зданиях.

В картах указаны машины, приспособления и оборудование, которые рационально применять при производстве кровельных работ, а также приведены данные о затратах труда и о заработной плате рабочих, занятых на всех основных и вспомогательных работах.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Технологические карты на устройство рулонных и мастичных кровель жилых и промышленных зданий по комплексным плитам покрытия повышенной заводской готовности разработаны с учетом современной технологии и передовых методов труда лучших кровельщиков страны, в соответствии с «Методическими указаниями по разработке технологических карт в строительстве», составленными ЦНИИОМТП и утвержденными техническим управлением Госстроя СССР 2 июля 1964 г., а также в соответствии с действующими СНиП III-В. 12-69, Инструкцией по проектированию кровель из рулонных материалов зданий промышленных предприятий Госстроя СССР (СН-246-63), Инструкцией по устройству рулонных кровель зданий и сооружений ЦНИИОМТП, Временными указаниями по применению холодной мастики БЛК для устройства кровель из рулонных материалов Главмосстроя, Инструкцией по производству безрулонных кровель из холодных асфальтовых мастик Главсевкавстроя, Техническими указаниями по устройству безрулонных кровель Госстроя УССР (РСН-154-65), Инструкцией по устройству мастичных кровель, армированных стекломатериалами, ЦНИИпромзданий.

Технологические карты содержат следующие разделы:

- I. Область применения;
- II. Техничко-экономические показатели;
- III. Организация и технология строительного процесса;
- IV. Организация и методы труда рабочих;
- V. Калькуляция затрат труда и заработной платы;
- VI. График производства работ и потребность в материально-технических ресурсах.

Рулонные и мастичные кровли устраивают по плитам повышенной заводской готовности, разработанным НИИТЭП, ЦНИИЭП жилища, НИИСФ и трестом Киеворгтехстрой, применяемым в жилищном и промышленном строительстве. Затраты труда и стоимость работ подсчитаны по ЕНиР 1966—1969 гг. и по расчетам, приведенным в Приложении.

В технологических картах предусмотрены: организация рабочих мест с рациональным расположением материалов, механизмов, инвентаря и приспособлений;

внедрение поточно-расчлененного метода, обеспечивающего безопасное ведение работ и сокращение сроков строительства;

внедрение новых механизмов и приспособлений, применяемых на отдельных объектах или проходящих производственное испытание;

комплектование звеньев и бригад по численности и квалификации рабочих и организация их работы;

обеспечение достаточного фронта работ и бесперебойного снабжения материалами.

При разработке технологических карт приняты следующие решения:

основания покрытий готовить для производства кровельных работ в соответствии с требованиями СНиП III-В. 12-69 (пп. 2,1 и 2,2);

мастики и эмульсии готовить централизованно, а на строящихся объектах, в случае необходимости, только перемешивать их и добавлять наполнители;

цементно-песчаный раствор, сухие смеси и утеплитель, употребляемые для заделки стыков комплексных плит, готовить централизованно и поставлять на объект в готовом виде;

рулонные материалы доставлять на покрытие очищенными от посыпки и в перемотанном виде.

Для устройства мастичных и рулонных кровель механизированным способом с подачей мастики по трубопроводам предусмотрены следующие механизмы, оборудование и приспособления:

окрасочный агрегат СО-4 для нанесения грунтовки;

автогудронатор Д-251 Курганского завода для подачи и нанесения холодной мастики БЛК;

установка ГУ-2 конструкции ЦНИИподземшхостроя для подачи эмульсии ЭГИК;

пистолет-распылитель конструкции ЦНИИОМТП для нанесения эмульсии ЭГИК, армированной рубленым стекловолокном;

удочка-распылитель конструкции треста Приднепроворгтехстрой для нанесения мастики на поверхность покрытия;

штукатурная станция для подачи холодной асфальтовой мастики;

станок для заготовки стальных кровельных деталей;

установка С-1027 конструкции ВНИИСтройдор-маш для вертикальной транспортировки горячей мастики;

установка СО-67 для вертикальной транспортировки горячей и холодной мастик;

машина конструкции ЦНИИОМТП для наклейки рулонных материалов;

машина конструкции ЦНИИОМТП для горизонтальной транспортировки мастики по покрытию;

машина конструкции ЦНИИОМТП для горизонтальной транспортировки гравия по покрытию;

сменное прицепное устройство для нанесения защитного слоя из гравия, устанавливаемое на машине конструкции ЦНИИОМТП для наклейки рулонных материалов;

термос конструкции СКБ Мосстроя для приема и подогрева мастики;

мотороллер ТГ-200 для горизонтальной транспортировки рубероида и других материалов по покрытию;

воздухоподогреватель ОВЖТ-80;

каток-раскатчик конструкции треста Оргтехстрой Министерства промышленного строительства БССР для раскатки и приклеивания рулонных материалов;

пневматическая установка СО-51 для подачи и нанесения защитного покрытия из песка или гравия;

ручные тележки на пневматическом ходу для развозки материалов по покрытию.

При производстве кровельных работ на промышленных зданиях стеклоткань, рубероид и другие материалы транспортируют по вертикали переносным краном Т-108А грузоподъемностью 500 кг. При выполнении параллельно с кровельными другими строительными работами можно применять также башенные краны. Для горизонтального транспортирования материалов по скатым кровлям и на фанари устраивают инвентарные сборно-разборные эстакады или настилы.

Для вертикального транспортирования материалов на жилых пятиэтажных зданиях применяют самоходный подъемник УПСР конструкции ЦНИИОМТП грузоподъемностью 320 кг; для девятиэтажных зданий — подъемники С-953 конструкции ЦКБ Строймаш или ПСГ-800 конструкции СКБ Мосстроя грузоподъемностью соответственно 500 и 800 кг, а также подъемники К-1 и УСП-1. Возможно применение и других эффективных транспортных средств.

С целью сокращения затрат труда на строительной площадке предусмотрено устройство рулонных и мастичных кровель по комплексным плитам, состоящим из собственно железобетонной плиты, слоя пароизоляции (если это обусловлено проектом), слоя теплоизоляции, цементно-песчаной или асфальтовой стяжки и одного-двух слоев гидронизоляционного ковра или огрунтовки. После заделки стыков комплексных плит приступают к нанесению остальных

гидронизоляционных слоев в соответствии с проектом.

В технологических картах данного альбома предусмотрены различные виды работ по устройству мастичных и рулонных кровель по комплексным плитам. В приложениях к картам даны:

узлы и детали различных конструкций кровель (в составе каждой технологической карты);

общие виды и краткие технические характеристики машин, механизмов и приспособлений;

расчеты норм времени и расценки на отдельные виды работ по устройству мастичной и рулонной кровли.

Технологические карты разработаны для типовых серий жилых зданий и промышленных корпусов размерами 144×72 и 144×54 м, состоящих из двух унифицированных типовых секций размерами 72×72 и 72×54 м.

Привязка технологических карт к конкретному объекту заключается в уточнении объемов работ, средств транспорта, потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении средств механизации производства работ и графической схемы организации процесса соответственно фактическим размерам сооружаемого объекта.

Калькуляции затрат труда и заработной платы на отдельные виды работ по устройству мастичной и рулонной кровли составлены по ЕНиР и расчетам, выполненным исходя из производительности применяемых машин и механизмов.

При привязке к конкретным условиям строительства расчетные нормы и калькуляции подлежат уточнению.

Работы по устройству кровли следует производить строго соблюдая правила техники безопасности (СНиП III-A. 11-70).

Технологические карты можно применять при разработке:

индивидуальных проектов организации строительства и производства работ;

мероприятий по организации труда на объектах строительства;

карт трудовых процессов и планов научной организации труда.

Технологические карты подготовлены к изданию лабораторией технологии и механизации кровельных работ ЦНИИОМТП с использованием материалов проектного отделения ЦНИИОМТП, института Промстройпроект, треста Приднепроворгстрой и предназначены для линейно-технического персонала строителей и работников проектных организаций.

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве кровельных работ необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности (СНиП III-A. 11-70) и, кроме того, руководствоваться следующими положениями.

К кровельным работам допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр. К работам с горячей мастикой не допускаются кормящие матери и лица с заболеваниями кожи, верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и конъюнктивитом глаз, а также лица моложе 17 лет.

Кровельщики должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и индивидуальными защитными средствами в соответствии с действующими нормами.

Работать с горячей мастикой кровельщики должны в брезентовых костюмах и рукавицах, в кожаных ботинках или резиновых сапогах, в головных уборах, защитных очках и респираторах (при засыпке наполнителей в котлы).

Каждый вновь поступающий на работу кровельщик должен пройти общий инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж непосредственно на рабочем месте. Кроме того, рабочих необходимо обучить безопасным способам работы по шести- и десятичасовой программе с выдачей им после проверки знаний специального удостоверения.

Рабочих, занятых на работах с пеками, следует осведомить о вредности этой работы и о необходимых мерах предосторожности.

Допускать рабочих на покрытие можно только после проверки исправности несущего основания.

Работать на краю не имеющего ограждения покрытия с любым ее уклоном кровельщикам разрешается только с надежно закрепленными к конструкциям предохранительными поясами.

При выполнении кровельных работ зона возможного падения материалов должна быть ограждена.

Запрещается производить все виды кровельных работ во время гололедицы, густого тумана, ветра более 6 баллов, ливневого дождя и снегопада.

Площадки, где установлены краны, битумоварочные котлы и битумонасосы с мастикопроводами, должны быть ограждены.

Запрещается нахождение посторонних лиц в огражденной зоне.

Подогрев в термосах (котлах) битумных мастик у объекта разрешается при соблюдении следующих условий: котлы должны быть очищены от гари, оборудованы плотно закрывающимися конусными крышками и несгораемыми навесами, установлены на прочное основание либо закреплены в корпусе печи так, чтобы их верхние края находились не выше поверхности земли или площадки для обслуживающего персонала.

Запрещается загружать котлы битумом со стороны топочных отверстий и более чем на 3/4 их емкости.

Подогревать битумные мастики следует под наблюдением ознакомленного с методами варки рабочего (кровельщика), имеющего термометр со шкалой на 250—350°С и необходимый инструмент.

Запрещается подогревать битум свыше 220°С и допускать перелив пены через край котла.

Возле термосов (котлов) должен находиться комплект противопожарных средств: пенные огнетушители, лопаты, сухой песок в ящиках.

При воспламенении мастики котел следует плотно закрыть крышкой и погасить огонь огнетушителями и песком.

Запрещается тушить горящую мастику водой.

Битумоварочные котлы следует устанавливать на расстоянии не менее 50 м от строящегося здания, а бак с топливом — на расстоянии не менее 5 м от котла; при установке котлов вблизи несгораемых зданий деревянные окна и двери в зоне рабочей площадки необходимо перекрыть снаружи асбофанерой или кровельной сталью.

Горячую мастику из термосов (котлов) следует подавать на покрытие при помощи насоса по трубопроводам, к рабочим местам доставлять в закрытых стальных баках.

Проходы к рабочим местам необходимо содержать в чистоте.

Во избежание ожогов при огрунтовке оснований способом распыления и наклейке рулонных материалов на горячей битумной мастике кровельщик должен быть в защитных очках и находиться с наветренной стороны.

Попавшие на кожу битум, пек или мастику следует смывать пастой-мылом Института имени Ф. Ф. Эрисмана или мыло-ланолиновой пастой и теплой водой. В случае ожога необходимо обращаться в медпункт.

При работе с дегтепековыми материалами обязательно соблюдение следующих требований:

осуществлять врачебный надзор за состоянием здоровья рабочих;

погрузку и разгрузку пеков выполнять преимущественно механизированным способом;

до начала работы с дегтевыми материалами лицо и руки смазывать специальной пастой, а после работы принять теплый душ или умыться теплой водой с мылом.

Состав специальной пасты: окись цинка, тальк, глицерин, вода, взятые в равных дозах, и 3% сажи от общей массы состава.

На каждой рабочей площадке должна быть аптечка с набором перевязочных материалов и медикаментов против ожогов.

При складировании на покрытии штучных кровельных материалов, инструментов, тары с мастикой и другими составами во избежание их падения на землю необходимо устраивать ограждение, а во время перерывов в работе и после окончания смены все оставшиеся на покрытии материалы, инструменты и приспособления убирать.

Электропроводку для освещения рабочих мест и обогрева трубопровода, бачков и др. следует содержать в исправном состоянии и обязательно выключать электрорубильники после окончания работы.

Курильщики разрешается в специально отведенных для этого местах.

Очищаемую с полотниц рулонных материалов посыпку следует собирать в стальной бачок с крышкой и в такой же бачок складывать ветошь после очистки ею рулонных материалов.

Растворители грунтовок и холодные мастики необходимо хранить в отдельных кладовых.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

### УСТРОЙСТВО С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИНЫ КОНСТРУКЦИИ ТРЕСТА МОСОРГСТРОЙ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО РУЛОННОГО КОВРА НА ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЛК ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

#### I. Область применения

Технологическая карта разработана на устройство с применением машины конструкции треста Мосоргстрой четырехслойного гидроизоляционного рулонного ковра на холодной битумной мастике БЛК по комплексным плитам покрытия повышенной заводской готовности в жилых зданиях.

#### II. Техничко-экономические показатели (на 1000 м<sup>2</sup> покрытия)

Наименование показателей	При высоте здания	
	до 20 м	более 32 м
Затраты труда на устройство гидроизоляционного ковра, чел-дн	17,9	17,9
Потребность в машинах, маш-см	8	8
Потребность в электроэнергии, квтч	2,74	3,86

#### III. Организация и технология строительного процесса

Рулонный ковер наклеивают после принятия основания под кровлю заказчиком и составления акта на скрытые работы в соответствии с требованиями, изложенными в Пояснительной записке.

Для устройства гидроизоляционного ковра принят тип кровли, приведенный на рис. 1.

Рис. 1. Конструкция рулонной кровли

1 — первый слой рубероида РК-420 на мастике БЛК; 2 — два слоя рубероида гнилостойкого или обычного РП-250 на холодной битумной мастике БЛК; 3 — плита повышенной заводской готовности



Для наклейки ковра применяют мастику БЛК, составленную по двум рецептам (в % по массе).

Рецепт № 1: битум БН-IV — 25; лак-кукерсоль — 62; латекс Л-4 или СКС-30 — 3; портландцемент — 4; асбест VI—VII сорта — 6.

Рецепт № 2: битум БН-IV — 35; лак-кукерсоль — 52; латекс Л-4 или СКС-30 — 3; портландцемент — 4; асбест VI—VII сорта — 6.

Мастика, составленная по рецепту № 1, предназначена для применения в зимних условиях при температуре наружного воздуха ниже +5° С; по рецепту № 2 — для использования в летнее время.

При наклейке рулонных материалов холодными мастиками следует выполнять требования СНиП III-Б. 12-69 раздел 3 и «Временных указаний по применению мастики БЛК»:

применять только покровные рулонные материалы;

перед наклейкой рулонные материалы выдерживать в раскатанном виде не менее 20 ч.

Рулонные материалы подают на покрытие крапом Т-108А и подвозят к рабочим местам двухколесными тележками на пневмоходу.

Полотнища гидроизоляционного ковра наклеивают машиной конструкции треста Мосоргстрой по захваткам и деланкам в направлении навстречу подаче материалов и в последовательности, указанной на рис. 2.

Наклеечная машина раскатывает рулоны, наносит на них слой мастики, приклеивает и прикатывает к основанию. Машина состоит из рамы, бака для мастики емкостью 60 л, раскладочной рамки, шестеренчатого насоса от автомобиля ЗИЛ-164А, щеток, прижимного катка с панцирной сеткой и шпателя.

Холодные мастики готовят централизованно и доставляют на объект в автогудронаторах.

Для подачи мастики на покрытие зданий высотой до девяти этажей используют автогудронатор, на раме которого смонтированы цистерна, реверсивный шестеренчатый насос, электродвигатель, перемешивающее устройство и реверсивный электровыключатель. На объекте автогудронатор с помощью шланга соединяют с трубопроводом диаметром 2". К наклеечной машине мастику подвозят в бачках на пневмоходу. На покрытие зданий высотой более девяти этажей мастику подают следующим образом: из автогудронатора ее заливают в термос системы СКБ Мосстроя емкостью 1800 л; из термоса в заправочные баки на пневмоходу емкостью

120 л и в них поднимают на покрытие подъемником УСП-1.

При перерывах в работе свыше 1 часа всю систему промывают подогретым соляровым маслом.

Наклейку гидроизоляционного ковра начинают от свесов и выполняют в направлении стока воды.

Нахлестка полотнищ в стыках во всех слоях и

направлениях должна составлять не менее 100 мм (рис. 3). Нахлестку полотнищ в стыках верхнего слоя выполняют по направлению розы ветров.

Для верхнего слоя дополнительного гидроизоляционного ковра в местах примыканий рекомендуется применять бронированный рубероид с чешуйчатой или крупозернистой посыпкой.

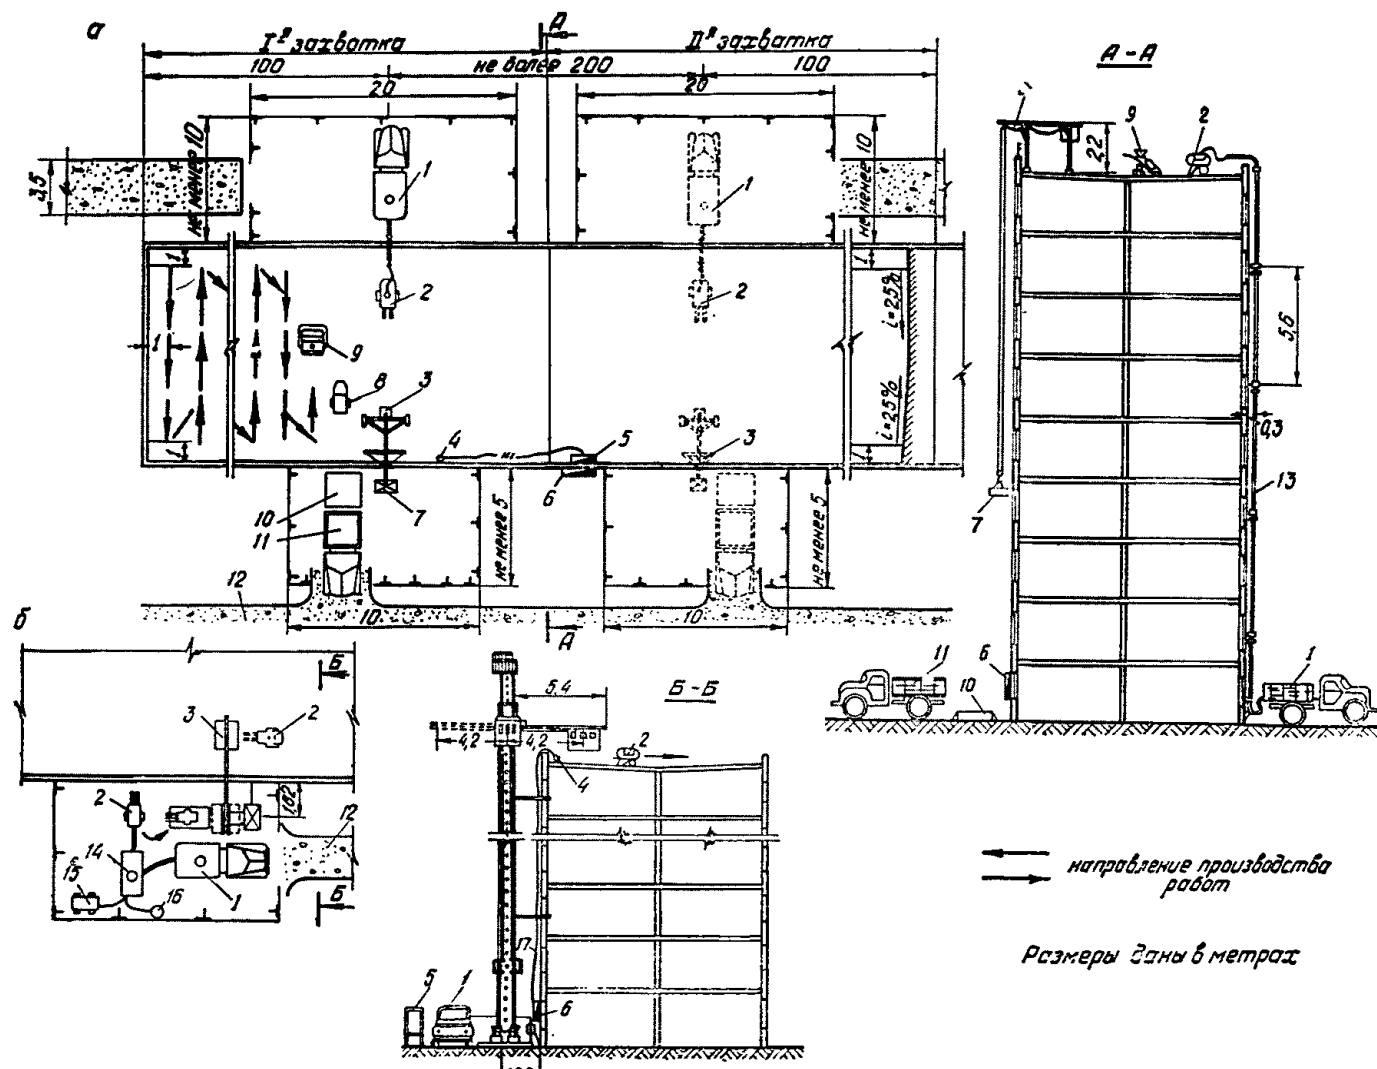


Рис. 2. Схема производства работ

а — с применением подъемника К-1 (для зданий высотой 5–9 этажей); б — с применением подъемника УСП-1 (для зданий высотой более 9 этажей)  
 1 — автогудронатор; 2 — машина для развозки мастики; 3 — подъемник К-1 (УСП-1); 4 — пункт подключения; 5 — распределительное устройство; 6 — шкаф питания; 7 — контейнер для рубероида; 8 — двухколесная тележка; 9 — наклеивающая машина; 10 — площадка для приемки материалов; 11 — автомобиль; 12 — автодорога; 13 — битумопровод диаметром 25 мм; 14 — термос емкостью 1800 л; 15 — компрессор СО-7; 16 — бачок для солярового масла; 17 — гибкий кабель в резиновой изоляции

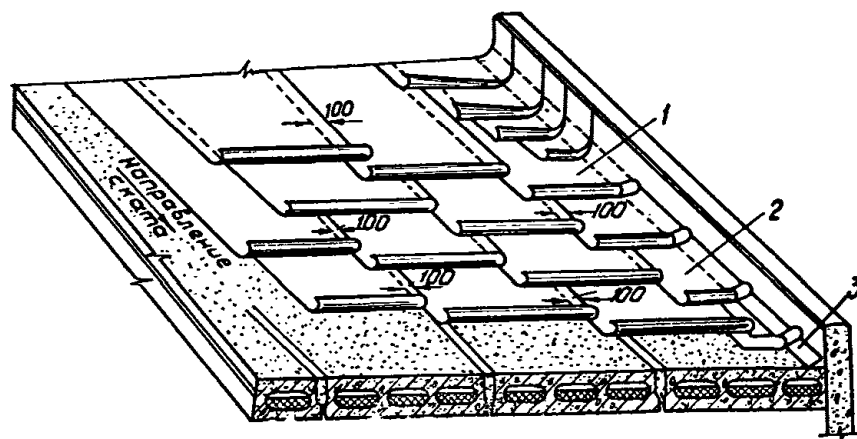


Рис. 3. Деталь устройства четырехслойного рулонного ковра в местах примыканий

1 — дополнительное полотнище третьего слоя (3/4 ширины рулона); 2 — дополнительное полотнище второго слоя (1/2 ширины рулона); 3 — дополнительное полотнище первого слоя (1/4 ширины рулона)

## Производство кровельных работ в зимних условиях

Устройство рулонных кровель на мастике БЛК в зимний период допускается при температуре наружного воздуха не ниже  $-20^{\circ}\text{C}$ .

Рулонные кровельные материалы до укладки должны быть отогреты в теплом помещении до положительной температуры и доставлены к месту укладки в утепленной таре.

Наклеивание рулонного материала в зимнее время допускается на основание, огрунтованное до наступления зимы. Поверхность основания перед наклеивкой рулонных материалов должна быть сухой и отогретой до положительной температуры. Запрещается наклеивать рулонные материалы на поверхности, не очищенные от инея, снега и льда.

Без подогрева холодную битумную мастику БЛК применяют при температуре наружного воздуха в момент укладки  $+10^{\circ}\text{C}$  и выше, при более низкой температуре мастику следует подогревать так, чтобы в момент нанесения температура ее была не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$ . Подогревают мастику до температуры не выше  $70^{\circ}\text{C}$  в водной или песчаной ванне.

## IV. Организация и методы труда рабочих

Наклеивку рулонного ковра выполняют два специализированных звена общей численностью 8 человек, входящие в комплексную бригаду кровельщиков (см. таблицу).

Таблица

Состав звеньев бригады по профессиям и перечень выполняемых ими работ

№ звена	Состав звена по профессиям	Количество рабочих	Перечень выполняемых работ
1	Изолировщик 4 разряда	2	Раскатка и примерка рулонов, разметка на основании. Наклейка полотнищ рулона с помощью машины конструкции треста Мосоргстрой
	Изолировщик 3 разряда	1	

## V. Калькуляция затрат труда и заработной платы

Калькуляция затрат труда и заработной платы рабочих на устройство четырехслойного рулонного ковра из рубероида на холодной битумно-латексно-кукерсолной мастике БЛК (на  $1000\text{ м}^2$  покрытия)

Шифр норм*	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения, чел-ч	Затраты труда на общий объем работ, чел-ч	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.	Заработная плата на общий объем работ, руб.-коп.
Основные работы							
Расчет № 28	Наклейка четырехслойного рулонного ковра при помощи машины треста Мосоргстрой с нанесением на поверхность основания холодной мастики, с обслуживанием и уходом за машиной. Производительность машины в однослойном исчислении за смену $1200\text{ м}^2$	$100\text{ м}^2$	9	8,2	73,8	4—93,6	44—42
ЕНиР, 1969, § 7—1, № 8 за исключением § 11—46 № 26	То же, в недоступных местах; наклеивка вручную без приготовления мастики (10% от общего объема)	$100\text{ м}^2$	4	4,85	19,4	2—95,3	11—81
Итого					93,2		56—23

## Продолжение

№ звена	Состав звена по профессиям	Количество рабочих	Перечень выполняемых работ
2	Машинист 3 разряда	1	Оклейка мест примыканий и обделка водосточных воронок вручную Транспортные и вспомогательные работы
	Изолировщик 2 разряда	1	
	Транспортный рабочий 1 разряда	1	
	Такелажник 2 разряда	2	

Один изолировщик 4 разряда примеряет рулоны и размечает их на основании. Два других изолировщика 4 и 3 разрядов раскатывают рулон на 2—3 м в заданном направлении для примерки его к ранее наклеенному, наносят на основание под отогнутый на 80—100 см конец рулона слой мастики, разравнивают его гребком и приклеивают отогнутый конец рулона к основанию. Затем поднимают затвор смазочной камеры, вставляют ось в рулон, который укладывают в гнезда раскладной рамки, после чего опускают затвор камеры на полотно рулона и насосом подают в камеру мастику.

При движении наклеивочной машины рулон разматывается, нижняя сторона его полотнища, проходя через смазочную камеру, смазывается мастикой, наклеивается на основание и прикатывается прижимным катком.

Машинист 3 разряда обслуживает битумонасосную установку, промывает и продувает трубопроводы. Изолировщик 2 разряда следит за трубопроводом, открывает кран для заправки бачка-заправщика. Транспортный рабочий 1 разряда развозит кровельные материалы по покрытию к месту укладки. Два такелажника 2 разряда заняты строповкой и расстроповкой при подъеме кровельных материалов на покрытие.



Шифр норм*	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения, чел-ч	Затраты труда на общий объем работ, чел-ч	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.	Заработная плата на общий объем работ, руб.-коп.
<i>Транспортные и вспомогательные работы</i>							
ЕНиР 1969, § 11—68	Подача холодной битумной мастики автогудронатором по трубопроводу с уходом за установкой, промывкой и продувкой шлангов (для зданий высотой до девяти этажей)	1 м <sup>3</sup>	3,2	0,7	2,24	0—38,9	1—24
	для машиниста	1 м <sup>3</sup>	3,2	0,7	2,24	0—34,5	1—10
ЕНиР, 1969, § 1—13, т. 1, № 10, примеч. 1	Перемещение бачка-заправщика с холодной мастикой от автоцистерны к подъемнику УСП-1 на расстояние до 20 м в стесненных условиях (для зданий высотой более 9 этажей)	1 т	3,2	1,115	3,57	0—55	1—76
ЕНиР, 1969, § 11—66, № 1а	Очистка рубероида от талька на станке с одной стороны и кромки с другой	100 м <sup>2</sup>	12,2	0,6	7,32	0—31,4	3—83
ЕНиР, 1969, § 11—66, № 1б	То же, с обеих сторон	1 т	7,3	0,83	6,06	0—43,5	3—17
ЕНиР, 1969, § 1—11, № 3г	Разгрузка рулонных материалов с автомобиля и их укладка	1 т	7,3	0,57	4,16	0—25	1—83
ЕНиР, 1969, § 1—15, № 8	Укладка рулонных материалов в пакеты-контейнеры для подъема	1 т	7,3	0,98	7,15	0—42,9	3—13
Расчет № 27	Перемещение бачка-заправщика с холодной мастикой на расстояние до 100 м по покрытию	1 т/км	0,32	5,51	1,76	2—41,3	0—77
Расчет № 28	Погрузка мастики в бачок-заправщик из трубопровода с открыванием крана и разгрузкой	1 т	3,2	2,98	9,54	1—65,4	5—30
ЕНиР, 1969, § 1—13, т. 1, № 3, т. 2, № 3	Перевозка рулонных материалов по покрытию двухколесными тележками на расстояние до 50 м с погрузкой накладыванием и разгрузкой опусканием. На каждые последующие 50 м перемещения добавлять на 1 т	1 т	7,3	0,8	5,84	0—39,4	2—88
	0.10						
	0—0,49						
Итого для зданий высотой до девяти этажей					46,31		23—25
Итого для зданий высотой более девяти этажей					45,4		22—67
ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2 № 6 а+(6×2)	Вертикальная транспортировка рулонных материалов на покрытие при высоте здания 20 м подъемником типа К-1	100 т	0,073	32,4	2,37	17—99	1—47
	для машиниста	100 т	0,073	64,8	4,73	31—92	2—33
	для такелажника						
Итого					7,1		3—80
ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 20 а+(6×4)	при высоте здания 32 м подъемником типа УСП-1						
	для машиниста	100 т	0,105	15,8	1,66	8—77	0—92
	для такелажника	100 т	0,105	63,2	6,64	31—16	3—27
Итого					8,3		4—19

\* Указанные в графе «Шифр норм» расчеты приведены в Приложении.

**Комплексные нормы времени (числитель, чел.-ч) и расценки (знаменатель, руб.— коп.) на устройство четырехслойного рулонного ковра на холодной мастике типа БЛК (на 1000 м<sup>2</sup> покрытия)**

Наименование работ	Высота здания и тип подъемника	
	до девяти этажей, подъемник К-1	более девяти этажей, подъемник УСП-1
Основные работы	93,2 56—23	93,2 56—23
Транспортные и вспомогательные работы	46,31 23—25	45,4 22—67

**Продолжение**

Наименование работ	Высота здания и тип подъемника	
	до девяти этажей, подъемник К-1	более девяти этажей, подъемник УСП-1
Вертикальная транспортировка	7,1 3—80	8,3 4—19
Общие затраты	146,61 83—28	146,9 83—09

Примечания. 1. Комплексными нормами предусмотрен подъем материалов подъемником К-1 на высоту до 20 м и подъемником УСП-1 на высоту до 32 м.

2. Комплексными нормами времени и расценками не предусмотрена обделка водосточных воронок. На обделку водосточной воронки к комплексной норме времени и расценке, согласно ЕНиР, 1969, § 7—1, № 12, следует прибавить 1,4  
0—98,3

**VI. График производства работ (на 1000 м<sup>2</sup> гидроизоляционного ковра)**

Наименование работ	Затраты труда		Исполнители работ	Рабочие дни				
	на единицу измерения (1 м <sup>2</sup> ), чел.-ч	на общий объем работ, чел.-дн		1	2	3	4	5
Наклейка гидроизоляционного ковра первого слоя	0,0278	3,39	Изолировщик 4 разряда — 2 человека Изолировщик 3 разряда — 1 человек То же » »					
второго слоя	0,0278	3,39	То же					
третьего слоя	0,0278	3,39	»					
четвертого слоя	0,0278	3,39	»					
Транспортные и вспомогательные работы	0,083	10	Машинист 3 разряда — 1 человек Изолировщик 2 разряда — 1 человек Такелажник 2 разряда — 2 человека Транспортный рабочий 1 разряда — 1 человек					

Примечание. Пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов при выполнении данного процесса. Полностью механизмы используются на параллельных работах.

**Материалы, полуфабрикаты (на 1000 м<sup>2</sup> кровли)**

Наименование	Единица измерения	Норма расхода материалов
Рубероид РК-420 (РЧ-50)	м <sup>2</sup>	1218
Рубероид РП-250	м <sup>2</sup>	3652
Мастика битумно-латексно-кукерсольная холодная марки БЛК	т	3,2

**Машины, оборудование, инструмент, приспособления**

Наименование	Количество, шт.	Техническая характеристика
Автогудронатор	1	Емкость цистерны 3600 л
Термос системы Мосстроя	1	Емкость 1,8 м <sup>3</sup>

**Продолжение**

Наименование	Количество, шт.	Техническая характеристика
Подъемник К-1 (УСП-1)	1 (1)	Грузоподъемность 300 кг (500 кг)
Машина для наклейки рулонных материалов конструкции треста Мосоргстрой		Производительность в смену однослойного ковра 1200 м <sup>2</sup>
Контейнер	2	Металлический на 10 рулонов
Двухколесная тележка на пневмоходу	2	Грузоподъемность 200 кг
Бачок на пневмоходу для мастики	2	Емкость 120 л
Каток ручной (для прикатки ковра в местах примыкания)	1	С мягкой обкладкой
Термос	4	Емкость 20 л
Щетка	2	Для нанесения мастики на места примыкания
Шпатель-нож	2	

# РАСЧЕТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ КОВРОВ \*

## РАСЧЕТ № 1

Нормы времени и расценки на очистку 1000 м<sup>2</sup> поверхности основания от мусора и пыли при помощи воздушной продувки. Производительность агрегата — 300 м<sup>2</sup>/ч. Работу выполняет кровельщик 3 разряда. Норма времени  $1000 : 300 = 3,34$  чел-ч. Расценка  $55,5 \times 3,34 = 1$  руб. 85,4 коп.

## РАСЧЕТ № 2

Нормы времени и расценки на устройство 1000 м<sup>2</sup> рулонной кровли в два слоя с нанесением мастики удочкой-распылителем, раскатыванием рулонов ручным приспособлением и наклейкой гидроизоляционного ковра вручную.

Производительность удочки-распылителя при наклейке в два слоя — 600 м<sup>2</sup>/см или  $600 : 8,2 = 73$  м<sup>2</sup>/ч.

Состав звена: машинист 4 разряда — 1; изолировщик 4 разряда — 2; изолировщик 2 разряда — 1; изолировщик 3 разряда — 2.

Норма времени  $\frac{1000}{73} \times 6 = 82,2$  чел-ч.

Средняя часовая ставка звена  $(62,5 \times 3) + (55,5 \times 2) + 49,3 : 6 = 57$  руб. 96 коп. Расценка на 1000 м<sup>2</sup>  $57,96 \times 82,2 = 47$  руб. 64 коп.

## РАСЧЕТ № 3

Нормы времени и расценки на устройство 1000 м<sup>2</sup> защитного слоя из гравия при помощи машины конструкции ЦНИИОМТП.

Производительность машины 1400 м<sup>2</sup>/см защитного слоя или  $1400 : 8,2 = 171$  м<sup>2</sup>/ч.

Работу выполняет машинист 4 разряда.

Норма времени  $1000 : 171 = 5,86$  чел-ч.

Расценка  $62,5 \times 5,86 = 3$  руб. 66,2 коп.

## РАСЧЕТ № 4

Нормы времени и расценки на подачу 1 т мастики на покрытие установкой конструкции ВНИИстройдормаша или СО-67.

Производительность установки 1,1 т/ч.

Работу выполняет машинист 4 разряда.

Норма времени  $1 : 1,1 = 0,9$  чел-ч.

Расценка  $62,5 \times 0,9 = 56,2$  коп.

## РАСЧЕТ № 5

Нормы времени и расценки на наклейку машинной конструкции ЦНИИОМТП 1000 м<sup>2</sup> однослойного рулонного ковра на холодной или горячей мастике.

Производительность машины 1600 м<sup>2</sup>/смену или  $1600 : 8,2 = 195$  м<sup>2</sup>/ч.

Состав звена: машинист 4 разряда — 1; изолировщик 2 разряда — 1.

Норма времени  $\frac{1000}{195} \times 2 = 10,24$  чел-ч.

Средняя часовая ставка звена  $(62,5 + 49,3) : 2 = 55,9$  коп. Расценка  $10,24 \times 55,9 = 5$  руб. 72,4 коп.

## РАСЧЕТ № 6

Нормы времени и расценки на устройство пароизоляции стыков комплексных плит 1000 м<sup>2</sup> покрытия.

Наклейка пароизоляционных полос из изола шириной до 0,2 м на холодной мастике согласно ЕНиР, 1969, § 11—35, № 1а на 100 м стыка:

норма времени 8,5 чел-ч;

расценка 4 руб. 37 коп.

Для плит размерами 1,5×6 м

Длина стыков на 1000 м<sup>2</sup> покрытия  $1000 \times \frac{1,5+6}{1,5 \times 6} = 833$  м.

Норма времени  $8,5 \times 8,33 = 70,81$  чел-ч.

Расценка  $4,37 \times 8,33 = 36$  руб. 40,2 коп.

Для плит размерами 1,5×12 м

Длина стыков на 1000 м<sup>2</sup> покрытия —  $1000 \times \frac{1,5+12}{1,5 \times 12} = 750$  м.

Норма времени  $8,5 \times 7,5 = 63,75$  чел-ч.

Расценка  $4,37 \times 7,5 = 32$  руб. 76 коп.

Для плит размерами 3×6 м

Длина стыков на 1000 м<sup>2</sup> покрытия —  $1000 \times \frac{3+6}{3 \times 6} = 500$  м.

Норма времени  $8,5 \times 5 = 42,5$  чел-ч.

Расценка  $4,37 \times 5 = 21$  руб. 85 коп.

Для плит размерами 3×12 м

Длина стыков на 1000 м<sup>2</sup> покрытия —  $1000 \times \frac{3+12}{3 \times 12} = 417$  м.

Норма времени  $8,5 \times 4,17 = 35,4$  чел-ч.

Расценка  $4,37 \times 4,17 = 18$  руб. 22 коп.

Состав звена: изолировщик 3 разряда — 1; изолировщик 2 разряда — 2.

## РАСЧЕТ № 7

Нормы времени и расценки на засыпку стыков комплексных плит керамзитовым гравием или легкой бетонной смесью с уплотнением.

Применительно к ЕНиР, 1969, § 11—10, объем засыпки при ее толщине 0,12 м на 1 м стыка  $\frac{0,3+0,21}{2} \times 0,12 = 0,03$  м<sup>3</sup>.

На 1 м<sup>3</sup> засыпки:

норма времени 1,35 чел-ч;

расценка 66,6 коп.

\* Во всех расчетах принята часовая ставка рабочих 4 разряда — 62,5 коп., 3 разряда — 55,5 коп., 2 разряда — 49,3 коп. и 1 разряда — 43,8 коп.

Норма времени на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:  
 $1,5 \times 6 - 833 \times 0,03 \times 1,35 = 33,7$  чел-ч;  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 0,03 \times 1,35 = 30,4$  чел-ч;  
 $3 \times 6 - 500 \times 0,03 \times 1,35 = 20,3$  чел-ч;  
 $3 \times 12 - 417 \times 0,03 \times 1,35 = 16,89$  чел-ч.

Расценка на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:

$1,5 \times 6 - 833 \times 0,03 \times 66,6 = 16$  руб. 64 коп.;  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 0,03 \times 66,6 = 14$  руб. 98,5 коп.;  
 $3 \times 6 - 500 \times 0,03 \times 66,6 = 9$  руб. 99 коп.;  
 $3 \times 12 - 417 \times 0,03 \times 66,6 = 8$  руб. 33 коп.

Работу выполняет изолировщик 2 разряда.

#### РАСЧЕТ № 8

Нормы времени и расценки на устройство стяжки толщиной 25 мм из цементно-песчаного раствора по засыпке стыков комплексных плит.

По ЕНиР, 1969, § 7—15, № 12 на 1 м<sup>2</sup> стяжки:

норма времени 0,25 чел-ч;

расценка 14,75 коп.

Норма времени на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:

$1,5 \times 6 - 833 \times 0,25 = 62,48$  чел-ч;  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 0,3 \times 0,25 = 56,25$  чел-ч;  
 $3 \times 6 - 500 \times 0,3 \times 0,25 = 37,5$  чел-ч;  
 $3 \times 12 - 417 \times 0,3 \times 0,25 = 31,27$  чел-ч.

Расценка на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:

$1,5 \times 6 - 833 \times 0,3 \times 14,75 = 36$  руб. 86 коп.  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 0,3 \times 14,75 = 34$  руб. 65,8 коп.  
 $3 \times 6 - 500 \times 0,3 \times 14,75 = 22$  руб. 12,5 коп.  
 $3 \times 12 - 417 \times 0,3 \times 14,75 = 18$  руб. 45,2 коп.

Работу выполняет бетонщик 3 разряда.

#### РАСЧЕТ № 9

Нормы времени и расценки на устройство асфальтовой стяжки толщиной 20 мм по засыпке стыков комплексных плит.

По ЕНиР, 1969, § 7—15, № 10 на 1 м<sup>2</sup> стяжки:

норма времени 0,088 чел-ч;

расценка 5,19 коп.

Норма времени на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:

$1,5 \times 6 - 833 \times 0,3 \times 0,088 = 22$  чел-ч;  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 0,3 \times 0,088 = 19,8$  чел-ч;  
 $3 \times 6 - 500 \times 0,3 \times 0,088 = 13,2$  чел-ч;  
 $3 \times 12 - 417 \times 0,3 \times 0,088 = 11,01$  чел-ч.

Расценка на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:

$1,5 \times 6 - 833 \times 0,3 \times 5,19 = 12$  руб. 97 коп.;  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 0,3 \times 5,19 = 11$  руб. 67,8 коп.;  
 $3 \times 6 - 500 \times 0,3 \times 5,19 = 7$  руб. 78,5 коп.;  
 $3 \times 12 - 417 \times 0,3 \times 5,19 = 6$  руб. 49 коп.

Состав звена: изолировщик 4 разряда — 1; изолировщик 3 разряда — 1.

#### РАСЧЕТ № 10

Нормы времени и расценки на огрунтовку с помощью пистолета-распылителя холодной битумной грунтовкой цементно-песчаной стяжки по засыпке стыков комплексных плит.

Применительно к ЕНиР, 1969, § 8—24, № 12ж на 1 м<sup>2</sup> покрытия:

норма времени 0,018 чел-ч;

расценка 1,13 коп.

Норма времени на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:

$1,5 \times 6 - 833 \times 0,3 \times 0,018 = 4,5$  чел-ч;  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 0,3 \times 0,018 = 4,05$  чел-ч;  
 $3 \times 6 - 500 \times 0,3 \times 0,018 = 2,7$  чел-ч;  
 $3 \times 12 - 417 \times 0,3 \times 0,018 = 2,25$  чел-ч.

Расценка на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:

$1,5 \times 6 - 833 \times 0,3 \times 1,13 = 2$  руб. 82,4 коп.;  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 0,3 \times 1,13 = 2$  руб. 54,3 коп.;  
 $3 \times 6 - 500 \times 0,3 \times 1,13 = 1$  руб. 69,5 коп.;  
 $3 \times 12 - 417 \times 0,3 \times 1,13 = 1$  руб. 41,3 коп.

Работу выполняет изолировщик 4 разряда.

#### РАСЧЕТ № 11

Нормы времени и расценки на наклейку в два слоя полос шириной 0,5 и 0,7 м из рулонных материалов на битумной мастике по стыкам комплексных плит.

По ЕНиР, 1969, § 11—35, № 1а, б на 1 м стыка:

норма времени 0,127 чел-ч;

расценка 6,53 коп.

Норма времени на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:

$1,5 \times 6 - 833 \times 0,127 \times 2 = 211,6$  чел-ч;  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 0,127 \times 2 = 190,5$  чел-ч;  
 $3 \times 6 - 500 \times 0,127 \times 2 = 127$  чел-ч;  
 $3 \times 12 - 417 \times 0,127 \times 2 = 105,92$  чел-ч.

Расценка на 1000 м<sup>2</sup> покрытия из плит размерами:

$1,5 \times 6 - 833 \times 6,53 \times 2 = 108$  руб. 80 коп.;  
 $1,5 \times 12 - 750 \times 6,53 \times 2 = 97$  руб. 95 коп.;  
 $3 \times 6 - 500 \times 6,53 \times 2 = 65$  руб. 30 коп.;  
 $3 \times 12 - 417 \times 6,53 \times 2 = 54$  руб. 46 коп.

Состав звена: изолировщик 3 разряда — 1; изолировщик 2 разряда — 2.

#### РАСЧЕТ № 12

Нормы времени и расценки на наклейку основного однослойного рулонного гидроизоляционного ковра вручную на холодной и горячей битумных мастиках.

Согласно ЕНиР, 1969, § 7—1, № 7 на 100 м<sup>2</sup> слоя:

норма времени 6,2 чел-ч;

расценка 3 руб. 44 коп.

В эти нормы времени и расценки не включены вспомогательные работы, перечисляемые ниже.

Очистка основания от мусора.

В соответствии с расчетом № 1 на 100 м<sup>2</sup> покрытия:

норма времени 0,33 чел-ч;

расценка 18,54 коп.

Очистка рулонных материалов от посыпки.

По ЕНиР, 1969, § 11—66, № 1а на 100 м<sup>2</sup>:

норма времени 0,6 чел-ч;

расценка 31,4 коп.

Приготовление горячих мастик.

По ЕНиР, 1969, § 11—46, п. 26 на 1 т:

норма времени 13,5 чел-ч;

расценка 7 руб. 07 коп.

Из расчета 0,25 т мастики на 100 м<sup>2</sup> однослойного ковра:

норма времени  $13,5 \times 0,25 = 3,4$  чел-ч;

расценка  $7,07 \times 0,25 = 1$  руб. 76,8 коп.

Огрунтовка холодной битумной мастикой 100 м<sup>2</sup> поверхности основания (применительно к ЕНиР, 1969, § 8—24, № 12ж):

норма времени 1,8 чел-ч;

расценка 1 руб. 13 коп.

Устройство свесов из расчета 2,5% на 100 м<sup>2</sup> покрытия.

По ЕНиР, 1969, § 7—8, № 1а:

норма времени  $0,19 \times 2,5 = 0,48$  чел-ч;

расценка  $10,6 \times 2,5 = 26,5$  коп.

Устройство мест примыкания из расчета 2,5% на 100 м<sup>2</sup> покрытия.

По ЕНиР, 1969, § 11—32, № 3а:

норма времени  $0,195 \times 2,5 = 0,49$  чел-ч;

расценка  $10,9 \times 2,5 = 27,3$  коп.

Всего по вспомогательным работам:

норма времени  $0,33 + 0,6 + 3,4 + 1,8 + 0,48 + 0,49 = 7,1$  чел-ч;

расценка  $18,54 + 31,4 + 176,8 + 113 + 26,5 + 27,3 = 3$  руб. 93,5 коп.

В целом на наклейку 1000 м<sup>2</sup> однослойного ковра:

норма времени  $(6,2 + 7,1) \times 10 = 133$  чел-ч;

расценка  $(344 + 393,5) \times 10 = 73$  руб. 75 коп.

#### РАСЧЕТ № 13

Нормы времени и расценки на развозку машиной гравия по кровле от приемно-раздаточного бункера в зону работы.

Емкость бункера машины 0,2 м<sup>3</sup> = 0,36 т.

Скорость перемещения машины — 5 км/ч.

Дальность перевозки — 70 м.

Работу выполняет машинист 3 разряда.

Измеритель — 1 ездка (цикл) машины.

Норма времени на измеритель определяется:

нормой времени простоя машины под погрузкой и разгрузкой по ЕНиР, 1969, § 1—11, 1в, 1д

$(0,034 + 0,033) \times 0,36 = 0,025$  чел-ч;

нормой времени на перемещение машины от приемно-раздаточного бункера в зону работы и обратно порожняком

$70 \times 2 : 5000 = 0,028$  чел-ч.

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)

$(0,025 + 0,028) \times 1,25 = 0,066$  чел-ч,

где 1,25 — коэффициент маневренности машины.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель

$55,5 \times 0,06 = 0,36$  коп.

#### РАСЧЕТ № 14

Нормы времени и расценки на транспортировку флаг с холодной грунтовкой и мастикой, а также термосов с горячей мастикой мотороллером ТГ-200 по кровле от крана в зону работы.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.  
Скорость перемещения мотороллера — 5 км/ч.  
Дальность перевозки — 70 м.  
Работу выполняет машинист 3 разряда.  
Измеритель — 1 ездка (цикл) мотороллера.  
Норма времени (на измеритель) определяется:  
нормой времени простоя машины под погрузкой и разгрузкой по ЕНиР, 1969, § 1—11, 3а, 3д  
 $(0,53+0,44) \times 0,2 = 0,194$  чел-ч;

нормой времени на перемещение мотороллера от крана в зону работы и обратно порожняком  
 $70 \times 2 : 5000 = 0,028$  чел-ч.

Норма времени на погрузку порожней тары при ее массе 50 кг (фляги, термоса) по ЕНиР, 1969, § 1—11, 3а, 3д и простоя при строповке тары

$$(0,53+0,44) \times 0,05 = 0,048 \text{ чел-ч.}$$

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)  
 $(0,194+0,028+0,048) \times 1,25 = 0,34$  чел-ч.

где 1,25 — коэффициент маневренности машины.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель  
 $55,5 \times 0,34 = 18,9$  коп.

#### РАСЧЕТ № 15

Нормы времени и расценки на транспортировку теплоизоляционных сыпучих материалов, цементно-песчаного раствора и литого асфальта мотороллером ТГ-200 по покрытию от крана в зону работы.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.  
Скорость перемещения мотороллера — 5 км/ч.  
Дальность перевозки — 70 м.  
Работу выполняет машинист 3 разряда.  
Измеритель — 1 ездка (цикл) мотороллера.  
Норма времени на измеритель определяется:  
нормой времени простоя под нагрузкой из бункера и разгрузкой опрокидыванием по ЕНиР, 1969, § 1—11, 3в, 3д

$$(0,034+0,033) \times 0,2 = 0,013 \text{ чел-ч;}$$

нормой времени движения мотороллера от крана или пневмоустановки в зону работы и обратно порожняком  
 $70 \times 2 : 5000 = 0,028$  чел-ч.

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)  
 $(0,013+0,028) \times 1,25 = 0,051$  чел-ч.

где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда  
 $55,5 \text{ руб.} \times 0,051 = 02,8$  коп.

#### РАСЧЕТ № 16

Нормы времени и расценки на транспортировку рулонов рубероида мотороллером ТГ-200 по покрытию от крана в зону работы.

Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.  
Скорость движения мотороллера — 5 км/ч.  
Дальность перевозки — 70 м.  
Работу выполняет машинист 3 разряда.  
Измеритель — 1 ездка (цикл) мотороллера.  
Норма времени на измеритель определяется:  
нормой времени простоя под погрузкой и нормой времени на разгрузку по ЕНиР, 1969, § 1—11, 3а, 3д  
 $(0,53+0,44) \times 0,2 = 0,194$  чел-ч;

нормой времени движения мотороллера от крана в зону работ и обратно порожняком  
 $70 \times 2 : 5000 = 0,028$  чел-ч.

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)  
 $(0,194+0,028) \times 1,25 = 0,28$  чел-ч.

где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда  
 $55,5 \times 0,28 = 15,5$  коп.

#### РАСЧЕТ № 17

Нормы времени и расценки на транспортировку машиной конструкции ЦНИИОМТП мастики (холодной и горячей) от

раздаточного пункта трубопроводов до наклеочной машины с наполнением и опорожнением бака.

Емкость бака — 200 л.

Скорость движения машины — 5 км/ч.

Дальность перевозки — 70 м.

Работу выполняет машинист 3 разряда.

Измеритель: 1 ездка (цикл) машины.

Норма времени на измеритель определяется:

нормой времени на наполнение и опорожнение бака (согласно технической характеристике машины на опорожнение бака затрачивается 1,5 мин.)

$$\frac{1,5 \times 2}{60} = 0,05 \text{ чел-ч;}$$

нормой времени на рабочий и холостой пробег

$$70 \times 2 : 5000 = 0,028 \text{ чел-ч.}$$

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)

$$(0,05+0,028) \times 1,25 = 0,098 \text{ чел-ч,}$$

где 1,25 — коэффициент маневренности машины.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель  
 $55,5 \times 0,098 = 05,4$  коп.

#### РАСЧЕТ № 18

Нормы времени и расценки на транспортировку по покрытию кирпича мотороллером ТГ-200 от крана к месту работы.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.

Скорость движения мотороллера — 5 км/ч.

Дальность перевозки — 70 м.

Работу выполняет машинист 3 разряда.

Измеритель: 1 ездка (цикл) мотороллера.

Норма времени на измеритель определяется:

нормой времени простоя под погрузкой по ЕНиР, 1969, § 1—11, № 2а

$$0,63 \times 0,2 = 0,126 \text{ чел-ч;}$$

нормой времени на передвижение мотороллера от крана к месту работы и обратно порожняком

$$70 \times 2 : 5000 = 0,028 \text{ чел-ч.}$$

Нормы времени на разгрузку бункера опрокидыванием по ЕНиР, 1969, § 1—11, 3д

$$0,44 \times 0,2 = 0,088 \text{ чел-ч.}$$

Норма времени машиниста на 1 ездку

$$(0,126+0,028+0,088) \times 1,25 = 0,3 \text{ чел-ч,}$$

где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель  
 $55,5 \times 0,3 = 16,65$  коп.

#### РАСЧЕТ № 19

Нормы времени и расценки на транспортировку строительного мусора в кузове мотороллера ТГ-200 по покрытию к лоткам.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.

Скорость движения мотороллера — 5 км/ч.

Дальность перевозки — 70 м.

Работу выполняет машинист 3 разряда.

Измеритель: 1 ездка (цикл) мотороллера.

Норма времени на измеритель определяется:

нормой времени на погрузку и разгрузку строительного мусора по ЕНиР, 1969, § 1—11, 3б, 3д

$$(0,41+0,44) \times 0,2 = 0,17 \text{ чел-ч;}$$

нормой времени на передвижение мотороллера от места сбора мусора к лоткам для сбрасывания

$$70 \times 2 : 5000 = 0,028 \text{ чел-ч.}$$

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)

$$(0,17+0,028) \times 1,25 = 0,25 \text{ чел-ч,}$$

где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель  
 $55,5 \times 0,25 = 13,9$  коп.

#### РАСЧЕТЫ

*количества ездов машин для транспортировки материалов по покрытию промышленных зданий площадью 72×144 м.*

Машиной для развозки горячей мастики при наклеке трехслойного рулонного ковра.

Мастика — 77,8 т.

Грузоподъемность машины — 0,2 т.

Количество ездов 77,8 : 0,2 = 389.

Мотороллером ТГ-200 при перевозке рубероида для устройства трехслойного ковра.

Рубероид — 48,1 т.

Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.

Количество ездов  $48,1 : 0,2 = 241$ .

Машиной для развозки мастики при устройстве защитного слоя.

Мастика — 34,2 т.

Грузоподъемность машины — 0,2 т.

Количество ездов  $34,2 : 0,2 = 171$ .

Машиной для развозки гравия при устройстве защитного слоя.

Гравий — 107,8 м<sup>3</sup>.

Емкость бункера машины 0,2 м<sup>3</sup>.

Количество ездов  $107,8 : 0,2 = 539$ .

Машиной для развозки холодной мастики при наклейке трехслойного ковра.

Мастика — 25 т.

Грузоподъемность машины — 0,2 т.

Количество ездов  $25 : 0,2 = 125$ .

Машиной для развозки горячей мастики при наклейке двухслойного ковра.

Мастика — 55 т.

Грузоподъемность машины — 0,2 т.

Количество ездов  $55 : 0,2 = 275$ .

Мотороллером ТГ-200 при перевозке рубероида для устройства двухслойного ковра.

Рубероид — 33 т.

Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.

Количество ездов  $33 : 0,2 = 165$ .

Машиной конструкции ЦНИИОМТП для развозки холодной мастики для наклейки двухслойного ковра

Мастика — 16,6 т.

Грузоподъемность машины — 0,2 т.

Количество ездов  $16,6 : 0,2 = 83$ .

Мотороллер ТГ-200 для перевозки мусора по покрытию к лоткам

Мусор со всей поверхности — 51,8 т.

Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.

Количество ездов  $51,8 : 0,2 = 259$ .

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т для перевозки материалов при устройстве мест примыканий и обделок на кровле.

Керамзитовый гравий — 7,9 т.

Грузоподъемность за 1 езду — 0,15 т.

Количество ездов  $7,9 : 0,15 = 53$ .

Цементно-песчаный раствор — 13,7 т.

Количество ездов  $13,7 : 0,2 = 69$ .

Кирпич — 12,2 т.

Количество ездов  $12,2 : 0,2 = 61$ .

Минеральная вата — 0,36 т.

Количество ездов  $0,36 : 0,2 = 2$ .

Заготовки из кровельной стали — 5,43 т.

Количество ездов  $5,43 : 0,2 = 27$ .

## РАСЧЕТЫ

*количества ездов машин при горизонтальной транспортировке материалов для заделки стыков комплексных плит (на 1000 м<sup>2</sup> покрытия)*

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т для перевозки рубероида при устройстве паронизации стыков плит размерами:

$1,5 \times 6$  м — рубероида 0,22 т, количество ездов  $0,22 : 0,2 = 1$ ;

$1,5 \times 12$  м — рубероида 0,2 т, количество ездов  $0,2 : 0,2 = 1$ ;

$3 \times 6$  м — рубероида 0,13 т, количество ездов  $0,13 : 0,2 = 1$ ;

$3 \times 6$  м — рубероида 0,1 т, количество ездов  $0,1 : 0,2 = 1$  — принимаем 1.

Мотороллером ТГ-200 для перевозки мастики в термосах или флягах по четыре штуки за одну езду (массу перевозимой в них мастики принимаем равной 0,1 т) при устройстве паронизации стыков плит размерами:

$1,5 \times 6$  м — мастики 0,42 т, количество ездов  $0,42 : 0,1 = 4$ ;

$1,5 \times 12$  м — мастики 0,38 т, количество ездов  $0,38 : 0,1 = 3,8$  — принимаем 4;

$3 \times 6$  м — мастики 0,25 т, количество ездов  $0,25 : 0,1 = 2,5$  — принимаем 3;

$3 \times 12$  м — мастики 0,21 т, количество ездов  $0,21 : 0,1 = 2$ .

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при перевозке керамзита для теплоизоляции стыков плит размерами:

$1,5 \times 6$  м — керамзита 20 т, количество ездов  $20 : 0,2 = 100$ ;

$1,5 \times 12$  м — керамзита 18 т, количество ездов  $18 : 0,2 = 90$ ;

$3 \times 6$  м — керамзита 12 т, количество ездов  $12 : 0,2 = 60$ ;

$3 \times 12$  м — керамзита — 9,8 т, количество ездов  $9,8 : 0,2 = 49$ .

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при перевозке цементно-песчаного раствора для устройства стяжки стыков плит размерами:

$1,5 \times 6$  м — раствора 11,2 т, количество ездов  $11,2 : 0,2 = 56$ ;

$1,5 \times 12$  м — раствора 10,1 т, количество ездов  $10,1 : 0,2 = 50$ ;

$3 \times 6$  м — раствора 6,1 т, количество ездов  $6,1 : 0,2 = 30$ ;

$3 \times 12$  м — раствора 5,6 т, количество ездов  $5,6 : 0,2 = 28$ .

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при перевозке литого асфальта для устройства стяжки стыков плит размерами:

$1,5 \times 6$  м — литого асфальта 11 т, количество ездов  $11 : 0,2 = 55$ ;

$1,5 \times 12$  м — литого асфальта 9,9 т, количество ездов  $9,9 : 0,2 = 50$ ;

$3 \times 6$  м — литого асфальта 6,6 т, количество ездов  $6,6 : 0,2 = 33$ ;

$3 \times 12$  м — литого асфальта 5,5 т, количество ездов  $5,5 : 0,2 = 28$ .

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при перевозке грунтовок (масса перевозимой во флягах за 1 езду грунтовок принимается равной 0,1 т) для огрунтовки цементно-песчаной стяжки стыков плит размерами:

$1,5 \times 6$  м — грунтовок 0,075 т, количество ездов  $0,075 : 0,1 = 0,75$  — принимаем 1;

$1,5 \times 12$  м — грунтовок 0,068 т, количество ездов  $0,068 : 0,1 = 0,68$  — принимаем 1;

$3 \times 6$  м — грунтовок 0,045 т, количество ездов  $0,045 : 0,1 = 0,45$  — принимаем 1;

$3 \times 12$  м — грунтовок 0,037 т, количество ездов  $0,037 : 0,1 = 0,37$  — принимаем 1.

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при перевозке рубероида для наклейки гидроизоляционного ковра на стыки плит размерами:

$1,5 \times 6$  м — рубероида 1,05 т, количество ездов  $1,05 : 0,2 = 5$ ;

$1,5 \times 12$  м — рубероида 0,95 т, количество ездов  $0,95 : 0,2 = 4,8$  — принимаем 5;

$3 \times 6$  м — рубероида 0,62 т, количество ездов  $0,62 : 0,2 = 3,1$  — принимаем 3;

$3 \times 12$  м — рубероида 0,52 т, количество ездов  $0,52 : 0,2 = 2,6$  — принимаем 3.

Мотороллером ТГ-200 для перевозки мастики в термосах или флягах по четыре штуки за 1 езду для наклейки гидроизоляционного ковра над стыками (массу перевозимой в них мастики принимаем равной 0,1 т) для наклейки гидроизоляционного ковра на стыках плит размерами:

$1,5 \times 6$  м — мастики 2,1 т, количество ездов  $2,1 : 0,1 = 21$ ;

$1,5 \times 12$  м — мастики 1,9 т, количество ездов  $1,9 : 0,1 = 19$ ;

$3 \times 6$  м — мастики 1,2 т, количество ездов  $1,2 : 0,1 = 12$ ;

$3 \times 12$  м — мастики 1 т, количество ездов  $1 : 0,1 = 10$ .

## РАСЧЕТ № 20

Нормы времени и расценки на устройство четырехслойного гидроизоляционного рулонного ковра с нанесением холодной мастики БЛК удочкой-распылителем, раскатыванием рулонов катком-раскатчиком и наклейкой полотнищ вручную.

Измеритель — 100 м<sup>2</sup> в четыре слоя.

Производительность удочки-распылителя при наклейке в четыре слоя — 300 м<sup>2</sup> в смену.

Состав бригады: изолировщик 4 разряда — 2; изолировщик 3 разряда — 2; изолировщик 2 разряда — 2.

Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

Норма времени  $\frac{8,2 \times 6}{3} = 16,4$  чел.-ч.

Средняя часовая ставка звена

$(62,5 \times 2) + (55,5 \times 2) + (49,3 \times 2) : 6 = 55,8$  коп.

Расценка на 100 м<sup>2</sup>

$55,8 \times 16,4 = 9$  руб. 15 коп.

## РАСЧЕТ № 21

Нормы времени и расценки на очистку поверхности основания от мусора и пыли при помощи воздушной струи.

Производительность агрегата — 300 м<sup>2</sup>.  
Измеритель — 1000 м<sup>2</sup> очищенной поверхности.  
Выполняет работу подсобный рабочий 3 разряда.  
Норма времени на измеритель  
 $1000 : 300 = 3,34$  чел-ч.  
Расценка рабочего 3 разряда составит  
 $55,5 \times 3,34 = 1$  руб. 85,4 коп.

#### РАСЧЕТ № 22

Нормы времени и расценки на устройство трехслойного ковра из холодной мастики ЭГИК с рубленным стекловолокном, наносимой пистолетом-распылителем.

Измеритель — 100 м<sup>2</sup> покрытия в три слоя.

Производительность пистолета-распылителя 1400 м<sup>2</sup> в смену.

Состав звена: изолировщики 4 разряда — 2; изолировщики 3 разряда — 2; изолировщики 2 разряда — 2.

Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

Норма времени  $\frac{8,2 \times 6}{14} \times 3 = 10,54$  чел-ч.

Средняя часовая ставка звена  
 $(62,5 \times 2) + (55,5 \times 2) + (49,3 \times 2) : 6 = 55,8$  коп.

Расценка на 100 м<sup>2</sup>  
 $55,8 \times 10,54 = 5$  руб. 88,1 коп.

#### РАСЧЕТ № 23

Нормы времени и расценки на устройство трехслойного ковра из холодной мастики ЭГИК с рубленным стекловолокном, наносимой на поверхность плит покрытия пистолетом-распылителем.

Измеритель — 100 м<sup>2</sup> в три слоя.

Производительность пистолета-распылителя — 2800 м<sup>2</sup>/см в однослойном исчислении.

Состав бригады: изолировщики 4 разряда — 2; изолировщики 3 разряда — 2; изолировщики 2 разряда — 2.

Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

Нормы времени  $\frac{8,2 \times 6}{28} \times 3 = 5,27$  чел-ч.

Средняя часовая ставка звена  
 $(62,5 \times 2) + (55,5 \times 2) + (49,3 \times 2) : 6 = 55,8$  коп.

Расценка на 100 м<sup>2</sup>  
 $55,8 \times 5,27 = 2$  руб. 94 коп.

#### РАСЧЕТ № 24

Нормы времени и расценки на устройство двухслойного ковра из холодной мастики ЭГИК с рубленным стекловолокном, наносимой на поверхность плит покрытия.

Измеритель — 100 м<sup>2</sup> в два слоя.

Производительность пистолета-распылителя — 2800 м<sup>2</sup>/см в однослойном исчислении.

Состав звена: изолировщики 4 разряда — 2; изолировщики 3 разряда — 2; изолировщики 2 разряда — 2.

Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

Норма времени  $\frac{8,2 \times 6}{28} \times 2 = 3,51$  чел-ч.

Средняя часовая ставка звена  
 $(62,5 \times 2) + (55,5 \times 2) + (49,3 \times 2) : 6 = 55,8$  коп.

Расценка на 100 м<sup>2</sup>  
 $55,8 \times 3,51 = 1$  руб. 95,9 коп.

#### РАСЧЕТ № 25

Нормы времени и расценки на покрытие парапетов, обделку мест примыканий к стенам и температурного шва кровельной сталью вручную.

Измеритель — 1000 м<sup>2</sup> покрытия.

При размере секции здания 72×144 м:

суммарная длина парапетов по периметру  $72 \times 2 + 144 \times 2 = 432$  м;

длина температурного шва 72 м.

Объемы работ на измеритель:

длина парапетов  $\frac{432}{73 \times 144} \times 1000 = 41,7$  м;

длина температурного шва  $\frac{72 \times 1000}{72 \times 144} = 7$  м.

Покрытие парапета и обделка мест примыкания к стене: по ЕНиР, 1969, § 7—8, п. 6а на покрытие 1 м парапета норма времени 0,32 чел-ч, расценка 17,7 коп.; по ЕНиР, 1969, § 7—8, п. 10а на обделку 1 м боковых примыканий норма времени 0,105 чел-ч, расценка 5,8 коп.; на измеритель норма времени  $(0,32 + 0,105) \times 41,7 = 17,72$  чел-ч, расценка  $(17,7 + 5,8) \times 41,7 = 9$  руб. 80 коп.

Работу выполняет кровельщик 3 разряда.

Обделка температурного шва — устройство обрамлений из угловой стали сечением 50×50×5 мм, установка нижнего и верхнего щитов из оцинкованной стали с приваркой к обрамлению.

На установку 1 т металлоконструкций с креплением к железобетонным конструкциям по ЕНиР, 1969, § 5—1—10, п. 3:

норма времени  $34 \times 1,25 = 42,5$  чел-ч;

расценка  $20 - 06 \times 1,25 = 25$  руб. 08 коп.

Масса обрамляющих уголков (при длине температурного шва 7 м) на 1000 м<sup>2</sup> покрытия

$7 \times 4,8 = 33,6$  кг = 0,034 т.

По ЕНиР, 1969, § 5—1—10, п. 3 (с коэффициентом 1,25):

норма времени  $42,5 \times 0,034 = 1,45$  чел-ч;

расценка  $25 - 08 \times 0,034 = 85$  коп.

Установка нижнего щита с приваркой к уголкам по ЕНиР, 1969, § 22—1, № 1а:

на 10 м норма времени 2,2 чел-ч, расценка 93,5 коп.;

на измеритель норма времени  $2,2 \times 0,1 \times 7 \times 2 = 3,08$  чел-ч,

расценка  $93,5 \times 0,1 \times 7 \times 2 = 1$  руб. 31 коп.

На изготовление щита по ЕНиР, 1969, § 7—14, № 1в:

норма времени  $0,14 \times 7 = 0,98$  чел-ч;

расценка  $7,8 \times 7 = 54,6$  коп.

Установка верхнего щита из оцинкованной стали по ЕНиР, 1969, № 7—8, № 6а:

норма времени  $0,32 \times 7 = 2,24$  чел-ч;

расценка  $17,7 \times 7 = 1$  руб. 24 коп.

Для установки обоих щитов в расчете на измеритель:

норма времени  $1,45 + 3,08 + 0,98 + 2,24 = 7,75$  чел-ч;

расценка  $85 + 131 + 54,5 + 124 = 3$  руб. 94,5 коп.

Состав звена: кровельщик 3 разряда — 1; кровельщик 2 разряда — 1.

Покрытие парапета и обделка мест примыканий к стенам для кровель с уклоном более 2,5%:

норма времени 17,72 чел-ч;

расценка 9 руб. 80 коп.

Объем работ по обделке мест примыканий к фонарям:

для здания размерами 72×144 м  $(60 \times 2 + 6 \times 2) \times 6 = 792$  м, на измеритель  $792 : 10,3 = 76,8$  м.

Устройство покрытия парапетов и обделка мест примыканий кровли с уклоном более 2,5%:

норма времени  $17,72 + (0,105 \times 76,8) = 25,78$  чел-ч;

расценка  $980 + (5,8 \times 76,8) = 14$  руб. 25 коп.

#### РАСЧЕТ № 26

Нормы времени и расценки на окраску поверхности рулонной кровли горячей мастикой в один слой с нанесением мастики удочкой-распылителем.

Производительность удочки-распылителя 1200 м<sup>2</sup>/смену в однослойном исчислении.

Работу выполняет изолировщик 4 разряда.

Измеритель 1000 м<sup>2</sup> слоя.

Норма времени на измеритель  $(8,2 \times 1) : 1,2 = 6,83$  чел-ч.

Средняя часовая ставка 62,5 коп.

Расценка на измеритель  $62,5 \times 6,83 = 4$  руб. 26,8 коп.

#### РАСЧЕТ № 27

Нормы времени и расценки на устройство трехслойного гидроизоляционного рулонного ковра на горячей битумной мастике, наносимой на поверхность основания удочкой-распылителем с раскатыванием рулонов ручным приспособлением.

Измеритель 100 м<sup>2</sup> покрытия в три слоя.

Производительность удочки-распылителя 400 м<sup>2</sup>/см в трехслойном исчислении.

Состав звена: изолировщик 4 разряда — 2; изолировщик 3 разряда — 1.

На 100 м<sup>2</sup> покрытия в три слоя:

норма времени  $(8,2 \times 3) : 4 = 6,15$  чел-ч.

Средняя часовая ставка звена

$(62,5 \times 2 + 55,5) : 3 = 60,2$  коп.

Расценка на 100 м<sup>2</sup> покрытия в три слоя  $60,2 \times 6,15 = 3$  руб. 70,2 коп.

При устройстве ковра в два слоя норма времени на 100 м<sup>2</sup> покрытия  $(8,2 \times 2) : 4 = 4,1$ , расценка  $60,2 \times 4,1 = 2$  руб. 46,8 коп.

*Расчетно-техническая норма на перемещение вручную битумораспылителя по покрытию*

Работу выполняет транспортный подсобный рабочий 1 разряда.

Принимаем скорость перемещения битумораспылителя по покрытию 3 км/ч.

Время, необходимое на перемещение груза (емкость бачка-заправщика 120 л) на 1 км

$$1 \text{ км} : 3 \text{ км/ч} = 0,33 \text{ ч.}$$

Затраты времени на перемещение 1 т/км

$$(1 : 0,12) \times 0,33 \times 2 = 5,5 \text{ ч.}$$

где цифра 2 — грузовой и обратный рейсы порожняком.

Затраты труда на 1 т/км

$$5,5 \times 1 = 5,5 \text{ чел.-ч.}$$

Часовая ставка транспортного (подсобного) рабочего 1 разряда = 43,8 коп.

Расценка  $5,5 \times 43,8 = 2$  руб. 41 коп.

*Расчетно-техническая норма на загрузку бачка-заправщика мастикой и выгрузку выливанием*

Работу выполняет транспортный подсобный рабочий 1 разряда.

Время загрузки бачка-заправщика емкостью 120 л горячей битумной мастикой и выгрузки принято по 2,5 мин.

Для загрузки и выгрузки 1 т мастики требуется

$$\frac{1000 \times 2,5}{120 \times 60} \times 2 = 0,7 \text{ ч.}$$

Затраты труда  $0,7 \times 1 = 0,7$  чел.-ч.

Часовая ставка транспортного подсобного рабочего 1 разряда 43,8 коп.

Расценка  $0,7 \times 43,8 = 30,6$  коп.

**РАСЧЕТ № 28**

Нормы времени и расценки на устройство четырехслойного гидроизоляционного рулонного ковра на холодной мастике БЛК при помощи машины конструкции треста Мосоргстрой.

Измеритель 100 м<sup>2</sup> покрытия в четыре слоя.

Производительность машины конструкции треста Мосоргстрой 300 м<sup>2</sup>/см в четырехслойном исчислении.

Состав звена: изолировщики 4 разряда — 2; изолировщик 3 разряда — 1.

Норма времени на 100 м<sup>2</sup> покрытия в четыре слоя

$$(8,2 \times 3) : 3 = 8,2 \text{ чел.-ч.}$$

Средняя часовая ставка звена

$$(62,5 \times 2 + 55,5) : 3 = 60,2 \text{ коп.}$$

Расценка на 100 м<sup>2</sup> покрытия в четыре слоя

$$60,2 \times 8,2 = 4 \text{ руб. 93,6 коп.}$$

*Расчетно-техническая норма на перемещение битумораспылителя по покрытию*

Работу выполняет машинист 3 разряда.

Принимаем скорость перемещения битумораспылителя по покрытию 5 км/ч.

Время, необходимое на перемещение груза (емкость бачка-заправщика 120 л) на 1 км

$$1 \text{ км} : 5 \text{ км/ч} = 0,2 \text{ ч.}$$

Затраты времени на перемещение 1 т/км

$$(1 : 0,12) \times 0,2 \times 2 = 3,33 \text{ ч.}$$

где цифра 2 — грузовой рейс и обратный порожняком.

Затраты труда

$$3,33 \times 1 = 3,33 \text{ чел.-ч.}$$

Расценка за 1 т/км

$$3,33 \times 55,5 = 1 \text{ руб. 84,8 коп.}$$

*Расчетно-техническая норма на загрузку мастики в бак битумораспылителя заливкой и разгрузку соплованием*

Работу выполняет машинист 3 разряда.

Время загрузки бака битумораспылителя емкостью 120 л горячей битумной мастикой принято 2,5 мин.

Для загрузки 1 т мастики требуется

$$\frac{1000 \times 2,5}{120 \times 60} = 0,35 \text{ ч.}$$

Затраты времени на выгрузку (соплование) 1 т мастики определяют, исходя из производительности сопла при наклеи-

ке одного слоя рулонного ковра 1200 м<sup>2</sup>/см и, согласно СНиП. ч. 4, расхода мастики 2,6 т, то есть  $8,2 : 1,2 \times 2,6 = 2,63$  ч.

Итого затраты времени на загрузку и выгрузку 1 т мастики

$$0,35 + 2,63 = 2,98 \text{ ч.}$$

Затраты труда  $2,98 \times 1 = 2,98$  чел.-ч.

Расценка  $2,98 \times 55,5 = 1$  руб. 65,4 коп., в том числе расценка на загрузку бака мастикой  $0,35 \times 55,5 = 19,4$  коп.

и на выгрузку мастики из бака  $2,63 \times 55,5 = 1$  руб. 46 коп

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
РАСЧЕТОВ НОРМ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНОК**

№ рас-чета	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени, чел.-ч	Расценка, руб.-коп.
1	Очистка поверхности основания от мусора и пыли при помощи воздушной пистолетки	1000 м <sup>2</sup>	3,34	1—85,4
2	Устройство рулонной кровли в два слоя с нанесением мастики удочкой-распылителем, раскатыванием рулонов ручным приспособлением и наклейкой гидроизоляционного ковра вручную	1000 м <sup>2</sup>	82,2	47—64
3	Устройство защитного слоя из гравия с помощью машины конструкции ЦНИИОМТП	1000 м <sup>2</sup>	5,86	3—66,2
4	Подача мастики на покрытие насосной установкой конструкции ВНИИстройдормаша или установкой СО-67	1	0,9	0—56,2
5	Наклейка рулонного ковра машиной конструкции ЦНИИОМТП на холодной и горячей мастике в 1 слой	1000 м <sup>2</sup>	10,24	5—72,4
6	Устройство пароизоляции стыков плит размерами			
	1,5×6 м	1000 м <sup>2</sup>	70,81	36—40,2
	1,5×12 м	1000 м <sup>2</sup>	63,75	32—76
	3×6 м	1000 м <sup>2</sup>	42,5	21—85
	3×12 м	1000 м <sup>2</sup>	35,4	18—22
7	Засыпка керамзитовым гравием или смесью легкого бетона с уплотнением стыков плит размерами			
	1,5×6 м	1000 м <sup>2</sup>	33,7	16—64
	1,5×12 м	1000 м <sup>2</sup>	30,4	14—98,5
	3×6 м	1000 м <sup>2</sup>	20,3	9—99
	3×12 м	1000 м <sup>2</sup>	16,89	8—33
8	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 25 мм по засыпке стыков плит размерами			
	1,5×6 м	1000 м <sup>2</sup>	62,48	36—86
	1,5×12 м	1000 м <sup>2</sup>	56,25	34—65,8
	3×6 м	1000 м <sup>2</sup>	37,5	22—12,5
	3×12 м	1000 м <sup>2</sup>	31,27	18—45,3
9	Устройство асфальтовой стяжки толщиной 20 мм по засыпке стыков плит размерами			
	1,5×6 м	1000 м <sup>2</sup>	22	12—97
	1,5×12 м	1000 м <sup>2</sup>	19,8	11—67,8
	3×6 м	1000 м <sup>2</sup>	13,2	7—78,5
	3×12 м	1000 м <sup>2</sup>	11,01	6—49



## Продолжение

№ рас-чета	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени, чел.-ч	Расценка руб.-коп.
10	Огрунтовка холодной битумной грунтовкой пистолетом - распылителем по цементно-песчаной стяжке, устраиваемой по засыпке стыков плит размерами 1,5×6 м 1,5×12 м 3×6 м 3×12 м	1000 м <sup>2</sup> 1000 м <sup>2</sup> 1000 м <sup>2</sup> 1000 м <sup>2</sup>	4,5 4,05 2,7 2,25	2—82,4 2—54,3 1—69,5 1—41,3
11	Наклейка в два слоя полос шириной 0,5 и 0,7 м из рулонных материалов на битумной мастике по стыкам комплексных плит размерами 1,5×6 м 1,5×12 м 3×6 м 3×12 м	1000 м <sup>2</sup> 1000 м <sup>2</sup> 1000 м <sup>2</sup> 1000 м <sup>2</sup>	4,5 4,05 127 105,92	2—82,4 2—54,3 65—30 54—46
12	Наклейка основного рулонного гидроизоляционного ковра в один слой на холодной и горячей битумных мастиках вручную	1000 м <sup>2</sup>	133	73—75
13	Транспортировка гравия по покрытию машинной для развозки гравия от приемно-раздаточного бункера в зону работы	1 ездка	0,066	0—03,6
14	Транспортировка фляг с холодной грунтовкой и мастикой, а также термосов с горячей мастикой мотороллером ТГ-200 по покрытию от крана в зону работы	1 ездка	0,34	0—18,9
15	Транспортировка теплоизоляционных сыпучих материалов, цементно-песчаного раствора и литого асфальта мотороллером ТГ-200 от крана в зону работы	1 ездка	0,051	0—02,8
16	Транспортировка рулонов рубероида мотороллером ТГ-200 по покрытию от крана в зону работы, минеральной ваты и заготовок из кровельной стали	1 ездка	0,28	0—15,5
17	Транспортировка мастики (холодной и горячей) машиной конструкции ЦНИИОМТП от раздаточного крана трубопровода до наклеечной машины с наполнением и опорожнением бака	1 ездка	0,098	0—05,4
18	Транспортировка кирпича мотороллером ТГ-200 от крана к месту работы	1 ездка	0,3	0—16,65
19	Транспортировка строительного мусора мотороллером ТГ-200 по покрытию к лоткам	1 ездка	0,25	13,9
20	Устройство четырехслойной рулонной кровли с нанесением холодной мастики БЛК удочкой-распылителем, раскатыванием рулонного ковра катком-раскатчи-	100 м <sup>2</sup>	16,4	9—15

## Продолжение

№ рас-чета	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени, чел.-ч	Расценка руб.-коп.
21	ком и наклейкой гидроизоляционного ковра вручную Очистка поверхности основания от мусора, пыли при помощи воздушной дувки	1000 м <sup>2</sup>	3,34	1—85,4
22	Устройство трехслойной мастичной кровли с нанесением пистолетом-распылителем на поверхность плит покрытия холодной мастики ЭГИК с рубленым стекловолокном	100 м <sup>2</sup>	10,54	5—88,1
23	Устройство трехслойной мастичной кровли с нанесением пистолетом-распылителем на поверхность плит покрытия холодной мастики ЭГИК с рубленым стекловолокном	100 м <sup>2</sup>	5,27	2—94
24	Устройство двухслойной мастичной кровли с нанесением пистолетом-распылителем на поверхность плит покрытия холодной мастики ЭГИК с рубленым стекловолокном	100 м <sup>2</sup>	3,51	1—95,9
25	Покрытие парапетов и обделка мест примыканий к стенам Обделка температурного шва — устройство обрамлений из угловой стали сечением 50×50×5 мм	1000 м <sup>2</sup> 1000 м <sup>2</sup>	17,72 7,75	9—80 3—94,5
26	Покрытие парапета и мест примыканий к стенам для кровель с уклоном более 2,5%	1000 м <sup>2</sup>	25,78	14—25
27	Окраска поверхности рулонной кровли горячей мастикой в один слой с нанесением мастики при помощи удочки-распылителя Устройство трехслойной (числитель) и двухслойной (знаменатель) рулонной кровли на горячей битумной мастике, наносимой на поверхность основания удочкой-распылителем, раскатывание рулонов вручную	1000 м <sup>2</sup> 100 м <sup>2</sup>	6,83 6,15 4,1	4—26,8 3—70,2 2—46,8
28	Перемещение битумораспылителя по покрытию (вручную) Загрузка мастики в бачок-заправщик и разгрузка выливанием Устройство четырехслойной рулонной кровли на холодной мастике БЛК при помощи машины конструкции треста Мосоргстрой Перемещение битумораспылителя по покрытию Погрузка мастики в бак битумораспылителя заливкой и разгрузка соплованием	1 т/км т 100 м <sup>2</sup> 1 т/км т	5,5 0,7 8,2 3,33 2,98	2—41 0—30,6 4—93,6 1—84,8 1—65,4

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.		Стр.
Пояснительная записка . . . . .	1	мастике БЛК по плитам покрытия промышленных зда-	
Правила техники безопасности . . . . .	2	ний при уклоне кровли до 2,5% (с применением маши-	
Технологическая карта № 1. Заделка стыков типа I, II и III плит покрытия жилых зданий . . . . .	4	ны конструкции ЦНИИОМТП) . . . . .	65
Технологическая карта № 2. Заделка стыков комплексных плит покрытия плоских и скатных кровель . . . . .	11	Технологическая карта № 12. Устройство трехслойного, армированного стеклохолстом гидроизоляционного ковра из горячей битумной мастики по плитам покрытия жилых зданий с уклоном кровли до 2,5% . . . . .	69
Технологическая карта № 3. Устройство мест примыканий гидроизоляционного ковра к выступающим элементам покрытия . . . . .	22	Технологическая карта № 13. Устройство трехслойного, армированного стеклохолстом гидроизоляционного ковра из горячей битумной мастики по плитам покрытия промышленных зданий с уклоном кровли до 2,5% . . . . .	74
Технологическая карта № 4. Подготовка поверхности плит покрытия для наклейки гидроизоляционного ковра . . . . .	32	Технологическая карта № 14. Устройство двухслойного, армированного стеклохолстом гидроизоляционного ковра из горячей битумной мастики по плитам покрытия промышленных зданий с уклоном кровли до 10% . . . . .	80
Технологическая карта № 5. Устройство трехслойного гидроизоляционного рулонного ковра на горячих битумных или дегтевых мастиках по плитам покрытия жилых зданий . . . . .	34	Технологическая карта № 15. Устройство пятислойного, армированного рубленым стекловолокном гидроизоляционного ковра из эмульсии ЭГИК по плитам покрытия жилых зданий (с применением пистолета-распылителя конструкции ЦНИИОМТП) . . . . .	86
Технологическая карта № 6. Устройство с применением машины конструкции ЦНИИОМТП трехслойного гидроизоляционного рулонного ковра на горячей битумной мастике по плитам покрытия промышленных зданий с уклоном кровли до 2,5% . . . . .	41	Технологическая карта № 16. Устройство трехслойного, армированного стеклохолстом гидроизоляционного ковра из битумной мастики на основе эмульсии эмульбит по плитам покрытия жилых зданий . . . . .	91
Технологическая карта № 7. Устройство с применением машины конструкции ЦНИИОМТП двухслойного гидроизоляционного рулонного ковра на горячей битумной мастике по плитам покрытия промышленных зданий с уклоном кровли до 10% . . . . .	46	Технологическая карта № 17. Устройство четырехслойного, армированного стекловолокном гидроизоляционного ковра из эмульсии ЭГИК по плитам покрытия промышленных зданий с уклоном кровли до 2,5% (с применением пистолета-распылителя конструкции ЦНИИОМТП) . . . . .	96
Технологическая карта № 8. Устройство с применением удочки-распылителя двухслойного гидроизоляционного рулонного ковра на горячей битумной мастике по плитам покрытия промышленных зданий с уклоном кровли более 10% . . . . .	51	Технологическая карта № 18. Устройство с помощью машины конструкции ЦНИИОМТП защитного слоя из гравия с применением холодной или горячей битумной мастики на плоских и скатных кровлях с уклоном до 10% . . . . .	100
Технологическая карта № 9. Устройство с применением машины конструкции треста Мосоргстрой четырехслойного гидроизоляционного рулонного ковра на холодной битумной мастике БЛК по плитам покрытия жилых зданий . . . . .	55	Технологическая карта № 19. Окраска поверхности кровельного гидроизоляционного ковра из эмульсии ЭГИК краской БТ-177 . . . . .	104
Технологическая карта № 10. Устройство четырехслойного рулонного гидроизоляционного ковра на холодной мастике БЛК по плитам покрытия жилых зданий серии И-49 (с применением катка-раскатчика конструкции треста Оргтехстрой Минпромстроя БССР) . . . . .	60	Приложение. Расчеты на отдельные виды работ по устройству гидроизоляционных рулонных и мастичных кровельных ковров . . . . .	106
Технологическая карта № 11. Устройство трехслойного рулонного гидроизоляционного ковра на холодной		Сводная ведомость расчетов норм времени и расценок	111

Николай Николаевич ЗАВРАЖИН, Владимир Борисович БЕЛЕВИЧ,  
Алла Николаевна ОСЕПЯН, Антонина Владимировна ЧУЕВА

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПЛИТАМ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Научный редактор инж. Р. С. Кодабашева  
Редактор Е. Б. Шнейдер  
Технический редактор К. И. Павлова  
Корректор Е. А. Шамшинович

Бюро внедрения  
Центрального научно-исследовательского  
и проектно-экспериментального института организации,  
механизации и технической помощи строительству  
Госстроя СССР

Выпуск № 2304/1д

Адрес Бюро внедрения: 103012, Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8.  
Тел.: 228-89-24

Сдано в набор 23/VII 1973 г. Подписано к печати 19/XI 1973 г. Т-17183.  
Бумага типографская № 3 Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>8</sub>; 7,0 бум. л. 14,0 печ. л.  
(уч.-изд. 14,95 л.) Тираж 6000 экз. Изд. № XX-4372/15 Зак. № 3348. Цена 1 руб. 20 коп.

Московская типография № 8 «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете  
Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,  
Хохловский пер., 7.
