

4-24

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Главное производственно-техническое управление по строительству
Всесоюзный институт по проектированию организации
энергетического строительства
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕМА № 5628 ПЛАН ЦО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПС

35-II50 кВ

ВЛ 500 кВ (все виды работ)

РАЗДЕЛ 10

ВЛ-Т-(К-I-37)

(СБОРНИК)

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ СБОРНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭМ-20


ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ



Г. Н. ЗЕЛЕНБОГЕН



В. А. ПОЛУБНОВ



В. Н. КОГАН

1985

24397 16.06.86

Сборник К-I-37 состоит из двадцати технологических карт на сооружение сборных фундаментов в необходимых грунтах средней плотности под металлические опоры ВЛ 500 кВ следующих типов :

промежуточные - на оттяжках (ПБ)

и свободностоящие (Р),

промежуточные-угловые на оттяжках (ПУБ)

анкерно-угловые - свободностоящие (У)

и на оттяжках (УБМ)

Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи и являются пособием при проектировании производства работ.

С выходом настоящего сборника аннулируются типовые технологические карты К-I-I6 - I + К-I-I6-IO, К-I-I8-4, К-I-I8-5.

Подпись и дата (виза инв. №)

24391

ВЛ-Т(К-I-37)

Нач. отд.	Полубков	22.10.81
Н. контр.	Зубрицкий	22.10.81
Гл. спец.	К. Ган	22.10.81
Ст. инж.	Кудинов	22.10.81
Разраб.	Ковальчук	22.10.81

Технологические карты
Сооружение фундаментов из
сборных железобетонных эле-
ментов под металлические
опоры.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	184
Всероссийский институт "Оргэнергострой" Отдел ЭМ-20		

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Сооружение фундаментов из сборных железобетонных
элементов под металлические опоры

Общая часть 6

Технологическая карта К-1-37-1

Разбивка котлованов для фундаментов опор
на оттяжках ПБ 1, ПБ 2, ПБ 3, ПБ 4, ПБ 5,

ПУБ-2, ПУБ-5. 20

Технологическая карта К-1-37-2

Разработка котлованов для фундаментов опор
на оттяжках ПБ 1, ПБ 2, ПБ 3, ПБ 4, ПБ 5, ПУБ-2,

ПУБ-5 30

Технологическая карта К-1-37-3

Установка фундаментов под опоры на оттяжках

ПБ 1, ПБ 2, ПБ 3, ПБ 4, ПБ 5, ПУБ-2, ПУБ-5 38

Технологическая карта К-1-37-4

Засыпка котлованов с фундаментами опор
на оттяжках ПБ 1, ПБ 2, ПБ 3, ПБ 4, ПБ 5,

ПУБ-2, ПУБ-5 48

Технологическая карта К-1-37-5

Разбивка котлованов для фундаментов

опоры на оттяжках ПУБ-20, 57

Технологическая карта К-1-37-6

Разработка котлованов для фундаментов

опоры на оттяжках ПУБ-20 64

Технологическая карта К-1-37-7

Установка фундаментов под опору на

оттяжках ПУБ-20 71

В1-Т(К-1-37)

Лист

3

Формат 11

Копировать

Шифр подл. 24391
Подпись и дата

Технологическая карта К-И-37-8

Засыпка котлованов с фундаментами

опоры на оттяжках ПУБ 20 79

Технологическая карта К-И-37-9

Разбивка котлованов для фундаментов

промежуточных свободностоящих опор

Р1, Р2, Р1+5, Р2+5, Р1+10, Р2+10. 89

Технологическая карта К-И-37-10

Разработка котлованов для фундаментов

промежуточных свободностоящих опор

Р1, Р2, Р1+5, Р2+5, Р1+10, Р2+10 97

Технологическая карта К-И-37-11

Установка фундаментов под промежуточные

свободностоящие опоры Р1, Р2, Р1+5, Р2+5,

Р1+10, Р2+10 104

Технологическая карта К-И-37-12

Засыпка котлованов с фундаментами

промежуточных свободностоящих опор

Р1, Р2, Р1+5, Р2+5, Р1+10, Р2+10 112

Технологическая карта К-И-37-13

Разбивка котлованов для фундаментов

анкерно-угловых опор У1, У2, У1+5, У2+5,

У1+12, У2+12 121

Технологическая карта К-И-37-14

Разработка котлованов для фундаментов

анкерно-угловых опор У1, У2, У1+5, У2+5,

У1+12, У2+12 129

Шифр № подл. 24391
Подпись и дата

ВН-Т(К-И-37)

Лист

4

Технологическая карта К-I-37-15

Установка фундаментов под анкерно-угловые

опоры У1,У2,У1+5,У2+5,У1+12,У2+12 I37

Технологическая карта К-I-37-16

Засыпка котлованов с фундаментами

анкерно-угловых опор У1,У2,У1+5,У2+5,

У1+12,У2+12 I45

Технологическая карта К-I-37-17

Разбивка котлованов для фундаментов

опор на оттяжках УБМ-I7,УБМ-22 I55

Технологическая карта К-I-37-18

Разработка котлованов для фундаментов

опор на оттяжках УБМ-I7,УБМ-22 I62

Технологическая карта К-I-37-19

Установка фундаментов под опоры

на оттяжках УБМ-I7, УБМ-22 I69

Технологическая карта К-I-37-20

Засыпка котлованов с фундаментами опор

на оттяжках УБМ-I7,УБМ-22 I75

Изм. № 001
24391

Подпись и дата

Изм. № 001

ВМ-Т(К-I-37)

Лист

5

Технологические карты	ВЛ 500 кВ
Сооружение фундаментов из сборных железобетонных элементов под металлические опоры	К-І-37
Общая часть	

І. В настоящий сборник включены технологические карты, охватывающие комплекс работ нулевого цикла.

Расположение карт в сборнике указано в таблице

Тип опор	Вид работ			
	Разбивка котлованов	Разработка котлованов	Установка фундаментов	Обратная засыпка котлованов
ПБ І, ПБ 2				
ВБ 3, ПБ 4	<u>К-І-37-І</u>	<u>К-І-37-2</u>	<u>К-І-37-3</u>	<u>К-І-37-4</u>
ПБ 5, ПУБ-2	стр.20	стр.30	стр.38	стр.48
ПУБ-5				
ПУБ-20	<u>К-І-37-5</u>	<u>К-І-37-6</u>	<u>К-І-37-7</u>	<u>К-І-37-8</u>
	стр.57	стр.64	стр.71	стр.79
РІ, Р2, РІ+5	<u>К-І-37-9</u>	<u>К-І-37-І0</u>	<u>К-І-37-ІІ</u>	<u>К-І-37-І2</u>
Р2+5, РІ+І0	стр.89	стр.97	стр.І04	стр.ІІ2
Р2+І0				
УІ, У2, УІ+5	<u>К-І-37-І3</u>	<u>К-І-37-І4</u>	<u>К-І-37-І5</u>	<u>К-І-37-І6.</u>
У2+5, УІ+І2	стр.І2І	стр.І29	стр.І37	стр.І45
У2+І2				
УБМ-І7, УБМ-22	<u>К-І-37-І7</u>	<u>К-І-37-І8</u>	<u>К-І-37-І9</u>	<u>К-І-37-20</u>
	стр.І55	стр.І62	стр.І68	стр.І75

ВЛ-Т(К-І-37)

Стр.

6

2. Схемы фундаментов и конструкции унифицированных железобетонных элементов приняты по чертежам института "Энергосетьпроект" и приведены на рис. 0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6.

3. Картами предусмотрено сооружение фундаментов при поточном строительстве ВЛ специализированными звеньями комплексной бригады. Количество звеньев определяется в зависимости от сроков строительства на основании показателей, приведенных в сводной ведомости трудозатрат.

4. Техничко-экономические показатели составлены для грунтов I и II групп по трудности разработки, исходя из односменной работы (продолжительность смены 8,2 часа) на равнинной местности в летний период.

При подсчете объемов земляных работ условно приняты откосы котлованов - I:I - в грунтах I группы и I:0,5 - в грунтах II группы.

Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки принимается в соответствии с характеристиками, приведенными в сборнике 2 ЕНиР выпуск I.

5. Для составления калькуляций трудозатрат использован ЕНиР 2 выпуск I. Механизированные и ручные работы. Стройиздат. г. Москва. 1980 г. и ЕНиР 23 выпуск 3. Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше (I редакция). Энергостройтруд. Москва. 1983 г.

6. При привязке технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить отдельные технологические операции, объемы работ, калькуляции трудозатрат и расход эксплуатационных материалов в соответствии с рабочими чертежами фундаментов, рельефными и грунтовыми условиями местности.

7. При строительстве ВЛ в условиях, отличающихся от предусмотренных технологическими картами, к затратам труда и механизмов следует применять следующие поправочные коэффициенты:

ВЛ-Т(К-1-37)

Стр.

7

8

Вид работ	Особые условия	Поправочный коэффициент
Разбивка котлованов	в мерзлых грунтах	I,15
	в горной местности	I,2
Разработка котлованов	при глубине промерзания, м, до 0,5	I,3
	0,75	I,4
	1,0	I,5
	1,5	I,6
	2,0	I,7
	2,5	I,8
Установка фундаментов	в мерзлых и скальных грунтах	I,3
	в сыпучих грунтах	I,5
	в лесной местности	I,2
	с большим количеством пней (более 400 на I га)	
Разработка котлованов, установка фундаментов, обратная засыпка.	Зимние условия для температурной зоны (согласно классификации, приведенной в общей части ЕНиР)	
	I (январь-февраль)	I,05
	II (декабрь-март)	I,07
	III (ноябрь-март)	I,1
	IV (ноябрь-март)	I,12
	V (ноябрь-март)	I,14
	VI (октябрь-апрель)	I,18

ВД-Т(К-I-37)

Лист

8

8. Работы по сооружению фундаментов в зоне расположения подземных коммуникаций (трубопровод, кабель и т.п.) должны производиться на согласование с организацией, в ведении которой находятся эти коммуникации.

9. При сооружении фундаментов в зимних условиях необходимо соблюдать следующие требования :

9.1. Разработку мерзлого грунта экскаватором без предварительного рыхления производить при толщине мерзлого слоя не более 0,25м.

9.2. Не допускать установки подножников на мерзлый льдонасыщенный грунт.

9.3. Предохранять от промерзания грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки котлованов.

10. Перед началом работ кулавого цикла должны быть выполнены следующие работы, не учитываемые данными картами :

10.1. Устроены подеззды к пикетам для транспортных средств и монтажных механизмов ;

10.2. Расчищена площадка от деревьев, кустарника и других предметов, мешающих производству работ ;

10.3. Завезен полный комплект элементов сборных фундаментов и проверено их качество согласно требованиям СНиП II-33-76.

II. Разрыв во времени между разработкой котлованов и установкой в них фундаментов, во избежание обрушения стенок котлована , не должен превышать 2-суток в глинистых грунтах. В песчаных грунтах установка фундаментов должна производиться, как правило, немедленно вслед за отрывкой котлованов.

12. При производстве работ должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

12.1. СНиП II-4-80. "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве."

Взам. инв. №
Лист
Инв. № подл.
Подпись и дата
24394

СССР. Государственные стандарты. Система стандартов безопасности труда.

„Правила техники безопасности при производстве электро-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР.“ Москва 1984 г.

„Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.“ Госгортехнадзор. СССР. 1976 г.

13. При производстве работ следует выполнять требования по технике безопасности, изложенные в настоящих технологических картах. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

13.1. Наибольшую крутизну откосов котлованов глубиной 2,5-3 м, устраиваемых без креплений в грунтах естественной влажности, рекомендуется принимать

для песков 1:1 ; для глины 1:0,25 ;

для супесей 1:0,67 ;

для суглинков 1:0,5 ;

Под крутизной откоса понимается отношение его высоты к горизонтальному заложению (1:K).

13.2. Грунт, вынутый из котлована, следует разбрасывать не ближе 0,5 м от бровки выемки.

13.3. Для спуска людей в котлован необходимо применять инвентарные лестницы.

13.4. Расстояние от основания откоса до ближайших опор крана при установке железобетонных элементов ^{и обратном засыпке} должен приниматься не менее значений, указанных в таблице

Глубина, котлована, м	Расстояния от основания откоса до опор крана, м, при грунте :			
	песчаном	супесчаном	суглинистым	глинистым
2,5	3,5	3,0	2,6	1,6
3,0	4,0	3,6	3,25	1,75

ВЛ-Т(К-1-37)

Лист
10

Шифр докум. 24391
Взам. инв. №
Подпись и дата

Сводная ведомость технико-экономических показателей на сооружение
фундаментов под промежуточные опоры на оттяжках

Наименование работ	Состав звена, чел.	Механизмы	Трудозатраты, чел.-дн. Продолжительность, см.				
			Тип опоры				
			ПБ1	ПБ2	ПБ3	ПБ4	ПБ5
			Вариант установки фундаментов				
			I	II	III	IV	V
Разработка котлованов	Электролинейщик - 3		0,43	0,43	0,43	0,43	
			0,14	0,14	0,14	0,14	
Разработка котлованов	Электролинейщик Машинист - 1 - 1	экскаватор ЭО-3322А	1,4	0,9	1,7	1,2	
			0,7	0,45	0,9	0,6	
Установка фундаментов	Электролинейщик Машинист - 4 - 1	кран КС-4561А	2,2	2,1	3,2	2,4	
			0,44	0,4	0,64	0,5	
Обратная засыпка	Электролинейщик Машинист - 8 - 2	кран КС-4561А бульдозер Д-686	2,4	1,2	2,7	1,5	
			0,24	0,12	0,27	0,15	
ИТОГО			6,43	4,63	8,03	5,53	
			1,54	1,11	1,95	1,39	

Показатели производительности уточняются при составлении календарного графика с учетом совмещения операций.

Сводная ведомость технико-экономических показателей на
сооружение фундаментов под промежуточные угловые и
анкерно-угловые опоры на оттяжках

Наименование работ	Состав звена, чел.	Механизмы	Трудозатраты, чел.-дн.							
			Продолжительность, см.							
			Тип опоры							
			Продолжительность, см.							
			ПУБ-2, ПУБ-5		ПУБ-20		УБМ-17		УБМ-22	
			Вариант установки фундаментов		Вариант установки фундаментов		Вариант установки фундаментов		Вариант установки фундаментов	
			I	II	I	II	I	II	I	II
Разбивка котлованов	Электролинейщик - 3		0,54	0,54	0,85	0,85	1,5	1,5	1,5	1,5
			0,18	0,18	0,28	0,28	0,49	0,49	0,49	0,49
Разработка котлованов	Электролинейщик - I	экскаватор	1,6	1,1	3,1	2,1	5,9	3,3	6,0	3,4
	Машинист - I	ЭО-3322А	0,8	0,55	1,6	1,1	3,0	1,7	3,0	1,7
Установка фундаментов	Электролинейщик - 4	кран КС-456П								
	Машинист - I		3,3	2,5	5,4	4,2	6,2	5,2	6,4	5,4
			0,7	0,5	1,1	1,8	1,2	1,0	1,3	1,1
Обратная засыпка	Электролинейщик - 8	кран КС-456П								
	Машинист - 2	бульдозер ДЗ-400	2,6	1,4	4,9	2,6	10,0	4,5	10,0	4,5
			0,26	0,14	0,5	0,28	1,0	0,45	1,0	0,45
ИТОГО			8,04	5,54	14,25	9,75	23,6	14,5	23,9	14,8
			1,94	1,37	3,48	3,46	5,69	3,64	5,79	3,74

12

Показатели продолжительности уточняются при составлении календарного графика с учетом совмещения операций.

№ п. п. работ
24391
Итого и дата
выполн. н.

Сводная ведомость технико-экономических показателей на сооружение фундаментов
под промежуточные и анкерно-угловые свободстоящие опоры

			Трудозатраты, чел.-дн.											
			Продолжительность, см.											
Наименование	Состав звена, чел.	Механизмы	Тип опоры											
			PI, P2		II+5, P2+5		PI+10, P2+10		VI, V2		VI+5, V2+5		VI+12, V2+12	
			Вариант установки фундаментов											
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Разбивка котлованов	Электролинейщик - 3	-	<u>0,44</u> 0,15	<u>0,44</u> 0,15	<u>0,44</u> 0,15	<u>0,44</u> 0,15	<u>0,44</u> 0,15	<u>0,44</u> 0,15	<u>1,0</u> 0,33	<u>1,0</u> 0,33	<u>1,0</u> 0,33	<u>1,0</u> 0,33	<u>1,0</u> 0,33	<u>1,0</u> 0,33
Разработка котлованов	Машинист - 2	экскаватор ЭО-3322А бульдозер ДЗ-240А	<u>2,5</u> 1,25	<u>1,1</u> 0,5	<u>2,6</u> 1,3	<u>1,1</u> 0,5	<u>2,8</u> 1,4	<u>1,1</u> 0,5	<u>16,2</u> 8,1	<u>5,5</u> 2,8	<u>17,6</u> 8,8	<u>5,5</u> 2,8	<u>19,8</u> 9,9	<u>5,5</u> 2,8
Установка фундаментов	Электролинейщик - 4	кран КС-4561А	<u>5,9</u> 1,2	<u>4,4</u> 0,9	<u>5,9</u> 1,2	<u>4,4</u> 0,9	<u>5,9</u> 1,2	<u>4,4</u> 0,9	<u>23,0</u> 4,6	<u>15,4</u> 3,1	<u>23,0</u> 4,6	<u>15,4</u> 3,1	<u>23,0</u> 4,6	<u>15,4</u> 3,1
Обратная засыпка	Электролинейщик - 8	кран КС-4561А	<u>3,9</u> 0,4	<u>1,4</u> 0,15	<u>4,2</u> 0,45	<u>1,4</u> 0,15	<u>4,4</u> 0,45	<u>1,4</u> 0,15	<u>10,4</u> 2,6	<u>7,5</u> 0,75	<u>11,2</u> 2,8	<u>7,5</u> 0,75	<u>12,8</u> 3,2	<u>7,5</u> 0,75
	Машинист - 2	бульдозер ДЗ-240А	<u>3,9</u> 0,4	<u>1,4</u> 0,15	<u>4,2</u> 0,45	<u>1,4</u> 0,15	<u>4,4</u> 0,45	<u>1,4</u> 0,15	<u>10,4</u> 2,6	<u>7,5</u> 0,75	<u>11,2</u> 2,8	<u>7,5</u> 0,75	<u>12,8</u> 3,2	<u>7,5</u> 0,75
ИТОГО			<u>12,74</u> 3,0	<u>7,34</u> 1,7	<u>13,14</u> 3,1	<u>7,34</u> 1,7	<u>13,54</u> 3,2	<u>7,34</u> 1,7	<u>50,6</u> 15,63	<u>29,4</u> 6,98	<u>52,8</u> 16,53	<u>29,4</u> 6,98	<u>56,6</u> 18,03	<u>29,4</u> 6,98

Показатели продолжительности уточняются при составлении календарного графика с учетом совмещения операций.

Установочные размеры фундаментов, мм

Тип опоры	А	В*	С	Д*	Н
пб 1	17400	18200	17850	20000	2500
пб 2	17400	18200	17850	20000	2500
пб 3	18400	18200	18850	20000	2500
пб 4	18400	18200	18850	20000	2500
пб 5	18400	18200	18850	20000	2500
пб 5-2	20800	18300	21250	21200	2500


* Уточняется по проекту ВЛ

Состав фундаментов

Тип опоры	Вариант установки	Наименование элемента	Марка	Размер, м	Масса, т	Кол.
пб 1 пб 2	I	подножник	Ф4-0,5	2,0×2,0×2,7	3,3	2
		анкерная плита	ПА2-1	2,0×1,5×0,6	1,6	2
	II	подножник	Ф3-0,5	1,8×1,8×2,7	2,9	2
		анкерная плита	ПА2-1	2,0×1,5×0,6	1,6	2
пб 3 пб 4 пб 5	I	подножник	Ф4-0,5	2,0×2,0×2,7	3,3	2
		анкерная плита	ПА2-2	3,0×1,5×0,6	2,2	2
	II	распределительная плита	РП-1	2,4×2,4×0,2	2,9	2
		подножник	Ф4-0,5	2,0×2,0×2,7	3,3	2
пб 5-2	I	анкерная плита	ПА2-2	3,0×1,5×0,6	2,2	2
		подножник	Ф4-0,5	2,0×2,0×2,7	3,3	2
	II	анкерная плита	ПА3-1	3,0×2,0×0,6	2,8	2
		распределительная плита	РП-1	2,4×2,4×0,2	2,9	2

I вариант установки фундаментов соответствует I группе грунта; II вариант установки - II группе грунта.

Рис. 0-1. Схема фундаментов под промежуточные опоры пб1, пб2, пб3, пб4, пб5 и под промежуточно-угловые опоры пб5-2

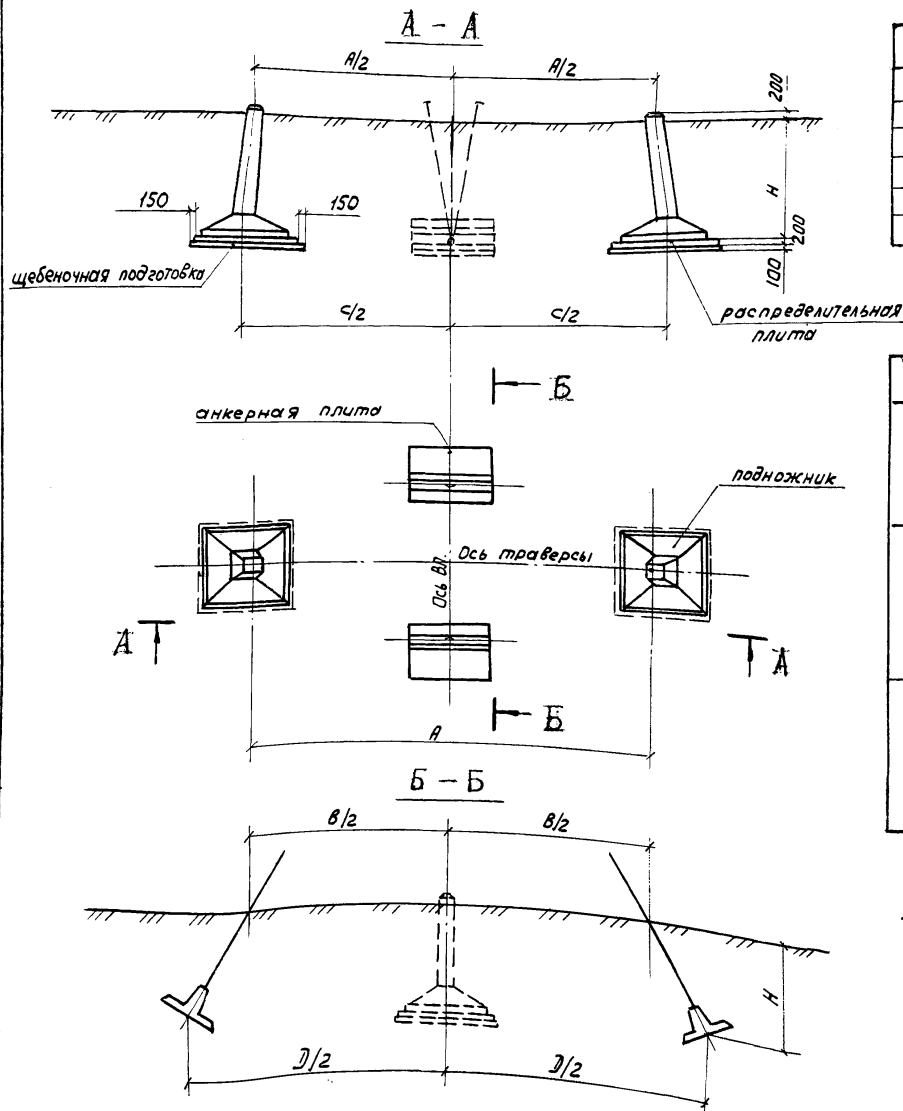


Шифр проекта
2.43.91
Подпись и дата
Взят инв. №

ВЛ-Т (К-1-37)

Формат А3

Лист
14

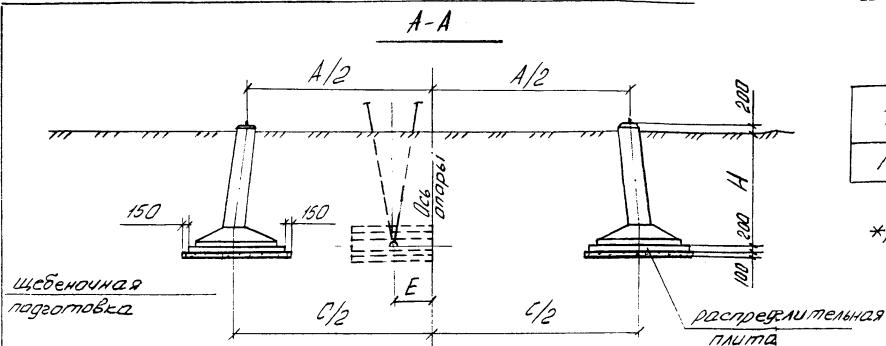

Установочные размеры фундаментов, мм

Тип опоры	A	B*	C	D*	E*	H
ПЧБ-5	18900	18300	20350	21000	7000	2500

*) Уточняется по проекту ВЛ

Состав фундаментов

Тип опоры	Вариант установки	Наименование элемента	Марка	Размер, мм	Масса, т	Кол.
ПЧБ-5	I	подложник	ФЧ-05	20х20х2,7	3,3	2
		анкерная плита	ПА3-1	30х20х0,6	2,8	2
		распределительная плита	РП-1	24х24х0,2	2,9	2
	II	подложник	ФЧ-05	20х20х2,7	3,3	2
		анкерная плита	ПА3-1	30х20х0,6	2,8	2

I вариант установки фундаментов соответствует I группе грунта; II вариант установки - II группе грунта

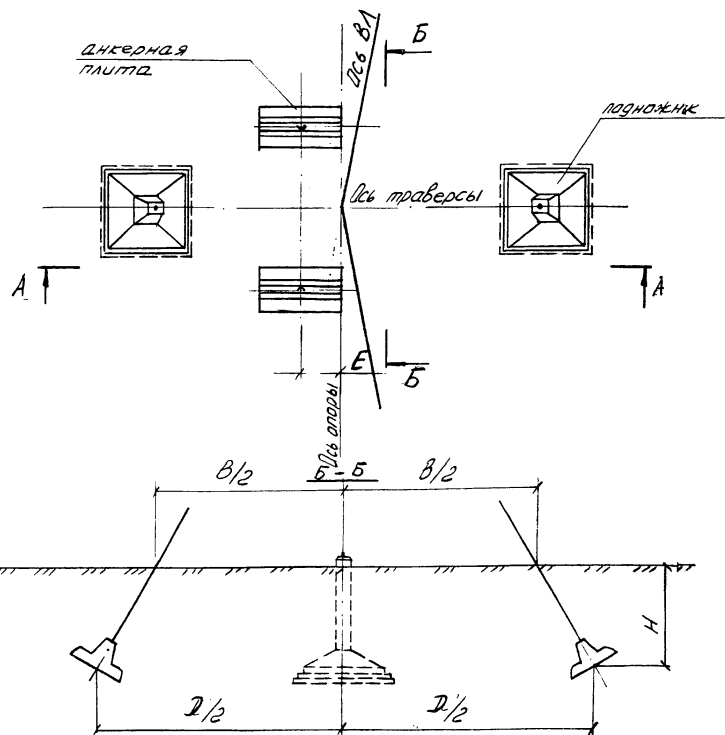


Рис. D-2 Схема фундаментов под промежуточно-уловную опору ПЧБ-5.

ВЛ-Т(К-1-37)

Лист
15

A-A

Установочные размеры фундаментов, мм

Тип опоры	A	B	C	D*	E*	H
ПЧБ-20	22100	2775	13475	19400	21200	2500

*| Уточняется по проекту ВЛ

Состав фундаментов

Тип опоры	Вариант установки	Наименование элемента	Марка	Размер, м	Масса, т	Кол-во
ПЧБ-20	I	подножник	Ф4-05	20*20*2,7	3,3	3
		анкерная плита распределительная плита	ПА3-1	30*20*0,6	2,8	4
	II	подножник	Ф4-05	20*20*2,7	3,3	3
		анкерная плита	ПА3-1	30*20*0,6	2,8	4


I вариант установки фундаментов соответствует I группе грунта; II вариант установки - II группе грунта

Рис. 0-3 Схема фундаментов под промежуточно-угловую опору ПЧБ-20

ВЛ-Т (К-1-37)



Лист
16

ФОРМАТ А3

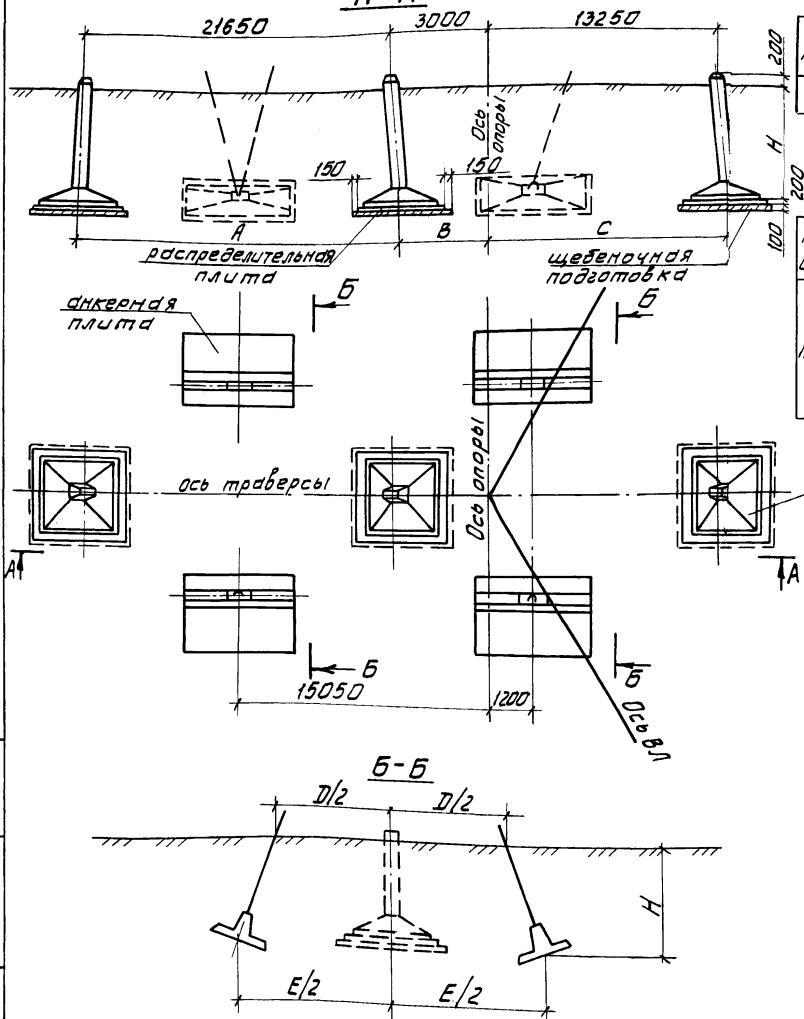

Шифр проекта, вид и дата. Шифр инв. П
04391

А — А

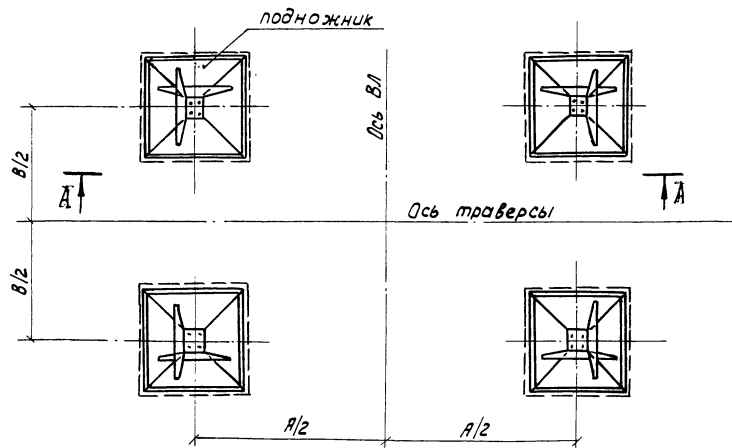

Установочные размеры фундаментов, мм

Тип опоры	А	В *	Н *
Р1	8008	5488	3000 (2500)
Р1+5	9048	6272	3000 (2500)
Р1+10	10090	7056	3000 (2500)
Р2	8008	5488	3000 (2500)
Р2+5	9048	6272	3000 (2500)
Р2+10	10090	7056	3000 (2500)


*) Глубина заложения подножников при I варианте установки фундаментов - 3,0 м, при II варианте установки фундаментов - 2,5 м

Состав фундаментов

Тип опоры	Группа грунта	Наименование элементы	Марка	Размер, м	Масса, т.	Кол-во
Р1	I	подножник	Ф5-4	2,7×2,7×3,2	5,6	4
Р1+5		ригель	Р1	1,5×0,5×0,5	0,2	8
Р1+10		ригель	Р1	1,5×0,5×0,5	0,2	8
Р2	II	подножник	Ф4-4	2,1×2,1×2,7	3,4	4
Р2+5		ригель	Р1	1,5×0,5×0,5	0,2	8
Р2+10		ригель	Р1	1,5×0,5×0,5	0,2	8

Рис. 0-4. Схемы фундаментов под промежуточные свободностоящие опоры Р1, Р1+5, Р1+10, Р2, Р2+5, Р2+10

A - A

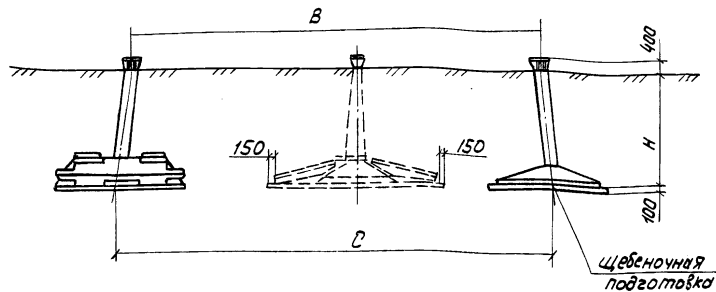


Установочные размеры фундаментов, мм

тип опоры	A	B	C	D	H
У1, У2	5000	7050	8040	5702	3000
У1+5, У2+5	6032	8505	9495	6734	3000
У1+12, У2+12	7478	10544	11534	8180	3000

Состав фундаментов


тип опоры	вариант установки	наименование элемента	марка	размер, м	масса, т	кол.
У1, У1+5, У1+12, У2, У2+5, У2+12	I	подножник	Ф 5 - А5	2,7*2,7*3,4	6,25	6
		подножник	Ф 6 - А5	2,0*3,0*3,4	6,8	6
		плита навесная	ПН2 - А	2,2*3,0*0,4	2,4	12
	II	подножник	Ф 5 - А5	2,7*2,7*3,4	6,25	12

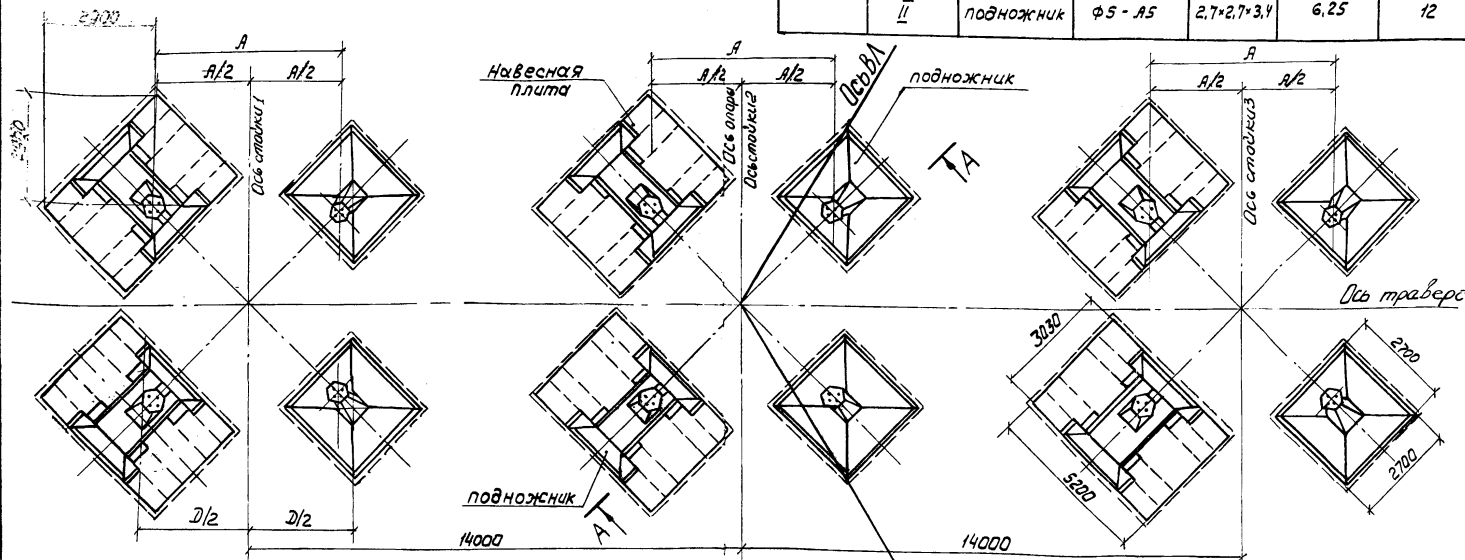

I вариант установки фундаментов соответствует I группе грунта, II вариант установки - II группе грунта

Рис. 0-5. Схема фундаментов под анкерно-угловые опоры У1, У1+5, У1+12, У2, У2+5, У2+12

ВА - Т (К-1-37)



Состав фундаментов

Тип опоры	Вариант установки	Наименование элемента	Марка	Размер, м	Масса, т	Кол., шт
УБМ-17	I	подложник	ФЗ-0	1,8х1,8х2,7	2,9	3
		анкерная плита	ПА 2-2	3,0х1,5х0,6	2,2	12
	II	подложник	ФЗ-0	1,8х1,8х2,7	2,9	3
		анкерная плита	ПА 2-1	2,0х1,5х0,6	1,6	12
УБМ-22	I	подложник	ФЧ-0	2,1х2,1х2,7	3,4	3
		анкерная плита	ПА 2-2	3,0х1,5х0,6	2,2	12
	II	подложник	ФЧ-0	2,1х2,1х2,7	3,4	3
		анкерная плита	ПА 2-1	2,0х1,5х0,6	1,6	12

Размеры А и В задаются проектом ВЛ.

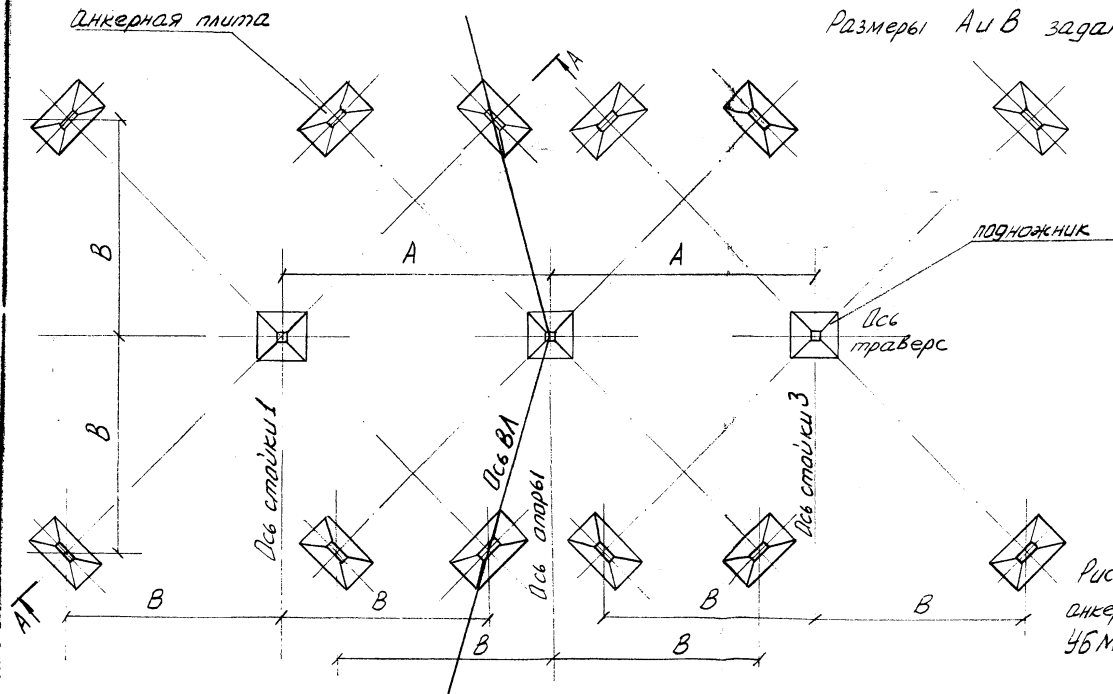


Рис. 0-6. Схема фундаментов под анкерно-уловье опоры УБМ-17 и УБМ-22.

Инв. № 24397
 Дата 24.3.97
 Место и дата
 Проект № 1

104

Технологическая карта

ВЛ 500 кВ

Установка фундаментов под промежуточные
свободностоящие опоры Р1, Р2, Р1+5, Р2+5,
Р1+10, Р2+10

К-1-37-II

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.1. Технологическая карта составлена на установку сборных железобетонных фундаментов под металлические промежуточные свободностоящие опоры Р1, Р2, Р1+5, Р2+5, Р1+10, Р2+10.

I.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

I.2.1. Подготовка основания.

I.2.2. Установка подножников и ригелей.

I.2.3. Выверка фундамента.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Перед установкой фундаментов должны быть выполнены следующие работы:

2.1.1. Закончена разработка котлованов.

2.1.2. Проверена устойчивость откосов котлованов с удалением обнаруженных камней и отслоений грунта.

2.1.3. Новторно выверены и закреплены кольшками разбивочные оси подножников.

2.1.4. Проверена комплектность завезенных железобетонных элементов и металлических деталей фундаментов.

2.1.5. Нанесено антикоррозийное покрытие, если это предусмотрено проектом.

2.2. Установка железобетонных элементов производится автомо-

ВЛ-Т(К-1-37)

Лист
104

Инв. № таб. 16391
Подпись и дата

бильным краном КС-4561А со стрелой длиной 10 м.

2.3. Схема производства работ показана на рис. II-I.

2.4. Технологическая последовательность производства работ:

2.4.1. Произвести ручную зачистку недобора грунта в местах установки подножников.

2.4.2. Проверить нивелиром отметки спланированных оснований под подножники.

2.4.3. Установить подножники и ригели.

2.4.4. Опустить в котлованы заземлители, если они предусмотрены проектом.

2.5. Схема осуществления контроля в процессе производства работ показана на рис. II-2.

2.6. При установке фундаментов следует руководствоваться указаниями по технике безопасности, изложенными в п. I2, I3.3, I3.4 общей части настоящего сборника.

Особое внимание обращается на следующее:

2.6.1. Для подъема железобетонных элементов необходимо применять стандартные стропы соответствующей грузоподъемности.

2.6.2. Строповка железобетонных элементов фундаментов должна производиться только за монтажные петли.

2.6.3. При привязке краны к конкретному объекту проверить достаточно ли грузоподъемность монтажного крана на требуемом вылете стрелы для установки подножника, заложенного в проекте ВЛ. Если при этом выявится невозможность работы с дневной поверхностью, рекомендуется применять кран большей грузоподъемности или переходить на устройство общего котлована со съездом.

ВЛ-Т(К-I-37)

Лист
105

И. № 402
24391
Лист
105

2.7 Работы по установке фундаментов производит звено в составе:

Профессия	Разряд.	Кол., чел.
Электролинейщик	6	I
Электролинейщик	4	I
Электролинейщик	2	2
Машинист	6	I

Инв. № подл.
94391

Подпись и дата

Лист
106

ВЛ-Т(К-I-37)

Лист
106

2.8. Калькуляция трудовых затрат

Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Норма времени на един. измерения, чел.-ч		Тип опоры			
			эл. лин.	маш.	Р1, Р2, Р1+5, Р2+5, Р1+10, Р2+10	Объем работ	Затраты труда, чел.-ч	эл. лин. маш.

А. Вариант установки фундаментов I (грунты I группы)

ЕНИР 23
Выпуск 3
§ 23-3-7

Установка подножников с вертикаль-

п. I	ными стойками Ф5-4	I шт	0,6	0,15	4	2,4	0,6
п. 2	($m = 5,6$ т)	I т	1,15	0,29	22,4	25,76	6,5
п. II	Установка ригелей	I шт.	0,72	0,18	8	5,76	1,44
п. I2	($m = 0,2$ т)	I т	3,0	0,75	1,6	4,8	1,2

ИТОГО

38,72 9,74

Б. Вариант установки фундаментов II (грунты II группы)

§ 23-3-7

Установка подножников с вертикаль-

п. I	ными стойками Ф4-4	I шт.	0,6	0,15	4	2,4	0,6
п. 2	($m = 3,4$ т)	I т	1,15	0,29	13,6	15,64	3,94
п. II	Установка ригелей	I шт.	0,72	0,18	8	5,76	1,44
п. I2	($m = 0,2$ т)	I т	3,0	0,75	1,6	4,8	1,2

ИТОГО

28,6 7,18

ВЛ-Т(К-1-37)

107

Лист

Ф 4

Лист 21. 103-78

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА УСТАНОВКУ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОДНУ ОПОРУ

Показатели	Тип опоры	
	PI, P2, PI+5, P2+5, PI+10, P2+10	
	Вариант установки	
	I	II
Трудоемкость, чел.-дн.	5,9	4,4
Время работы механизмов, маш.-см.	1,2	0,9
Численность звена, чел.	5	5
Продолжительность, смен	1,2	0,9
Производительность за смену, опор	0,8	1,1

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, оборудовании, приспособлениях, инструменте и инвентаре (на одно звено)

Наименование	Тип	Марка ГОСТ	Кол. шт.	Примечание
Кран	автомоб.	KC-456IA	I	2 стр.=10м
Нивелир	HA-1	I0528-76	I	
Рейка нивелирная		III58-83	I	
Лестница деревянная		ИИЗ 7700 168.00.00.000	I СБ	
Строп		СКР-10.8.0- -5000	I	
Строп		25573-82	I	

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный "Технологическим нормокomплектом средств малой механизации, ручного инструмента, приспособлений и инвентаря на устройство опорных ж/б фундаментов ВЛ напряжением 500-700 кВ", разработанным "Энергостройтрудом" 1984 г.

ВЛ-Т(К-I-37)

Лист
108

Лист № 108

Подпись и дата

24391

109

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

Наименование	Норма на один час ра- боты, кг	Количество, кг при типе опоры	
		PI, P2, PI+5, P2+5, PI+10, P2+10	
		Вариант установки фундаментов	
		I	II
Дизельное топливо	6,4	62,3	46,0
Дизельная смазка	0,3	3,0	2,2

Изм. № подл. 94391

Подпись и дата

Изм. № 10

ВЛ-Т(К-I-37)

Лист

109

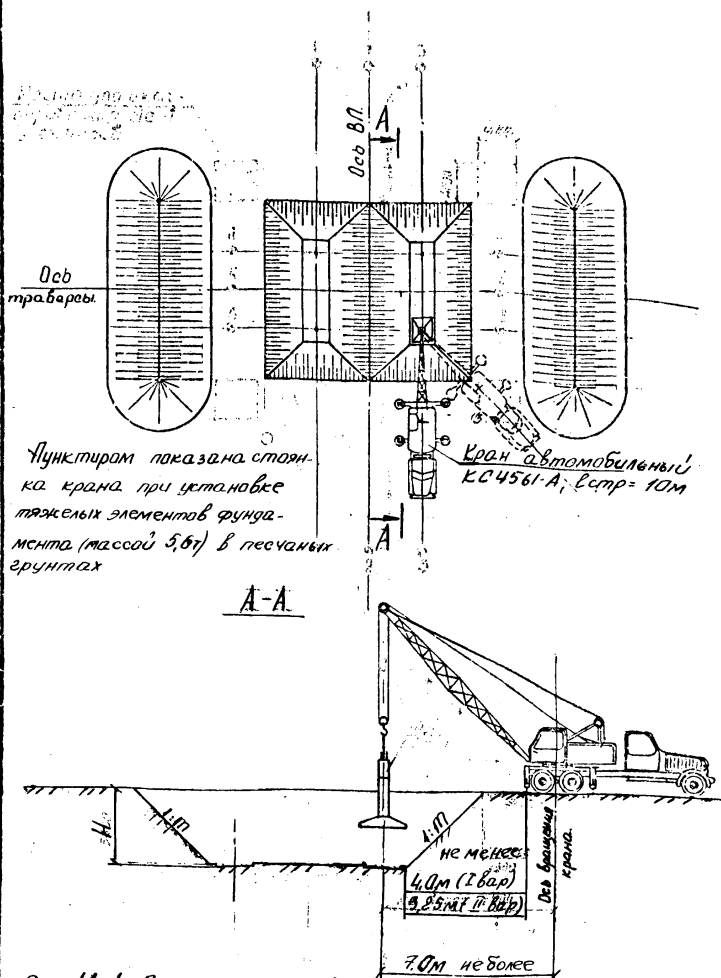


Рис. 11-1 Схема установки железобетонных элементов фундамента опор Р1, Р2, Р1+5, Р2+5, Р1+2, Р2+2

ВЛ-Т(К-137)

Лист


110

Инв. № подл. 24391

Подпись и дата

Взам. инв. №

Δ Контролируемые показатели		
1	Расхождение планировочных отметок под подожжники (мм)	10
2	Отклонение отметки верха подожжника и разности между ними (мм)	± 20
3	Погрешность в расстоянии между центрами подожжников (мм)	± 50

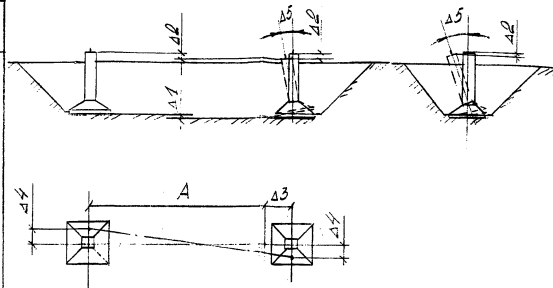

Δ Контролируемые показатели		
4	Смещение центров подожжников от проектной оси траверсы (мм)	50
5	Отклонение продольной оси подожжника от проектного положения	$\pm 1^\circ 30'$

Основные процессы и операции подлежащие контролю		Установка подожжников в котлован				
Состав контроля (что проверяется)	Отметки дна	Разность отметок дна котлованов	Вертикальность	Расстояние между центрами	Разность отметок верха	Разворот центров относительно оси траверсы
Техническое оснащение контроля (чем проверяется)	Геодетическая рейка Нивелир. Уровень		Отвес Метр	Рулетка РС-20	Геодетическая рейка. Уровень	Требуется
Вид контроля (режим и периодичность)	Сплошной в процессе работы		Сплошной в процессе работы			
Кто контролирует	Мастер		Мастер			
Где регистрируются результаты контроля (исполнительная документация)	Акт на скрытые работы		Акт на скрытые работы	Журнал работ по устройству железобетонных фундаментов.		

Рис. Н-2 Схема операционного контроля при установке подожжников под прочностными опорами Р4, Р2, Р-5, Р2-5, Р4-10, Р2-10

Шифр и дата выдачи работ в эксплуатацию
94397
