

**ВНИПИ труда в строительстве  
Госстроя СССР**

# **Руководство**

**по комплексному  
применению  
бригадного подряда  
на строительном  
конвейере:  
завод-транспорт-стройка**



Москва 1982

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
(ВНИПИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ГОССТРОЯ СССР

---

# Руководство

по комплексному  
применению  
бригадного подряда  
на строительном  
конвейере:  
завод—транспорт—стройка



Москва Стройиздат 1982

---

Рекомендовано к изданию секцией экономики труда в строительстве Ученого совета ВНИПИ труда в строительстве.

**Руководство по комплексному применению бригадного подряда на строительном конвейере: завод — транспорт — стройка/ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1982. — 39 с.**

Руководство направлено на обеспечение массового внедрения бригадного подряда на всех технологических стадиях крупнопанельного домостроения. В порядке опыта может применяться и в других видах строительства, осуществляемого промышленными методами.

При подготовке Руководства использован опыт организаций и предприятий Минстроя СССР, Минтяжстроя СССР и Минпромстроя СССР.

Для инженерно-технических работников, служащих и руководителей строительных, промышленных и автотранспортных организаций и предприятий, бригадиров хозрасчетных бригад, работников нормативно-исследовательских станций, центров НОТ и Оргтехстроев.

Табл. 10, ил. 3.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из важнейших элементов совершенствования управления социалистической экономикой, предусмотренного постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР по совершенствованию хозяйственного механизма, является применение коллективных (бригадных) форм организации и стимулирования труда, которые в ближайшие годы должны стать основными во всех отраслях народного хозяйства. В строительстве широко внедряется наиболее развитая форма коллективной организации и стимулирования труда — бригадный подряд.

В десятой пятилетке бригадный подряд доказал свою высокую эффективность во всех видах строительства и постепенно становится основным методом совершенствования организации труда и управления низовыми звеньями строительного производства. Вместе с тем, опыт показывает, что массовое и эффективное применение метода, предложенного бригадой Героя социалистического труда Н. А. Злобина, достигается только там, где его внедрение осуществляется в комплексе мер по совершенствованию планирования и организации производства, улучшению инженерной подготовки и комплектации объектов строительства. При этом в работу по внедрению бригадного хозрасчета, творческий поиск внутренних резервов повышения эффективности и качества строительства вовлекаются все отделы, службы и подразделения производственных коллективов — участников стройки. Пример такого творческого подхода дали, в частности, организации и предприятия, приступившие к внедрению сквозного поточного бригадного подряда — переводу на хозяйственный расчет бригад на всех технологических стадиях строительного конвейера: завод — транспорт — стройка. —

Настоящее Руководство подготовлено в соответствии с рекомендациями научно-практической конференции, посвященной внедрению бригадного подряда (г. Винница, 1978 г.). В его основу положен опыт Таллинского ДСК Министра Эстонской ССР, филиала № 4 объединения Таллинавототранс Минавтошосдора Эстонской ССР, Херсонского ДСК комбината Херсонпромстрой и Автобазы № 3 Минпромстроя Украинской ССР, организаций и предприятий КПД Главсочи-спецстроя Минпромстроя СССР, результаты экспериментов ВНИПИ труда в строительстве на Мурманском ДСК, в тресте Мурманскжилстрой и АТК Главмурманскстроя Минтяжстроя СССР.

Руководство разработано ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР (инженер-экономист Ю. Б. Гуров, канд. экон. наук А. И. Трошин) с участием Таллинского ДСК (экономисты Н. А. Крал, А. А. Мутовкин) и НИИСП Госстроя УССР (канд. экон. наук Т. И. Лозовая). В работе использованы материалы ИОМТПС Минстроя СССР, а также Прибалтийского филиала Бюро внедрения ЦНИИОМТП Госстроя СССР, центров НОТ ведущих строительных министерств, НИС ДСК-1 объединения КПД Главмосстроя. Учтены замечания и предложения строительных министерств и ведомств по проекту Руководства, а также требования утвержденного 31 марта 1980 г. Госстроем СССР по согласованию с Госпланом СССР, Госкомтрудом СССР, Минфином СССР, Стройбанком СССР, Госбанком СССР и ВЦСПС «Временного положения о бригадном подряде на перевозках строительных грузов автотранспортом».

Отзывы и предложения просьба направлять по адресу: 103006, Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10.

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Комплексное применение бригадного подряда на строительном конвейере «завод — транспорт — стройка»\* предусматривает: согласованную работу на подряде всех бригад, участвующих в технологическом процессе строительства, включающем стадии производства и комплектации сборных железобетонных изделий и конструкций, их транспортировки со складов готовой продукции (участков комплектации) на стройки, а также монтажа и выполнения всех других общестроительных, отделочных и специальных видов работ на всех объектах генерального подрядчика;

усиление взаимной материальной ответственности трудовых коллективов, занятых на всей технологической цепочке, и повышение их заинтересованности в конечных результатах строительства; дальнейшее расширение участия бригад в управлении производством.

1.2. Цель внедрения комплексного бригадного подряда — обеспечить использование внутрипроизводственных резервов повышения ритмичности и ускорения ввода объектов в эксплуатацию с наименьшими затратами при высоком качестве строительства, при одновременном улучшении технико-экономических показателей работы строительного автотранспорта и предприятий по производству железобетонных изделий и конструкций.

1.3. Комплексный бригадный подряд применяется на строительстве объектов жилья и соцкультбыта, сооружаемых комбинатами и трестами крупнопанельного (объемно-блочного) домостроения. Возможно также его опытное внедрение и на других видах строительства, осуществляемого индустриальными методами, например, при сооружении одноэтажных зданий производственного назначения, жилых домов на селе, линейных объектов и т. п., для монтажа которых многократно применяются однотипные сборные конструкции.

1.4. Хозяйственный расчет бригад на каждой из технологических стадий строительного конвейера осуществляется в соответствии с требованиями, установленными «Положением о новой форме бригадного хозяйственного расчета в строительстве — бригадном подряде» для бригад, работающих на строительной площадке; «Временным положением о бригадном подряде на перевозках строительных грузов автотранспортом» для бригад водителей, осуществляющих перевозку железобетонных изделий со складов готовой продукции (баз комплектации) на строительную площадку; «Положением о бригадном подряде на предприятиях по производству железобетонных изделий и конструкций» для бригад технологических линий, общепеховых бригад и бригад отделов (управлений) производственно-технологической комплектации (отделов сбыта и реализации готовой продукции) строительной организации (промышленного предприятия),\*\* а также изложенными в настоящем Руководстве требованиями комплексного бригадного подряда, предусматривающими

---

\* Далее по тексту — комплексный бригадный подряд.

\*\* При доставке сборных изделий и конструкций на строительную площадку с территориальных баз производственно-технологической комплектации и других мест временного складирования перевод бригад этих баз на хозяйственный расчет осуществляется на основе ведомственных Временных положений.

повышение взаимной ответственности участников строительного конвейера.

1.5. Основным условием применения комплексного бригадного подряда является двухлетнее непрерывное и взаимоувязанное планирование капитального строительства и строительного производства — «орловская непрерывка».

Другие необходимые условия:

выполнение всех видов строительного-монтажных работ поточно-совмещенным методом;

ритмичное функционирование монтажных потоков, обеспеченное планированием выпуска сборных элементов бригадами технологических линий формования, а также работы бригад водителей автотранспорта, на основе графика монтажа; оперативным управлением производством сборных элементов, их комплектацией, транспортировкой на строительную площадку и монтажом из единого центра — диспетчерской домостроительного комбината (треста крупнопанельного домостроения);

укрепление договорной дисциплины и совершенствование хозяйственных связей между организациями (предприятиями) — участниками строительного конвейера на основе долгосрочных хозяйственных договоров на выполнение работ (договора подряда и субподряда), перевозку грузов, поставку продукции;\* улучшение претензионной работы;

совершенствование и углубление низового хозяйственного расчета;

создание советов бригадиров;

социалистическое соревнование всех участвующих в строительстве бригад по принципу «Рабочая эстафета».

Обеспечение названных условий составляет основное содержание организационно-технических мероприятий по подготовке внедрения комплексного бригадного подряда, проводимых во всех участвующих в строительстве организациях и предприятиях.

1.6. Изложенные в настоящем Руководстве методические принципы и формы документации (см. приложения) предназначены для использования строительными министерствами, ведомствами и объединениями при разработке Временных положений и указаний по применению комплексного бригадного подряда, учитывающих особенности организации производства и видов строительства.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

2.1. Бригады строительного-монтажных организаций, участвующих в сооружении крупнопанельных (крупноблочных, объемно-блочных) жилых домов и объектов соцкультбыта, группируются, как правило, в комплексные специализированные потоки по выполнению работ нулевого цикла, монтажных специальных и общестроительных, отделочных, по благоустройству и озеленению.

В комплексные потоки включаются бригады специализированных субподрядных организаций.

\* См. Методические указания по заключению хозяйственных договоров на поставку продукции производственно-технического назначения на одиннадцатую пятилетку (утв. Госбанком СССР и Госарбитражем СССР 11 июня 1980 г.). — «Экономическая газета», № 31, июль 1980 г., стр. 6.

По отдельным видам работ, выполняемым бригадами субподрядных специализированных организаций, а также по отдельным видам общестроительных и отделочных работ небольшого объема, могут быть организованы частные специализированные потоки, увязанные с работой комплексных потоков. Проектирование и формирование потоков является одной из главных задач подготовки применения комплексного бригадного подряда.

2.2. Определение (уточнение) численного и профессионально-квалификационного состава бригад осуществляется на основе «Руководства по организации комплексных и специализированных бригад в жилищно-гражданском и промышленном строительстве» (М., Стройиздат, 1977) с учетом выполнения работ поточно-совмещенным методом. Работы по монтажу сборных конструкций подземных и надземных частей зданий и соответствующие общестроительные работы выполняются, как правило, комплексными бригадами.

2.3. Во всех бригадах внедряются научные методы организации труда. Для этого каждой строительной организацией разрабатываются соответствующие планы. Указания и рекомендации по структуре, разработке и использованию таких планов содержатся в «Руководстве по разработке и внедрению бригадных планов НОТ» (М., Стройиздат, 1978).

2.4. Бригады должны иметь перспективный (на один-два года) план, разрабатываемый на основе графиков поточного строительства с использованием указаний и рекомендаций, содержащихся в «Руководстве по годовому и перспективному планированию работы бригад в строительном-монтажных организациях» (М., Стройиздат, 1977). Для бригад одной строительной-монтажной организации, входящих в состав непрерывного потока, может быть разработан единый план.

2.5. Инженерно-техническое руководство хозрасчетными бригадами осуществляется линейным персоналом участков, объединяющих, как правило, бригады одного или нескольких потоков. В составе участка может быть одна укрупненная комплексная бригада, выполняющая монтажные и общестроительные работы.

Управление участками осуществляется непосредственно домостроительным комбинатом (трестом крупнопанельного домостроения, нулевого цикла) без промежуточного звена — монтажных (строительно-монтажных, строительно-монтажных) управлений. Исключение составляют наиболее крупные домостроительные комбинаты с объемом ввода общей площади 500 и более тыс. м<sup>2</sup> в год. Централизованные в трестах (комбинатах) службы обеспечивают инженерную подготовку строительства объектов, разработку технической и экономической документации и комплектацию хозрасчетных бригад всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

2.6. Инженерная подготовка строительства объектов выполняется в соответствии с требованиями главы СНиП III-1-76 и СН 47-74.

2.7. Основным планово-производственным документом, регулирующим работу хозрасчетных бригад, является утвержденный единым заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком и субподрядными организациями директивный график ввода жилых домов и объектов соцкультбыта.

Директивный график разрабатывается на основе Комплексного укрупненного сетевого графика застройки городов (КУСГ) в соот-

ветствии с СН 508-78 на два года и уточняется ежеквартально. При этом в последнем квартале первого года уточняются сроки ввода объектов на последующий год и разрабатывается график на третий год и т. д. График разрабатывается с разбивкой по кварталам и месяцам. По каждому объекту в графике указываются сроки начала и окончания работ нулевого цикла, начала и окончания монтажа конструкций надземной части, начала и окончания отделочных работ, сдачи объекта Государственной приемочной комиссии.

Сроки начала и окончания строительства объектов устанавливаются в пределах «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (СН 440-79).

2.8. На основе директивного графика ввода жилых домов и объектов соцкультбыта генподрядные и субподрядные строительномонтажные организации разрабатывают график поточного строительства и график движения бригад по объектам. Эти графики могут быть совмещены.

2.9. Для взаимной увязки графиков генподрядной и субподрядных организаций и их увязки с директивным графиком ввода рекомендуется следующий порядок их разработки и согласования (прил. 1):

На первом этапе заказчик и генеральный подрядчик разрабатывают взаимоувязанные проекты директивного графика ввода и графиков поточного монтажа конструкций подземной и надземной частей зданий. Если монтаж надземной (подземной) части выполняется субподрядной организацией, то работа первого этапа ведется с ее участием. Работы первого этапа завершаются передачей проектов указанных графиков непосредственно привлекаемым генеральным подрядчиком субподрядным строительномонтажным организациям (генсубподрядчикам) не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому периоду.

На втором этапе генеральный подрядчик и его непосредственные субподрядчики (генсубподрядчики) разрабатывают и согласовывают проекты графиков поточного выполнения работ собственными силами и графиков движения своих бригад по объектам. При этом ритмы потоков устанавливаются кратными ритму монтажа.

Работы второго этапа завершаются передачей проектов графиков другим специализированным субподрядным организациям (субсубподрядчикам) не позднее 15 октября.

На третьем этапе проекты графиков разрабатывают специализированные строительномонтажные организации (субсубподрядчики), привлекаемые для выполнения работ непосредственными субподрядчиками генподрядной организации (генсубподрядчиками).

Предварительное согласование проектов графиков этих организаций должно быть завершено не позднее 1 ноября.

На четвертом этапе рассматриваются все нерешенные вопросы организации непрерывной работы комплексных и частных потоков и до 15 ноября разрабатываются предложения по уточнению директивного графика ввода.

Пятый этап состоит в уточнении и согласовании директивного графика ввода и графиков монтажа.

Директивный график ввода жилых домов и объектов соцкультбыта утверждается заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками (генсубподрядчиками), не позднее 1 декабря.



**Шестой этап** состоит в окончательном согласовании всеми участвующими в строительстве организациями графиков работы комплексных и частных потоков и графиков движения бригад по объектам строительства на основе утвержденного директивного графика ввода жилых домов и объектов соцкультбыта.

В дальнейшем работа по уточнению и согласованию графиков проводится в первой половине каждого квартала в том же порядке.

На всех этапах работу по согласованию и увязке графиков точного выполнения строительно-монтажных работ и движения хозрасчетных бригад по объектам строительства координирует и контролирует руководство генподрядной строительно-монтажной организации с привлечением руководства субподрядных организаций.

**2.10. Увязка работы бригад строительных потоков и бригад технологических линий предприятий (цехов) по производству железобетонных изделий и конструкций (баз комплектации)** начинается на втором этапе разработки и согласования графиков работы бригад. С этой целью ведущие монтаж строительные организации направляют предприятиям (до 10 октября года, предшествующего планируемому периоду) предварительные проекты «Плана отгрузки железобетонных изделий», составленные на два года по укрупненной номенклатуре или комплектам на этаж-секцию с указанием потребителей (прил. 2).

На этой основе с учетом фонда рабочего времени и сменной производительности технологических линий каждое предприятие разрабатывает проект «Плана производства железобетонных изделий» на период в два года по укрупненной номенклатуре (видам изделий) с распределением объемов производства по цехам и технологическим линиям (прил. 3). Объемы производства продукции на каждой технологической линии расшифровываются по потребителям в «Плане выпуска железобетонных изделий хозрасчетной бригадой технологической линии» (прил. 4).

Планы отгрузки продукции каждого предприятия (базы комплектации) уточняются и согласовываются ведущими монтаж строительными организациями и утверждаются до 15 декабря года, предшествующего планируемому периоду, в том же порядке, в каком согласовываются графики строительно-монтажных организаций (см. п. 2.9 настоящего Руководства). В дальнейшем эти планы ежеквартально (в первой половине квартала, предшествующего планируемому) уточняются. При этом разрабатываются и согласовываются квартальные планы отгрузки продукции по номенклатуре с указанием сроков поставки изделий монтажным бригадам на объекты строительства.

Квартальные задания хозрасчетным бригадам на выпуск продукции устанавливаются в натуральных показателях по укрупненной номенклатуре (видам изделий).

Ежемесячно для хозрасчетной бригады технологической линии формирования разрабатывается «Номенклатурный план выпуска железобетонных изделий» на основе (так же, как и квартальное задание) расчета потребности монтажных потоков по объектам с учетом остатка изделий и конструкций на складе готовой продукции и их планового запаса (прил. 5). Потребность монтажных потоков (комплексных бригад монтажников) в железобетонных изделиях (по номенклатуре) определяется группой (отделом) подготовки производства (отделом производственно-технической комплектации строительной организации) в соответствии с техническими проектами

и месячной циклограммой (сетевым графиком) монтажа жилых домов и объектов соцкультбыта (прил. 6) и передается на предприятие (в цех) за две недели до планируемого месяца. Если монтаж конструкций подземной и надземной частей здания ведется бригадами разных строительно-монтажных организаций, то месячная циклограмма монтажа разрабатывается производственно-техническими (производственно-диспетчерскими) отделами этих организаций совместно.

Номенклатурные месячные планы выпуска железобетонных изделий хозрасчетными бригадами технологических линий служат основой месячных номенклатурных планов выпуска продукции формовочными цехами (прил. 7).

Основанием для выдачи хозрасчетным бригадам сменных производственных заданий служит «График выпуска железобетонных изделий» (прил. 8), в котором отражается также фактический выпуск. График разрабатывается группой (отделом) подготовки производства (отделом производственно-технологической комплектации) на неделю (декаду, месяц) в соответствии с циклограммой монтажа с учетом планового запаса. Если цех не входит в состав строительной организации, то график разрабатывается производственным отделом промышленного предприятия.

2.11. Комплектация строящихся объектов сборными железобетонными изделиями и конструкциями производится по суточно-часовому графику поставки рейсокомплектов (прил. 9), разрабатываемому группой комплектации сборным железобетоном (отделом производственно-технологической комплектации) строительной организации в соответствии с циклограммой монтажа, монтажными схемами и схемами раскладки изделий по транспортным средствам.

По графику поставки рейсокомплектов работают бригады склада готовой продукции (участка комплектации), бригада (бригады) водителей автотранспорта и производится разгрузка транспортных средств на строительной площадке. В графике с учетом технологической последовательности и продолжительности монтажа, а также времени, необходимого для доставки изделий со складов готовой продукции на строительную площадку записываются все рейсокомплекты изделий, которые должны быть поставлены на объекты и смонтированы в течение каждой смены. Здесь же отмечается время отправки, номера полуприцепов и фамилии водителей транспортных средств.

Диспетчер группы комплектации железобетоном строительной организации контролирует передвижение полуприцепов и автомобилей. Одновременно он отмечает отправленные изделия и конструкции на монтажных схемах, которые выдаются группе комплектации по каждому объекту техническим (производственно-техническим) отделом или отделом производственно-технологической комплектации.

С целью бесперебойного обеспечения монтажных бригад диспетчер групп комплектации железобетоном может в отдельных случаях, когда на складе нет некоторых конструкций, направить на объект те из имеющихся рейсокомплектов, монтаж которых в данное время возможен. Исполнение команды диспетчера группы комплектации об изменении рейсов в таких случаях является для водителей автотранспорта обязательным.

Группа комплектации железобетоном строительной организации ведет ежедневный учет движения изделий и конструкций на складах готовой продукции предприятий (цехов) по всей номенклатуре

в специальной книге (прил. 10) и через группу (отдел) подготовки производства (отделы реализации и сбыта готовой продукции предприятий) принимает меры по обеспечению необходимого запаса готовой продукции, а в экстренных случаях дает непосредственные указания в производственные цеха.

**2.12.** Увязка работы бригады (бригад) водителей автотранспорта с работой бригад строительных потоков (комплексных бригад монтажников) и бригад технологических линий предприятий (цехов) по производству железобетонных изделий и конструкций (комплектующих организаций) начинается на втором этапе разработки и согласования графиков работы бригад. С этой целью ведущие монтажно-строительные организации направляют автотранспортному предприятию (до 10 октября года, предшествующего планируемому периоду) предварительные проекты «Планов-заявок на перевозку железобетонных изделий» на один-два года, составленные по укрупненной номенклатуре (сваи, фундаментные блоки, плиты перекрытия, наружные стеновые панели, санитарно-технические кабины и т. п.) или по комплектам с указанием предприятий-изготовителей (комплектующих организаций), районов застройки и расстояний перевозок (прил. 11).

На этой основе автотранспортное предприятие разрабатывает проекты планов перевозок железобетонных изделий бригадой (бригадами) водителей автоколонны.

Планы перевозок согласовываются грузополучателями — строительными организациями, ведущими монтаж, и грузоотправителями — предприятиями-изготовителями железобетонных изделий и конструкций (комплектующими организациями) до 15 декабря года, предшествующего планируемому периоду, в порядке, определенном п. 2.9 настоящего Руководства.

В дальнейшем эти планы ежеквартально (в первой половине квартала, предшествующего планируемому) уточняются. Одновременно строительные организации предоставляют автотранспортному предприятию (на основе графиков движения бригад монтажников и технической документации по объектам) необходимые данные для квартального и месячного планирования загрузки бригады (бригад) водителей автотранспорта.

Квартальные «Планы перевозок железобетонных изделий бригадой водителей автоколонны» (прил. 12) согласовываются грузополучателями и грузоотправителями.

### **3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА БРИГАД НА ПОДРЯД И ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ**

**3.1.** Бригады, выполняющие строительно-монтажные работы, осуществляющие перевозку железобетонных изделий и конструкций на стройку и работающие на производстве и комплектации этих изделий и конструкций, переводятся на хозяйственный расчет с их согласия приказом руководства соответствующей организации (предприятия). Приказ согласовывает местный (заводской, построечный) комитет профсоюза.

На этом основании между бригадами и администрациями организаций (предприятий), в состав подразделений которых входят бригады, заключаются внутрихозяйственные договора, которые со-

гласовываются соответствующими профсоюзными комитетами. Наряду с этим бригады строительного конвейера заключают между собой многосторонний договор-обязательство (см. п. п. 3.6—3.8 настоящего Руководства).

Планирование, учет затрат, подведение итогов работы бригад на подряде и их премирование осуществляет соответствующая организация (предприятие).

3.2. В строительном-монтажных организациях договора заключаются с бригадами или группами бригад каждого потока на выполнение работ по объектам всей годовой программы. При этом сроки работ на объектах определяются на основе графика поточного производства работ (графика движения бригад) и аккордные наряд-задания выдаются бригаде на объем выполняемых ею работ по каждому объекту.

Расчетная стоимость поручаемых бригадам работ определяется калькуляционным методом по каждому объекту единой для группы бригад потока или отдельно для бригады.

**Пример.**

Бригады домостроительного комбината, ведущего сооружение надземной части зданий, сгруппированы в два комплексных специализированных монтажных потока в составе комплексной бригады монтажников, бригады слесарей-сантехников и бригады электромонтажников. Отделочные и кровельные работы выполняются бригадами комбината, работающими отдельными специализированными потоками. Монтаж лифтов и все другие работы выполняются бригадами привлекаемых комбинатом специализированных субподрядных организаций. В этом случае расчетные стоимости поручаемых бригадам работ определяются по каждому объекту отдельно:

для группы бригад монтажного потока;

для группы бригад отделочного потока;

для бригады, выполняющей кровельные работы;

для каждой бригады или группы бригад каждой специализированной субподрядной организации.

Если за бригадами монтажного потока закреплена группа бригад отделочного потока и работы выполняются по совмещенному графику, то по каждому объекту с согласия бригад может быть установлена единая расчетная стоимость работ для бригад монтажного и соответствующего отделочного потока.

При подготовке перевода бригад на подряд используются типовые формы, содержащиеся в «Руководстве по разработке плано-производственной документации для перевода бригад на подряд» (М., Стройиздат, 1978).

Учет фактических затрат ведется по каждой бригаде (группе бригад) потока в соответствии со способом определения расчетной стоимости (для бригады или группы бригад) по каждому объекту. Для этого строительном-монтажная организация устанавливает учетные шифры:

для каждого объекта;

для каждой бригады или группы бригад потока.

Основанием для учета затрат бухгалтерией служат надлежащие оформленные документы первичного производственного учета, подписанные бригадиром (бригадирами), материально ответственным лицом (мастером, прорабом) и начальником потока (участка).

Определение результатов работы хозрасчетных бригад осуществляется ежеквартально по всем объектам, принятым Государственной приемочной комиссией, с учетом затрат по устранению допущенных бригадой (бригадами) недоделок и дефектов.

Непроизводительные затраты и потери, связанные с некачественной работой смежников или вызванные вынужденным простоем из-за отсутствия фронта работ, устанавливаются актом и относятся на фактические затраты бригады (бригад), виновной в ущербе, по специальной учетной статье «Брак строительно-монтажных работ». Акт подписывают бригадиры и представители администрации соответствующих организаций. В случае разногласий сторон вопрос рассматривается советом бригадиров с участием представителей администрации организаций и в особых случаях руководством генподрядной организации с привлечением субподрядчиков. Если разногласия не урегулированы, то решение принимают вышестоящие организации.

3.3. При переводе на подряд бригад предприятий (цехов) по производству железобетонных изделий и конструкций администрация заключает с бригадами формовщиков цеха договор на кварталный или годовой объем выпуска продукции в укрупненной номенклатуре (по видам или укрупненным видам изделий). Расчетная стоимость устанавливается на кварталный объем выпуска продукции (на каждый квартал) для бригады (бригад) технологической линии.

При подготовке и применении бригадного подряда используются типовые формы документации, приведенные в «Руководстве по применению бригадного подряда на предприятиях по производству железобетонных изделий и конструкций» (М., Стройиздат, 1979).

Условием перевода бригад на подряд является хозяйственный расчет цеха. В соответствии с этим планирование и учет затрат организуется:

- по цеху в целом;
- для бригад (по каждой технологической линии).

Пример.

В крупном формовочном цехе три специализированные технологические линии:

по производству наружных стеновых панелей (три сменные бригады формовщиков и одна бригада отделочников);

по производству вентиляционных блоков (одна сквозная бригада формовщиков);

по производству элементов добора (одна сквозная бригада формовщиков).

Все бригады цеха заключают с администрацией единый договор на год. Расчетные стоимости выпуска продукции устанавливаются на каждый квартал:

для четырех бригад первой технологической линии или для укрупненной комплексной сквозной бригады;

для бригады второй технологической линии;

для бригады третьей технологической линии.

Бухгалтерия применяет четыре учетных шифра: один для цеха в целом и три для бригад каждой технологической линии.

Потери от брака и затраты, связанные с исправлением дефектов изделий в цехе, относятся на фактические затраты виновной в ущербе бригады (бригад) технологической линии по специальной статье «Брак».

Затраты строительных бригад на исправление дефектов изделий, выявленных на стройке, а также потери бригады водителей из-за вынужденных простоев при погрузке устанавливаются актом и относятся на фактические затраты виновной в ущербе бригады (бригад) технологической линии, по специальной статье «Рекламации». Акт подписывает бригадир комплексной бригады монтажников (бригады водителей), представитель администрации строительной организации (автотранспортного предприятия) и представитель цеха

(предприятия). В случае разногласий сторон вопрос разрешается в порядке, указанном в п. 3.2 настоящего Руководства.

Общещеховые бригады, обслуживающие несколько технологических линий формования (машинисты мостовых кранов, ремонтные рабочие и др.), а также бригады бетоносмесительных узлов и арматурных отделений заключают договор с бригадами формовщиков, в котором обязуются обеспечить бесперебойную, ритмичную работу технологических линий. Расчетная стоимость для бригад не устанавливается, так как соответствующие затраты и услуги учитываются в составе затрат на производство готовой продукции.

В небольших фомовочных цехах, имеющих одну-две технологические линии, создаются и переводятся на хозяйственный расчет укрупненные комплексные сквозные бригады, включающие формовщиков, мотористов БСУ, арматурщиков, машинистов мостовых кранов и др.

В крупных формовочных цехах, где технологические линии расположены в отдельных пролетах, машинисты мостовых кранов могут быть включены в состав бригад формовщиков.

Если отделка сборных деталей производится на стендах (конвейерах), закрепленных за отдельными линиями формования, то отделочники (столяры, штукатуры, и др.) включаются в состав комплексных хозрасчетных бригад формовщиков.

Бригады арматурных и бетоносмесительных цехов переводятся на хозяйственный расчет при условии, если затраты на изготавливаемые ими полуфабрикаты и изделия списываются на готовую продукцию (железобетонные изделия и конструкции) по планово-расчетным ценам. При списании затрат по производству арматуры и бетона на готовую продукцию по факту бригады этих цехов работают на подряде по договору с бригадами технологических линий формования. При введении планово-расчетных цен договора между бригадами могут заключаться и в дальнейшем.

3.4. Бригады отделов (управлений) производственно-технологической комплектации (отделов реализации и сбыта готовой продукции), работающие на складах готовой продукции формовочных цехов, переводятся на подряд в том же порядке, что и общещеховые бригады.

Бригады участков комплектации железобетоном управлений производственно-технологической комплектации строительных трестов или иных организаций переводятся на хозяйственный расчет в порядке, аналогичном порядку перевода бригад технологических линий основных производственных цехов.

3.5. Для перевозки железобетонных изделий и конструкций со складов готовой продукции (баз комплектации) на строительную площадку автотранспортное предприятие формирует бригаду водителей. Как правило, такая бригада осуществляет перевозку железобетонных изделий и конструкций как для монтажа надземной части зданий, так и для работ нулевого цикла (включая свай и фундаментные блоки). В отдельных случаях, например, при большом объеме грузооборота (более 10 млн. т-км/год) в связи с удаленностью районов застройки или большим масштабом строительства для перевозки железобетона может быть выделено несколько бригад водителей. В таких случаях эти бригады закрепляются за определенными районами застройки либо специализируются на перевозке определенных видов изделий, например, выделяется специализированная бригада для перевозки деталей нулевого цикла.

Администрация автотранспортного предприятия заключает договор с каждой бригадой водителей в отдельности или с группой бригад специализированной автоколонны на год или квартал. Расчетные стоимости поручаемых перевозок (грузооборота) устанавливаются каждой бригаде на квартал.

При определении расчетной стоимости должна быть учтена загрузка транспортных средств по схеме раскладки железобетонных изделий и конструкций рейсокомплектами. Схема раскладки изделий и конструкций по транспортным средствам разрабатывается главным технологом строительного-монтажной организации и согласовывается автотранспортным предприятием.

Учет фактических затрат производится по каждой бригаде водителей, для чего бухгалтерия вводит учетные шифры и накопительные ведомости.

Затраты и потери строительных бригад, вызванные несоблюдением суточно-часового графика доставки рейсокомплектов или повреждением деталей во время погрузки, перевозки или разгрузки по вине водителей автотранспорта, устанавливаются актом за подписью бригадира комплексной бригады монтажников, представителя строительной организации и представителя автотранспортного предприятия и относятся на фактические затраты бригады водителей по специальной статье «Рекламации грузополучателя». Разногласия сторон разрешаются в порядке, аналогичном указанному в п. 3.2 настоящего Руководства.

Убытки бригады водителей, вызванные сверхнормативными простоями автотранспорта из-за несвоевременной загрузки (разгрузки) полуприцепов и других транспортных средств, компенсируются в том же порядке и относятся на фактические затраты виновной бригады технологической линии формовочного цеха (бригады монтажников) по специальной статье «Рекламации грузоперевозчика».

Если сверхнормативный простой автотранспорта под погрузкой или в ожидании погрузки произошел по вине бригады отдела производственно-технологической комплектации (отдела реализации и сбыта готовой продукции предприятия), то убытки бригады водителей покрываются за счет хозрасчетной бригады (бригад) технологических линий формовочного цеха, на складе готовой продукции которого был допущен этот простой. Если же ущерб нанесен хозрасчетной бригадой участка комплектации, то убытки бригады водителей покрываются за счет фактических затрат виновной бригады.

3.6. Внедрение комплексного бригадного подряда осуществляется поэтапно.

На первом этапе совершенствуется бригадный хозрасчет на строительных потоках и обеспечивается перевод на подряд бригад на производстве и комплектации сборных железобетонных изделий и конструкций.

На втором этапе на подряд переводятся бригады водителей автотранспорта; одновременно организации и предприятия издаются приказы (или совместный приказ) о применении комплексного бригадного подряда, и бригады строительного конвейера заключают между собой многосторонний договор.

3.7. В многостороннем договоре хозрасчетных бригад строительного конвейера устанавливаются взаимные обязательства бригад.

Договор заключается, как правило, на год, подписывается бригадирами согласовывается руководителями организаций и предприя-

тий строительного конвейера. Рекомендуемая форма многостороннего договора приводится в прил. 13.

3.8. Заключению договора бригад предшествует заключение договоров подряда (субподряда, перевозок, поставок) между организациями и предприятиями. В особых условиях к договорам между организациями и предприятиями устанавливаются обязанности и ответственность организации и предприятий по обеспечению условий применения комплексного бригадного подряда.

В частности, генподрядная строительно-монтажная организация обязуется своевременно сооружать и поддерживать в пригодном для нормальной эксплуатации транспортных средств состоянии внутриквартальные проезды, временные дороги, разворотные площадки и стоянки полуприцепов, обеспечить их освещение и т. п.

Управление (трест) механизации обязуется осуществлять монтаж, демонтаж и перебазировку башенных кранов в соответствии с графиком поточного выполнения строительно-монтажных работ, обеспечить постоянный состав экипажей машинистов башенных кранов в комплексных бригадах монтажников конструкций. В особых условиях к договору предусматривается, что экипажи машинистов башенных кранов управления (треста) механизации переводятся на подряд в составе комплексных бригад монтажников и согласовывается порядок оплаты их труда и премирования.

В особых условиях к договорам согласовываются размеры санкций сторон в случае допущения срыва ритмичной работы строительного конвейера (графика поточного производства работ, графика комплектации и т. п.) и порядок компенсации ущерба, нанесенного хозрасчетными бригадами по вине бригад другой организации (предприятия). Так, предусматривается, что возмещение ущерба, нанесенного хозрасчетной бригаде одной организации (предприятия), хозрасчетной бригадой другой организации (предприятия) осуществляется по следующей схеме:

акт рекламации — перечисление соответствующих сумм с расчетного счета одной организации (предприятия) на расчетный счет другой организации (предприятия) — отнесение убытков (возмещение) на фактические затраты соответствующих производственных подразделений и хозрасчетных бригад.

Особые условия (в части, касающейся обеспечения требований комплексного применения бригадного подряда) прилагаются к договорам между организациями (предприятиями) и к многостороннему договору-обязательству бригад строительного конвейера.

3.9. В особые условия к договору генерального подряда включаются обязательства единого заказчика по обеспечению условий внедрения и эффективного применения комплексного бригадного подряда. Так, заказчик обязуется: своевременно утверждать титульные списки и директивный график ввода объектов; предоставлять проектно-сметную документацию и материальные ресурсы надлежащего качества, комплектно, в сроки, обеспечивающие выполнение строительно-монтажными организациями графика ввода. Обязательства заказчика в отношении проектно-сметной документации согласовываются генеральным проектировщиком. Предусматривается также порядок разработки и согласования графиков, применение санкций.

Особые условия и протоколы согласования, касающиеся комплексного применения бригадного подряда, прилагаются к договору хозрасчетных бригад.



## 4. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

4.1. Хозрасчетные бригады строительного конвейера премируются за основные результаты работы:

из фонда заработной платы;  
из образуемого из прибыли фонда материального поощрения предприятия (организации);  
за счет экономии, полученной в результате снижения расчетной стоимости порученных бригаде работ, перевозок, выпуска продукции;

за счет средств заказчика капитального строительства.

4.2. Премирование из фонда заработной платы и фонда материального поощрения осуществляется в соответствии с действующими на предприятиях (в организациях) системами премирования, разработанными с учетом соответствующего Положения о бригадном подряде и настоящего Руководства.

Основным условием премирования бригады строительного конвейера является выполнение ею графика работ (перевозок, выпуска продукции).

4.3. За счет экономии бригады премируются:

за достигнутую ими экономию в соответствии с действующими Положениями о бригадном подряде;

за сохранность сборных конструкций с учетом ограничений, установленных действующим «Положением о премировании работников строительных и монтажных организаций за экономию строительных материалов и сохранность сборных конструкций».

Премирование за счет экономии бригад, работающих на участках комплектации железобетоном управлений производственно-технологической комплектации строительных трестов и организаций системы Госснаба СССР (за достигнутую бригадами экономию), а также бригад, работающих на комплектации и транспортировке сборного железобетона (за сохранность сборных конструкций), возможно лишь в экспериментальном порядке. Рекомендуемая система источников премирования бригад строительного конвейера приводится в прил. 14 к настоящему Руководству.

Бригады, работающие на складах готовой продукции цехов промышленных предприятий по производству железобетонных изделий и конструкций, а также на складах готовой продукции цехов, находящихся на балансе основной деятельности строительно-монтажных организаций, премируются за счет экономии затрат на производство продукции при условии выполнения обязательств по договору с хозрасчетными бригадами технологических линий формирования.

Премирование за сохранность сборных конструкций рекомендуется осуществлять в форме премирования за обеспечение полной сохранности комплекта сборных конструкций и деталей по объекту или этапу (комплексу) работ, что должно удостоверяться актом, подписанным бригадами и линейными инженерно-техническими работниками (материально ответственными лицами).

4.4. За счет средств заказчика (сметной стоимости строительства и прибыли, получаемой в результате досрочного ввода объектов) бригады строительного конвейера премируются в соответствии с «Положением о премировании работников за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства».

Промышленным предприятиям по производству железобетонных изделий и конструкций, на которые названное выше Положение не

распространяется, рекомендуется использовать (в порядке опыта) для премирования бригад строительного конвейера за ввод в действие объектов средства фонда материального поощрения. С этой целью администрация и комитет профсоюза предприятия при составлении сметы расходования фонда предусматривает конкретные суммы по статье «На премирование за обеспечение своевременных поставок комплектов готовой продукции высокого качества на объекты строительства (за содействие вводу в действие объектов строительства в срок и досрочно)» в составе направления «а» использования этого фонда, установленного «Основными положениями об образовании и расходовании фонда материального поощрения и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства (фондов поощрения) в 1981—1985 годах в промышленности», утвержденными 5 марта 1980 г. Бригады премируются по рекомендации совета бригадиров строительного конвейера.

4.5. Инженерно-технические работники и служащие организаций и предприятий — участников строительного конвейера, активно способствующие внедрению и эффективному применению комплексного бригадного подряда, получают премии:

за счет достигнутой бригадами экономии в соответствии с Положениями о бригадном подряде;

из фонда материального поощрения предприятия (организации).

Для обеспечения соответствующего премирования из фонда материального поощрения администрация и комитет профсоюза предприятия (организации) предусматривают в смете расходования фонда суммы по статье «На премирование за активное содействие применению бригадного подряда» в составе средств, выделяемых на единовременное поощрение отдельных работников за выполнение особо важных производственных заданий. В приказе руководителя предприятия (организации) выполнение работы по подготовке и применению комплексного бригадного подряда объявляется особо важным производственным заданием.

## 5. СОВЕТЫ БРИГАДИРОВ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

5.1. При комплексном применении бригадного подряда на строительном конвейере создаются советы бригадиров строительного потока (потоков) генподрядной и субподрядных строительного-монтажных организаций, совет (совет бригадиров) автотранспортной бригады (бригад), совет (совет бригадиров) комплектующей бригады (бригад) и совет (советы) бригадиров формовочных цехов. Из их представителей создается объединенный совет бригадиров строительного конвейера.

5.2. Совет бригадиров является формой участия рабочих в управлении производством, действует как общественный орган коллектива (коллективов) рабочих и согласовывает свою деятельность с администрацией.

5.3. Цель деятельности советов бригадиров — способствовать ритмичной и эффективной работе строительного конвейера, выполнению и перевыполнению квартальных и годовых планов ввода в действие объектов строительства.

5.4. Совет бригадиров выполняет следующие функции: участвует в разработке проекта договора, совместных социалистических обязательств хозрасчетных бригад строительного конвейера и контролирует их выполнение;

заслушивает и обсуждает предложения рабочих по вопросам повышения эффективности производства, относящимся к работе бригад;

рассматривает хозрасчетные претензии в случаях разногласий между бригадами и дает по ним свои рекомендации;

принимает активное участие в подведении итогов социалистического соревнования хозрасчетных бригад и между организациями и предприятиями — участниками строительного конвейера; дает предложения по присуждению классовых мест;

ходатайствует перед руководителями организаций и предприятий о повышении или понижении размеров премий хозрасчетным бригадам за ввод объектов в действие, за достигнутую экономию и из фонда материального поощрения.

5.5. Совет бригадиров имеет право:

заслушивать отчеты бригадиров о ходе выполнения работ, обязательств по договорам и социалистических обязательств;

приглашать на свои заседания руководящих, инженерно-технических работников и служащих организаций и предприятий.

5.6. Постоянное руководство работой совета бригадиров осуществляют избираемые на его первом заседании председатель, его заместители и секретарь. В объединенном совете бригадиров на должность председателя, как правило, избирается бригадир комплексной бригады монтажников генподрядной строительной организации.

Заседания совета бригадиров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Решения принимаются большинством при открытом голосовании. Протоколы заседания совета доводятся до бригад и руководителей организаций (предприятий) в трехдневный срок.

5.7. Социалистическое соревнование хозрасчетных бригад строительного конвейера организуется по принципу «рабочей эстафеты»: социалистические обязательства бригад предусматривают своевременное и качественное выполнение работ (выпуска продукции, грузоперевозок), обеспечивающее ритмичную в соответствии с графиком работу бригад-смежников, своевременный ввод в действие объектов строительства при высоком качестве выполнения работ с наименьшими затратами.

За основу социалистических обязательств бригад принимаются их обязательства по договорам с администрациями организаций (предприятий) и по договору бригад строительного конвейера:

бригады строительных потоков обязуются выполнять работы в соответствии с графиком производства работ, предоставлять смежникам фронт работ в установленные графиком сроки;

бригада (бригады) водителей автотранспорта обязуются выполнять перевозки в строгом соответствии с суточно-часовым графиком поставки рейсокомплектов и тем самым обеспечить возможность ритмичной работы комплексных бригад монтажников;

бригада (бригады) отдела (управления) производственно-технологической комплектации строительной организации (отдела реализации и сбыта готовой продукции предприятия) обязуется производить погрузку железобетонных изделий и конструкций в транспортные средства в строгом соответствии с суточно-часовым графиком поставки рейсокомплектов, создавая условия для работы бригады (бригад) водителей автотранспорта в соответствии с ритмом монтажа;

бригады технологических линий формовочных цехов обязуются выпускать железобетонные изделия и конструкции высокого качества в объеме (по номенклатуре), необходимом для бесперебойной отгрузки готовых деталей на транспортные средства в соответствии с суточно-часовым графиком поставки рейсокомплектов;

общецеховые (общезаводские) бригады и бригады арматурных бетоносмесительных цехов обязуются выполнять работы и выпускать продукцию высокого качества и комплектно, обеспечивая бесперебойную и ритмичную работу бригад технологических линий формования.

Бригады формовочных, арматурных и бетоносмесительных цехов принимают повышенные социалистические обязательства, предусматривающие дополнительный выпуск продукции в пределах пополнения нормируемых запасов на складах и реальных возможностей сбыта этой дополнительной продукции.


Все бригады строительного конвейера обязуются улучшать качественные показатели своей работы, повышать производительность труда, добиваться снижения фактических затрат по сравнению с расчетной стоимостью порученных им работ (перевозок, выпуска изделий и конструкций). При защите социалистических обязательств бригад на собрании коллектива в частности уточняется, за счет каких внутренних резервов, по каким статьям расчетной стоимости и на сколько бригада обязуется добиться снижения производственных затрат.

5.8. Итоги социалистического соревнования подводятся и победители определяются совместным решением профсоюзных комитетов организаций и предприятий с учетом предложений советов бригадиров.

5.9. Изложенное в пп. 5.7. и 5.8. находит отражение и развитие в условиях социалистического соревнования, разрабатываемых каждой организацией (предприятием), и в условиях социалистического соревнования хозрасчетных бригад строительного конвейера, разрабатываемых соответствующими организациями и предприятиями совместно. Строительно-монтажным организациям рекомендуется использовать «Руководство по совершенствованию организации социалистического соревнования в строительстве» (М., Стройиздат, 1977).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Этапы разработки и согласования графиков движения  
хозрасчетных бригад по объектам строительства

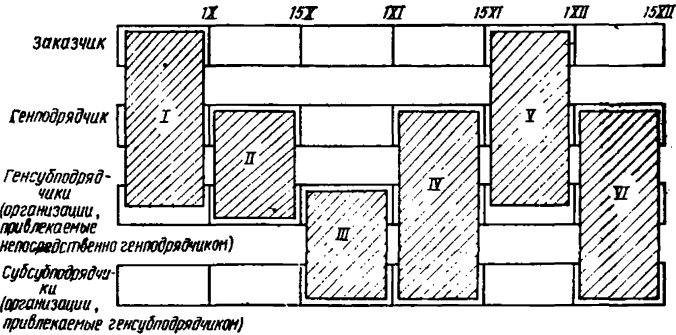

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Потребитель \_\_\_\_\_  
(трест, комбинат)

Изготовитель (отправитель) \_\_\_\_\_  
(цех, завод, комбинат,  
комплектующая организация)

План отгрузки железобетонных изделий  
на 19\_\_ и 19\_\_ гг.

№ п.п.	Вид изделия или шифр комплекта на этаж-секцию	Объем поставок, м <sup>3</sup> (шт. компл.)									
		19__г.				19__г.					
		В том числе по кварталам				В том числе по кварталам					
1	2	3	I	II	III	IV	8	I	II	III	IV
			4	5	6	7		9	10	11	12

На участок № 1  
Поток № 1, бригадир комплексной  
бригады монтажников т. \_\_\_\_\_

1  
2  
и т. д.

Итого по потоку № 1

Продолжение прил. 2

№ п. п.	Вид изделия или шифр комплекта на этаж-секцию	Объем поставок, м³ (шт. компл.)									
		19__ г.	В том числе по кварталам				19__ г.	В том числе по кварталам			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Поток № 2, бригадир комплексной бригады монтажников т. _____								
1											
2											
и т. д.											
			Итого по потоку № 2 Всего по участку № 1								
			На участок № 2 Поток № 3, бригадир комплексной бригады монтажников т. _____								
2											
1											
и т. д.											

Изготовитель \_\_\_\_\_  
(завод, комбинат)

План производства железобетонных изделий

на 19\_\_ и 19\_\_ гг.

№ п.п.	Вид изделия	Объем производства, м³									
		19__г.	В том числе по кварталам				19__г.	В том числе по кварталам			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формовочный цех № 1 Технологическая линия № 1, бригадир т. _____									
1											
2											
и т. д.											
	Итого										
		Технологическая линия № 2, бригадир т. _____									
1											
2											
и т. д.											
	Итого Всего по цеху № 1										
		Формовочный цех № 2 Технологическая линия № 1, бригадир т. _____									
1											
2											
и т. д.											

Завод (комбинат) \_\_\_\_\_

План выпуска железобетонных изделий  
хозрасчетной бригадой технологической линии

№ 1 формовочного цеха № 1, бригадир т. \_\_\_\_\_  
на 19\_\_ и 19\_\_ гг.

№ п.п.	Вид изделия	Объем производства, м <sup>3</sup>									
		19__г.	В том числе по кварталам				19__г.	В том числе по кварталам			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 2 и т. д.		Для треста (комбината) _____ Участок № 1 Поток № 1, бригадир комплексной бригады монтажников т. _____									
	Итого по потоку № 1										
1 2 и т. д.		Поток № 2, бригадир комплексной бригады монтажников т. _____									
	Итого по потоку № 2										
1 2 и т. д.		Для треста (комбината) _____ и т. д.									
	Всего по участку № 1 и т. д. Всего по тресту										
	Всего										



Завод (комбинат) \_\_\_\_\_

**Номенклатурный план выпуска  
железобетонных изделий хозрасчетной бригадой**

(фамилия, и. о. бригадира)

технологической линии № 1 формовочного цеха № 1 на  
\_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
(месяц)


№ п.п.	Наименование и марка изделия	Объем одного изделия, м³	Количество изделий, шт				Итого на монтаж	Остаток на складе на начало месяца, шт.	Плановый запас, шт.	Шифр изделия	План выпус- ка	
			Трест _____								шт.	м³
			Участок _____									
			Поток _____									
			Объект	Объект								
Брига- да	Брига- да											
1	2	3	4	5								
1												
2												
3												
4												
и т. д.												
	Всего											

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Фрагмент циклограммы монтажа

на \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

(месяц)

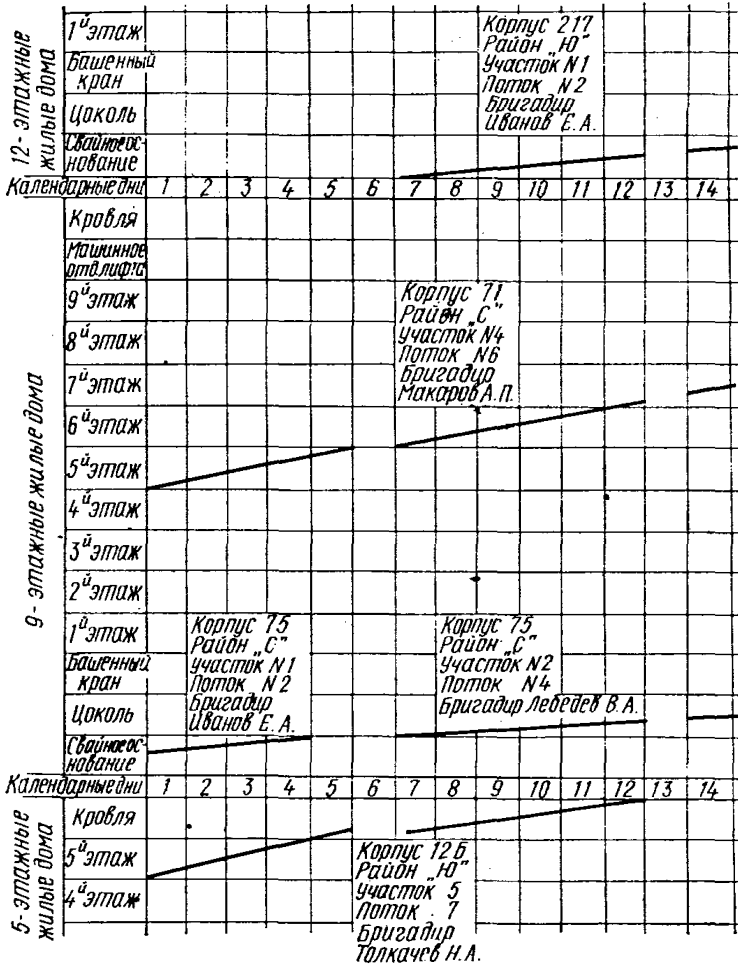

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

Завод (комбинат) \_\_\_\_\_

**Номенклатурный план выпуска железобетонных изделий  
формовочным цехом № 1**

на \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
(месяц)

№ п.п.	Наименование и марка изделия	Объем одного изделия, м³	Шифр изделия	Объем выпуска		
				шт.	м³	
	Технологическая линия № 1, бригада т. _____					
1						
2						
3						
и т. д.						
	Итого					
	Технологическая линия № 2, бригада т. _____					
1						
2						
3						
и т. д.						
	Итого					
	Всего по цеху					

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Завод (комбинат) \_\_\_\_\_

График выпуска железобетонных изделий  
бригадами технологических линий формовочного цеха № 1

Марка изделия	План, шт.	Наименование показателей	По суткам Нарастающим итогом					
			1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12 ВС. Iy	24	Факт	Технологическая линия № 1, бригада т. _____						
			План	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{4}{24}$
			Формовка	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{4}{18}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{3}{24}$
			Выпуск	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{4}{18}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{3}{24}$
			В том числе принято ОТК с первого предъявления	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{13}$	$\frac{4}{17}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{23}$
			Брак	—	—	—	—	—	—

и т. д.

Технологическая линия № 2, бригада т. _____						
План	и т. д.					

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Суточно-часовой график поставки рейсокомплектов  
железобетонных изделий

на \_\_\_\_\_ 19\_\_  
(число) (месяц)

Смена \_\_\_\_\_

Комплект № _____	Содержа- ние комп- лекта	Объект  _____	Расстояние перевозки  _____ км	Время освобождения прицепа на объекте _____	
				Формовоч- ный цех № _____	Время доставки прицепа на склад  _____
				Прицеп № _____	Фамилия водите- ля автомобиля  _____
					Время отправки прицепа со склада  _____
Комплект № _____ и т. д.					

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Книга остатков железобетонных изделий на складах

готовой продукции на

\_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
(месяц)

№ п. п.	Наименование и марка изделия	План на месяц, шт.	Остаток на нача- ло месяца, шт.	По числам месяца, нарастающим итогом, шт.								
				1			2			и т. д.		
				При- ход	Рас- ход	Оста- ток	При- ход	Рас- ход	Оста- ток	При- ход	Рас- ход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
и т. д.												



Согласовано:						Утверждаю:
грузоотпра- вители			грузополу- чатели			
организа- ция	подпись	дата	организа- ция	подпись	дата	
						Руководитель авто- транспортно- го предпри- ятия _____ (подпись)  _____ (дата)

План перевозок железобетонных изделий бригадой водителей

\_\_\_\_\_  
ф., и., о. бригадира

автоколонны № \_\_\_\_\_  
(наименование автотранспортного предприятия)

на \_\_\_\_\_ квартал 19 \_\_ г.

№ п.п.	На объекты бригадам монтажников: наименования видов изделий и конструкций (по укрупненной номенклатуре) или шифры комплектов	Со складов готовой продукции (участков комплектации), т (шт. компл.)												Всего		
		(завод, база комплектации)						(завод, база комплектации)								
		(цех, участок)			(цех, участок)			(цех, участок)			(цех, участок)			План	Факт	%
		Бригадир: _____			Бригадир: _____			Бригадир: _____			Бригадир: _____					
План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I. Объект: _____ Бригада: _____ в том числе															
1																
2																
3																
4																
	II, Объект: _____ Бригада: _____ в том числе															
1																
2																
	Всего															



«Согласовано»: «Согласовано»: «Согласовано»: «Согласовано»:

\_\_\_\_\_  
(Организация, предприятие)

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, фамилия, и., о.)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Печать:

«Согласовано»: «Согласовано»: «Согласовано»: «Согласовано»:

\_\_\_\_\_  
(Организация, предприятие)

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, фамилия, и., о.)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Печать:

**Комплексный договор  
бригад строительного конвейера: завод — транспорт — стройка**

Город \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г

**1. Договаривающиеся стороны и срок договора**

Мы, нижеподписавшиеся  
бригадиры технологических линий формовочных цехов:

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятий, цехов, ф., и., о. бригадиров)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

бригады такелажников и машинистов управлений (отделов) производственно-технологической комплектации (отделов реализации и сбыта готовой продукции): \_\_\_\_\_  
(наименование организаций, предприятий,

\_\_\_\_\_ ф., и., о. бригадиров)

бригады водителей автотранспорта: \_\_\_\_\_  
(наименование предприятий,

\_\_\_\_\_ автоколонн, ф., и., о. бригадиров)

бригады поточных участков строительно-монтажных организаций: \_\_\_\_\_  
(наименование строительно-монтажных организаций, наименование

\_\_\_\_\_ или номера участков (потоков)

\_\_\_\_\_ наименование бригад. ф., и., о. бригадиров):

\_\_\_\_\_ заключили между собой на 19\_\_ г. следующий договор:

## II. Предмет договора

Бригады строительного конвейера обязуются: производить изделия и конструкции, осуществлять комплектацию, грузоперевозки, выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с директивным графиком ввода объектов в эксплуатацию, графиками поточного производства работ, квартальными производственными планами, циклограммами монтажа, графиками выпуска изделий и конструкций, суточно-часовыми графиками поставки рейсокомплектов. В этих целях:

**а) бригады технологических линий формовочных цехов:**

выпускают продукцию в заданной номенклатуре, в строгом соответствии с техническими условиями (стандартами), квартальными и месячными планами, сменными заданиями;

не допускают сверхнормативных простоев автотранспорта, простоев или снижения темпа работы комплексных бригад монтажников из-за отсутствия необходимых комплектов деталей на складе готовой продукции;

**б) бригада (бригады) отдела (управления) производственно-технологической комплектации (отдела реализации и сбыта готовой продукции):**

своевременно осуществляет вывозку готовой продукции бригад технологических линий формования из цехов на склады готовой продукции, незамедлительно освобождает транспортные средства (вагоны и т. п.) цехов;

строго соблюдает правила складирования железобетонных изделий и конструкций, не допускают их повреждений при погрузочно-разгрузочных работах;

загружает автотранспортные средства в соответствии с суточночасовым графиком поставки рейсокомплектов;

не допускает сверхнормативных простоев автотранспортных средств на складах готовой продукции;

**в) бригада (бригады) водителей автотранспорта:**

осуществляет вывозку сборных конструкций на строительные площадки по графику поставки рейсокомплектов;

обеспечивает сохранность сборных конструкций во время транспортировки;

не допускает простоев или снижения темпа работы комплексных бригад монтажников конструкций из-за несвоевременной доставки рейсокомплектов на стройку;

**г) комплексные бригады монтажников:**

ведут монтаж конструкций в соответствии с месячными циклограммами монтажа;

обеспечивают смежным бригадам фронт работ в соответствии с графиками поточного выполнения работ;

вовремя освобождают транспортные средства, не допускают их сверхнормативного простоя под разгрузкой;

обеспечивают сохранность обменных полуприцепов на строительной площадке;

содержат подъездные пути, разворотные площадки и стоянки полуприцепов в состоянии, пригодном для нормальной работы автотранспорта;

**д) все бригады строительных потоков (поточных участков):**

выполняют работы на объектах и предоставляют фронт работ смежникам в сроки, предусмотренные графиками поточного производства работ и графиками движения бригад по объектам;

обеспечивают выполнение квартальных и годового планов ввода объектов в действие в соответствии с директивным графиком.

### III. Санкции

1. В случаях невыполнения бригадой (бригадами) обязательств перед бригадами-смежниками по настоящему договору бригады и представители администрации организаций (предприятий) составляют акт. Причины невыполнения и меры по их устранению обсуждаются на советах бригадиров и собраниях коллективов. Совет бригадиров в необходимых случаях представляет руководству и комитету профсоюза организации (предприятия) предложение об уменьшении или лишении премий виновной бригаде за соответствующий период.

2. Убытки, непроизводительные расходы и потери бригад, вызванные несоблюдением условий настоящего договора, допущенным бригадами-смежниками, компенсируются этими бригадами (относятся на их фактические затраты) на основании актов сторон и решений руководителей организаций (предприятий).

3.

---

---

---

---

---

### IV. Оформление договора

1. Договор составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах по одному для каждой бригады (группы бригад потока, технологической линии), администрации каждой организации) и совета бригадиров.

2. Договор подписывают бригадиры (по их поручению — председатели советов бригадиров потока, участка, технологической линии, цеха), председатель объединенного совета бригадиров и согласовывают руководители соответствующих организаций и предприятий.

3. К договору прилагаются согласованные и утвержденные:

1) директивный график ввода в действие объектов строительства;  
2) графики проточного производства работ и графики движения бригад по объектам;

3) планы-графики выпуска продукции, комплектации, грузоперевозок;

4) выписки из Особых условий договоров и из протоколов предприятий (организаций).

Бригады строительных потоков:

---

(председатель объединенного совета бригадиров)

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Бригада (бригады) водителей автотранспорта:**

_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Бригада (бригады) комплектации железобетоном:**

_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Бригады технологических линий формовочных цехов:**

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

\_\_\_\_\_  
(организация,  
предприятие)

\_\_\_\_\_  
(участок, цех)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, и., о.  
подпись бригадира)

**Источники премирования бригад  
 строительного конвейера за экономию, сохранность  
 сборных конструкций и ввод  
 в действие объектов строительства**

Виды премирования	Производство		Комплектация					Транспорт	Стройплощадка
	бригады цехов		Бригады отделов реализации и сбыта готовой продукции, Стройматериалов, Комплектующих, Канализационных объектов					Бригады автотранспортных организаций (предприятий) строительства и других отраслей	Бригады участков (потоков) строительно-монтажных организаций
	Производство строительных материалов, железобетонных изделий и конструкций	Производство и монтаж сборных железобетонных конструкций, стальных конструкций, металлических изделий	Производство, доставка, монтаж, установка, ремонт изделий сборных железобетонных конструкций	Производство, доставка, монтаж, установка, ремонт изделий стальных конструкций	Производство, доставка, монтаж, установка, ремонт изделий металлических конструкций	Производство, доставка, монтаж, установка, ремонт изделий железобетонных конструкций	Производство, доставка, монтаж, установка, ремонт изделий железобетонных конструкций	Производство, доставка, монтаж, установка, ремонт изделий железобетонных конструкций	Производство, доставка, монтаж, установка, ремонт изделий железобетонных конструкций
1. За экономию (снижение затрат по сравнению с расчетной стоимостью поочередных бригад работ без учета производства)	●	●	●	●	●	●	●	●	
2. За сохранность сборных конструкций			●	●	●	●	●	●	
3. За ввод в действие объектов строительства (за выполнение строительного плана ввода в действие объектов строительства жилых домов)	●	●	●	●	●	●	●	●	

- — за счет экономии, в соответствии с действующими Положениями
- ⊙ — " " " " , в порядке эксперимента
- ⊙ — за счет средств заказчика капитального строительства, в соответствии с действующим Положением
- ⊙ — из фонда материального поощрения, в порядке опыта

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Предисловие . . . . .	3
1. Общая часть . . . . .	4
2. Организационно-технологические основы . . . . .	5
3. Порядок перевода бригад на подряд и хозрасчетные взаимоотношения . . . . .	10
4. Материальное стимулирование . . . . .	16
5. Советы бригадиров и социалистическое соревнование . . . . .	17
<i>Приложение 1.</i> Этапы разработки и согласования графиков движения хозрасчетных бригад по объектам строительства . . . . .	20
<i>Приложение 2.</i> План отгрузки железобетонных изделий . . . . .	20
<i>Приложение 3.</i> План производства железобетонных изделий	22
<i>Приложение 4.</i> План выпуска железобетонных изделий хозрасчетной бригадой технологической линии . . . . .	23
<i>Приложение 5.</i> Номенклатурный план выпуска железобетонных изделий хозрасчетной бригадой технологической линии . . . . .	24
<i>Приложение 6.</i> Фрагмент циклограммы монтажа . . . . .	25
<i>Приложение 7.</i> Номенклатурный план выпуска железобетонных изделий формовочным цехом . . . . .	26
<i>Приложение 8.</i> График выпуска железобетонных изделий бригадами технологических линий формовочного цеха . . . . .	27
<i>Приложение 9.</i> Суточно-часовой график поставки рейсокомплектов железобетонных изделий . . . . .	28
<i>Приложение 10.</i> Книга остатков железобетонных изделий на складе готовой продукции . . . . .	28
<i>Приложение 11.</i> План-заявка на перевозку железобетонных изделий . . . . .	29
<i>Приложение 12.</i> План перевозок железобетонных изделий бригадой водителей . . . . .	30
<i>Приложение 13.</i> Комплексный договор бригад строительного конвейера: завод — транспорт — стройка . . . . .	32
<i>Приложение 14.</i> Источники премирования бригад строительного конвейера за экономию, сохранность сборных конструкций и ввод в действие объектов строительства . . . . .	37

**ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР**  
**РУКОВОДСТВО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ**  
**БРИГАДНОГО ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬНОМ КОНВЕЙЕРЕ:**  
**ЗАВОД — ТРАНСПОРТ — СТРОЙКА**

Редакция инструктивно-нормативной литературы  
Зав. редакцией Г. А. Жйгачева  
Редактор Е. А. Волкова  
Мл. редактор Л. М. Климова  
Технический редактор М. В. Павлова  
Корректор Т. М. Бочагова  
Н/К

---

Сдано в набор 08.06.81. Подписано в печать 04.02.82. Т-03161. Формат 84×108<sup>1/32</sup>.  
Бумага тип. № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л.  
2,1. Усл. кр.-отт. 2,31. Уч.-изд. л. 2,25. Тираж 48 000 экз. Изд. № XII-9525.  
Заказ № 801. Цена 10 коп.

---

Стройиздат  
101442, Москва, Каляевская, 23а

Владимирская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном  
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли  
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7
