

КТ-19.0-1.11-68	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ	Разработана трестом "Ленинградоргстрой"*) Главменинградстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Укладка лаг под дощатые полы	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комплект карт ККТ-19.0		Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при укладке готовых лаг из брусков под чистые дощатые полы жилых домов.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м ² полов	127	65
Затраты труда на 100 м ² полов, чел-час	6,27	12,3

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнитель – плотник III разряда.

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Топор для рубки древесноволокнистых подкладок при выравнивании лаг	ГОСТ 1399-56	1
Метр складной стальной	ГОСТ 7253-54	1
Рейка контрольная длиной 2,8 м	–	1
Ведро для антисептического раствора	–	1
Кисть маховая для антисептирования	ГОСТ 10597-65	1
Уровень для проверки горизонтальности лаг	ГОСТ 9416-67	1
Шаблон деревянный размером 1020(1040)x30x30 мм для разметки плоскости основания	–	1

*) Ленинград, Набережная реки Мойки, 122.

КТ-19.0-1.11-68

Ш. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА


3.1. До начала работ по укладке лаг необходимо: осветить рабочее место; за-делать цементным раствором все отверстия в перекрытиях; установить в проектное положение и закрепить стояки центрального отопления; сделать под лаги выравниваю-щий или звукоизоляционный слой из песка, шлака или других материалов согласно проекту; проложить и заделать цементным раствором провода скрытой электропровод-ки для предохранения их от механических повреждений; вынести на стены отметки чистого пола; доставить на объект и подать на рабочее место необходимое коли-чество покрытых антисептиком готовых лаг и древесноволокнистых плит для подкла-док под лаги.

3.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по укладке лаг выполняют в следующем порядке: подносят, анти-септируют и укладывают подкладки под лаги, а затем маячные лаги; выверяют их с помощью контрольной рейки и уровня; укладывают и выверяют с помощью конт-рольной рейки и уровня промежуточные лаги; расшивают все лаги досками.

4.2. Схема организации рабочего места

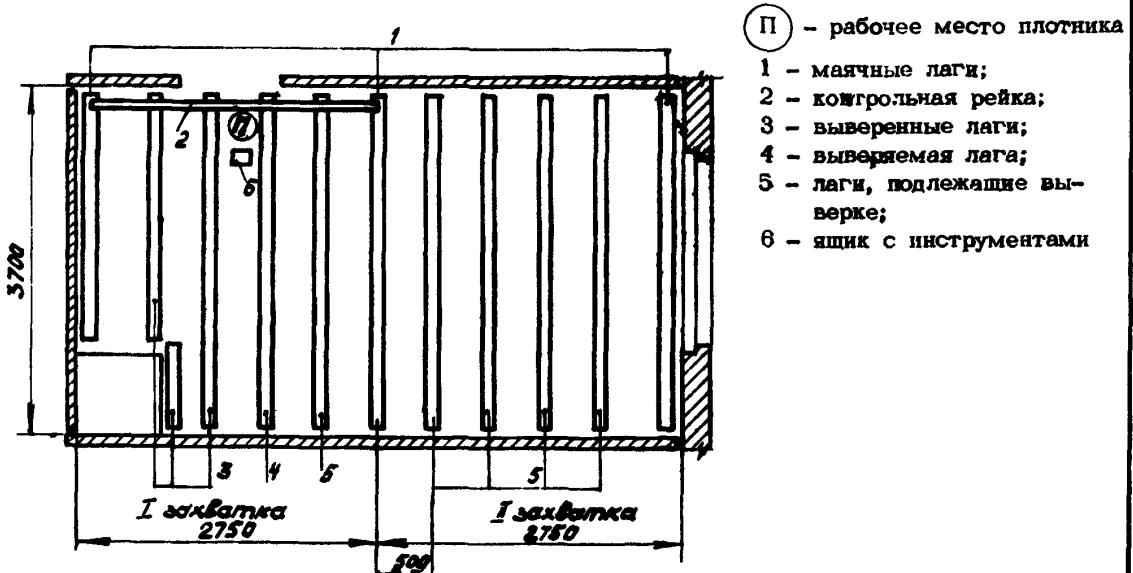4.3. Затраты труда на комнату площадью 20 м²

№ п/п	Наименование операций	Продолжи- тельность, мин	Затраты труда на комнату, чел.-мин
1	Подноска и раскладка древесно-волокнистых подкладок под лагу	0,5	На 11 лаг - 5,5
2	Подноска и раскладка лаг	2	На 11 лаг - 22
3	Выверка и выравнивание маячных лаг	6	На 3 лаги - 18
4	Выверка и выравнивание рядовых промежуточных лаг у одной из продольных стен	5	На 2 захват- ки - 10

КТ-19.0-1.11-68

Продолжение

№ п/п	Наименование операций	Продолжи- тельность, мин	Затраты труда на комнату, чел -мин
5	Выверка и выравнивание рядовых промежуточных лаг по середине комнаты	5	На 2 захватки - 10
6	То же, у другой продольной стены	5	На 2 захватки - 10
		Итого	75,5

Примечание. В затраты труда включено время на отдых и подготовительно-заключительные работы.

У. ПРИЕМЫ ТРУДА



№ по таб- лице	Наименование операций, их продолжительность и орудия труда	Характеристика приемов труда
1	Подноска и раскладка др- весноволокнистых подкладок под лагу; 0,5 мин.; ведро с антисептиком, кисть	Плотник подносит, антисептирует и расклады- вает подкладки под лагу
2	Подноска и раскладка лаг; 2 мин.	
3	Выверка и выравнивание маячных лаг; 6 мин; топор, рейка, уровень, шаблон	<p>Плотник подносит лагу и укладывает ее на место согласно проекту</p> 
		<p>Плотник, уложив все лаги, выверяет и вырав- нивает две крайние и одну среднюю маячные лаги. Работу он выполняет с помощью контроль- ной рейки, уровня и шаблона по вымечен- ным на стены отметкам чистого пола</p>

КТ-19.0-1.11-68

Продолжение

№ по таб- лице	Наименование операций, их продолжительность и орудия труда	Характеристика приемов труда
----------------------	--	------------------------------

4 - 6 Выверка и выравнивание промежуточных лаг у продольных стен и по середине комнаты;
15 мин.;
топор, рейка, уровень, шаблон



Плотник, выверив маячные лаги, выверяет и выравнивает промежуточные. При необходимости он увеличивает или уменьшает толщину подкладок, а также с помощью шаблона проверяет расстояние между лагами. Убедившись в правильности укладки лаг, плотник временно расшивает их досками для предохранения от смещения

Подготовлена сектором нормативной и проектной документации

и отделом научно-технической информации

ВНИИПИ труда в строительстве

107078, Москва, Б-78, ул. Ново-Басманская, 23. Тел. 261-18-14

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 9 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28
