

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-84.13.91

Гараж на 10 грузовых автомобилей
с открытой стоянкой
Стены панельные
(для строительства в Западно-Сибирской
зоне РСФСР)

А Л Б О М I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СТП 1639/
101

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-84.13.91

Гараж на 10 грузовых автомобилей
с открытой стоянкой
Стены панельные
(Для строительства в Западно-
Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАЗРАБОТАН
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским облисполкомом
Протокол от 20.05.91 № 5

Главный инженер филиала
Главный инженер проекта



Я.И.Вильбергер
В.Ф.Бетехтин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ раздела	Наименование	Стр.
I	Общая часть	3
2	Технико-экономическая часть	8
3	Технология производства	20
4	Электротехническая часть, автоматизация, связь и сигнализация	30
5	Архитектурно-строительные решения	34
6	Теплоснабжение, отопление и вентиляция	38
7	Внутренние водопровод и канализация	43
8	Мероприятия по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха от загрязнений неочищенными сточными водами и промышлен- ными выбросами	46
9	Сводный сметный расчет стоимости строительства	52
IO	Рекомендации по организации строительства	54
II	Схема генерального плана	67

Имя, № подл.	Подпис. и дата	Взам. инв. №					Привязан		
		Имя, №	ТИП	Бетехтин	<i>Бетехтин</i>				
			Рук. бр.	Сидорова	<i>Сидорова</i>				
			Н. контр.	Сидорова	<i>Сидорова</i>				
						503-I-84. I3.9I		ПЗ	
						Пояснительная записка			
							Стадия	Лист	Листов
							РП	I	66
							ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Зональный типовый проект гаража на 10 грузовых автомобилей с открытой стоянкой разработан в соответствии с программой работ по разработке типовых проектов для включения в зональный каталог "Автомобильный транспорт" на 1990-1991г.г. на основании задания, утвержденного Новосибирским облисполкомом ЗI.01.90.

Проект разработан для зоны Сибири со следующими данными:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 40°C ;
- нормативное значение ветрового давления - 38 кгс/м^2 ;
- нормативное значение веса снегового покрова - 150 кгс/м^2 ;
- сейсмичность не выше 6 баллов;
- грунты в основании фундаментов естественной влажности, непучинистые, непросадочные, с нормативными характеристиками: $\text{C}^H=0,02 \text{ кгс/см}^2$; $\gamma=1,8 \text{ т/м}^3$; $\text{E}^H=150 \text{ кгс/м}^2$; $\varphi^H=28^{\circ}$.

Термическое сопротивление ограждающих конструкций

Таблица I.1.

Характеристика ограждающих конструкций	Значение термического сопротивления $\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$
Наружные стены из перлитобетонных панелей толщиной 400 мм , $\gamma=1260 \text{ кг/м}^3$	1,067
Покрытие из железобетонных комплексных плит толщиной 300 мм с утеплителем из фольгированного пенопласта $\gamma=76 \text{ кг/м}^3$, толщиной 80 мм	2,221

Иван. 12 год
Подп. и дата
Зав. н.п. №

Привязан			
Инв. №			Лист
503-I-84.13.9I			2

Гараж предназначен для выполнения транспортной работы, хранения, ежедневного и технического обслуживания и текущего ремонта грузовых автомобилей в составе предприятия.

Планировочные решения и расчет производственной программы выполнены для грузовых автомобилей ЗИЛ-431410 и КамАЗ-5320.

Заправка автомобилей топливом на территории гаража не предусматривается.

Бытовое обслуживание работающих предусматривается в служебно-бытовых помещениях гаража.

1.1. Использование в проекте достижений науки и техники

Основные технологические решения проекта учитывают реализацию научно-технических достижений, прогрессивные формы и методы организации производственных процессов, применение нового оборудования.

В проекте гаража применены следующие прогрессивные решения:

В технологии производства обслуживания и ремонта автомобилей:

- пост обслуживания автомобилей запроектирован на подъемнике, что значительно улучшает организационные условия работы слесарей-авторемонтников на постовых работах;

- предусмотрено выполнение работ ежедневного обслуживания (ЕО) на специализированном посту с повторным использованием воды после мойки автомобилей;

- применено современное и прогрессивное технологическое обслуживание: подъемник-комплект передвижных стоек П-238, моечная установка М-217, компрессор С-412.

В сантехнической части проекта:

- применение воздухопроводов из унифицированных деталей;

- применение радиальных вентиляторов с промежуточными диаметрами колес;

Привязан

Инв. №

503-1-84.13.91

ПЗ

Лист

3

- применение агрегата пылеулавливающего типа ПА-212М и воздухораспределителей ВЭШ, полимерных труб для систем производственной канализации.

В электротехнической части проекта:

- серийные шкафы типа ШР-II с предохранителями вместо шкафов с автоматическими переключателями;
- беструбная прокладка проводов и кабелей;
- прокладка проводов в виниловых трубах вместо металлических;
- применение в качестве электродов заземления арматуры колонн и железобетонных фундаментов.

В архитектурно-строительной части проекта:

- стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий по серии I.030.I-I;
- сборные колонны прямоугольного сечения производственных зданий по серии I.423.I-3 и I.427.I-3;
- гипсокартонные перегородки.

I.2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

В соответствии с правилами техники безопасности для предотвращения повреждения автомобилей и конструкций здания гаража при приближении автомобилей к стенам и колонна в помещении закрытой стоянки вдоль стен предусмотрены колесоотбойные барьеры, согласно ВСНОI-89.

Во-избежание отрицательного воздействия на организм человека вредных веществ, выделяемых работающими автомобилями и частью технологического оборудования, в проекте предусмотрены: общеобменная вентиляция во всех помещениях, местные отсосы на участке ТО и ТР и в помещении мастерской, шланговый отсос выхлопных газов на посту ТО и ТР автомобилей.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

503-I-84.13.9I	ПЗ	Лист
		4

Для обеспечения безопасности при накачке снятых с автомобилей колес на участке Т0 и ТР предусмотрена предохранительная клеть.

Для обеспечения выполнения работ "снизу" автомобиля предусмотрен подъемник, в комплект которого входят страхующие подставки. Для снятия, транспортировки и установки на автомобиль отдельных узлов и агрегатов в проект заложены таль электрическая и тележки.

В целях обеспечения электробезопасности работающих предусматривается:

- заземление электроустановок и всех металлических частей, которые могут оказаться под напряжением;
- защита от токов короткого замыкания и от статического электричества;
- молниезащита;
- применение электрооборудования, кабелей и проводов в зависимости от классификации помещений по ПУЭ.

Для сохранения температурного режима в зоне ворот на посту мойки и на участке Т0 и ТР предусмотрены воздушно-тепловые завесы.

Для мытья рук после работ по зарядке аккумуляторных батарей в помещении мастерской предусмотрена раковина.

1.3. Мероприятия по обеспечению взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности

Противовзрывные, противовзрывопожарные и противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с требованиями ОНТП-01-86

Минавтотранс РСФСР,

СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85 и приказом Минавтотранса РСФСР от 20.12.84, МУ200-РСФСР-13-0199-87 и предусматривают:

- выполнение во взрывозащищенном исполнении и размещение снаружи здания вентиляционного оборудования систем местной вентиляции, удаляющей от технологического оборудования взрыво- и взрывопожароопасные смеси;

Привязан			
Инв. №			

503-И-84.13.91	ПЗ	Лист 5
----------------	----	-----------

- заземление воздухопроводов и вентиляционного оборудования этих систем;
- отключение всех вентиляционных систем на случай пожара;
- наружное пожаротушение от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевом внутриплощадочном водопроводе (расход 15 л/сек);
- внутреннее пожаротушение - из пожарных кранов диаметром 50мм (2 струи по 2,5 л/сек каждая).

1.4. Мероприятия по шумоглушению

Для борьбы с аэродинамическим и механическим шумом отопительно-вентиляционных установок предусмотрены следующие мероприятия:

- приточные установки размещаются в выгороженных вентиляционных камерах, облицованных с внутренней стороны звукопоглощающим материалом;
- вытяжные установки размещаются на кровле;
- двери по периметру уплотняются;
- всасывающие и напорные воздухопроводы присоединяются к вентилятору с помощью гибких вставок;
- расчетные скорости движения воздуха по воздухопроводам приняты в соответствии с требованиями "Указаний по расчету вентиляционных воздухопроводов";
- окружные скорости вращения вентиляторов ограничены - не более 50 м/сек;
- все вентиляторы устанавливаются на виброоснованиях.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

503-I-84. I3.9I	ПЗ	Лист
		6

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Исходные данные

В основу определения технико-экономических показателей типового проекта положены:

- расчетные материалы технологического, сантехнического, архитектурно-строительного и сметного разделов проекта;
- действующие нормативно-технические материалы.

2.2. Производственная программа

Производственная программа проектируемого гаража определена на основании задания на проектирование, технологической части проекта и представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Начало

Показатели	Числовое значение
I	2
Списочное количество подвижного состава, всего, ед.	10
в том числе: ЗИЛ-431410	5
КамАЗ-5320	5
Коэффициент технической готовности	0,93
Продолжительность работы подвижного состава в году, дней	305
Грузоподъемность единицы подвижного состава, т	
ЗИЛ-431410	6
КамАЗ-5320	8
Среднесуточный пробег единицы подвижного состава, км	150
Средняя продолжительность работы одного автомобиля в сутки, час	8

Привязан			
Инв. №			

503-I-84.13.9I

ПЗ

Лист

7

Таблица 2.1. Продолжение

I	2
Часы работы автомобилей за год, тыс.час	22,7
Общий пробег за год, тыс.км	425,5

2.3. Расчет эксплуатационных затрат

В состав эксплуатационных затрат включены следующие статьи:

- зарплата работающих с начислениями;
- затраты на ТО и ТР автомобилей;
- затраты на топливо для автомобилей;
- затраты на смазочные и эксплуатационные материалы;
- затраты на восстановление износа и ремонт автошин;
- затраты на энергоресурсы (вода, тепло, электроэнергия);
- амортизационные отчисления;
- прочие расходы.

Численность работающих принята согласно технологической части проекта.

Годовой фонд заработной платы работающих рассчитан по тарифным ставкам и должностным окладам в соответствии с приказом I3I Минавтогранса РСФСР от 26.II.86.

Ежегодные отчисления в фонд социального страхования приняты в размере 6,9% годового фонда зарплаты и составляют 3,2 тыс.руб.

Численность работающих и годового фонд заработной платы по категориям приведены в табл. 2.2.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

503-I-84. I3.9I

ПЗ

Лист
8

Таблица 2.2.

Категории персонала	Количество, чел	Годовой фонд заработной платы, тыс. руб	Среднемесячная з/плата одного работающего, руб
Эксплуатационный персонал	11	32,4	245,5
Производственные рабочие	3	7,9	220
Вспомогательные рабочие	1	2,0	165
ПСО	4	4,3	90
Всего:	19	46,6	204

Затраты на запасные части и материалы по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава рассчитаны по нормам затрат на ТО и ТР автомобилей, утвержденным 30.05.84 № 60-ц.

Заработная плата производственных рабочих, занятых на техобслуживании и текущем ремонте подвижного состава, принята по данным табл. 2.2.

В табл. 2.3 приведены затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава по элементам, направления затрат и в целом.

Таблица 2.3 (тыс.руб)

Наименование элементов и затрат	На техническое обслуживание	На текущий ремонт	Всего
1. Заработная плата производственных рабочих с начислениями	3,9	4,5	8,4
2. Материалы	1,3	2,0	3,3
3. Запасные части	-	3,5	3,5
Всего затрат	5,2	10	15,2

Приказ			
Изм. №			
503-1-84.13.91			Лист
ПЗ			9

Затраты на топливо для автомобилей определены на пробег и транспортную работу согласно линейным нормам расхода топлива, утвержденным постановлением Госплана СССР от 16.01.89 № КМ-2/4-9 и прейскуранту № 04-02.

Расход смазочных и эксплуатационных материалов принят в размере 5% от стоимости топлива.

Затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин определены по нормам отчислений согласно письму Министерства финансов СССР от 14.03.79 № 38-ц и прейскуранту № 05-14.

В затратах на энергоресурсы учтены затраты на водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение. Стоимость единицы расходуемых энергоресурсов принята по прейскуранту № 09-01, годовые расходы - из соответствующих разделов проекта. Расчет стоимости энергоресурсов приведен в табл. 2.4.

Таблица 2.4.

Наименование энергоресурсов	Количество	Сумма, тыс.руб.
Электроэнергия, тыс.квт.час	98,69	2,8
Тепло, Гкал	732,6	5,9
Вода, м ³	736	7,4
Всего		16,1

Амортизационные отчисления на капитальный ремонт и полное восстановление подвижного состава, зданий, сооружений и оборудования определены по "Нормам амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР".

Прочие расходы приняты в размере 10% от суммы заработной платы работающим.

Привязан			
Инв. №			
			Лист
			10

503-1-84.13.91

ПЗ

Альбом I

В табл. 2.5. приведена сводная смета затрат на производство, а в табл. 2.6. - калькуляция себестоимости перевозок.

Таблица 2.5.

Наименование затрат	Сумма, тыс.руб.
I	2
1. Зарботная плата работающих с начислениями	49,8
2. Запасные части	3,5
3. Материалы для технического обслуживания и текущего ремонта	3,3
4. Автомобильное топливо	18,4
5. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	0,9
6. Затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин	4,7
7. Затраты на энергоресурсы (вода, тепло, электроэнергия)	16,1
8. Амортизация подвижного состава	22,0
9. Амортизация зданий, сооружений и оборудования	8,0
10. Прочие расходы	5,0
Всего затрат по смете	131,7

Привязан

Инь. №

503-I-84. I3.9I

ПЗ

Лист

II

Таблица 2.6.

Статьи затрат	Общая сумма затрат, тыс.руб	Себестоимость	
		10 авточас, руб	100 км пробега, руб
1. Зарплата водителей с начислениями	34,6	15,2	8,1
2. Автомобильное топливо	18,4	8,1	4,3
3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	0,9	0,4	0,2
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт	15,2	6,7	3,6
5. Восстановление износа и ремонт шин	4,7	2,1	1,1
6. Амортизация подвижного состава	22,0	9,7	5,2
Итого:	95,8	42,2	22,5
7. Накладные расходы	35,9	15,8	8,5
Всего	131,7	58,0	31,0

2.4. Капитальные вложения, производственные фонды

По сметным расчетам стоимость строительства гаража на 10 грузовых автомобилей с открытой стоянкой составляет 147,74 тыс.руб.

Стоимость подвижного состава определена по прейскуранту № 21-01.

Структура капитальных вложений представлена в табл. 2.7, структура и анализ основных фондов - в табл. 2.8.

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

503-I-84.13.9I

ПЗ

Лист

I2

Таблица 2.7.

Капитальные вложения и основные
производственные фонды

Наименование показателей	Стоимость, тыс.руб.
1. Капитальные вложения в строительство гаража на 10 грузовых автомобилей, всего	147,74
в том числе:	
строительно-монтажные работы	118,7
оборудование	29,04
2. Стоимость подвижного состава	103,8
3. Основные производственные фонды предприятия	251,54
4. Оборотные средства	10,4

Таблица 2.8.

Структура и анализ основных фондов

Статьи затрат	Сумма, тыс.руб	% к итогу	Сметная стоимость		
			на один автомо- биль, тыс.руб	на 1м2 общей площади руб.	на 1м3 объема зданий, руб.
Строительно-монтажные работы	118,7	80,3	11,9	272,5	37,4
Оборудование	29,04	19,7	2,9	66,7	9,1
Сметная стоимость, всего	147,74	100	14,8	339,2	46,5
Основные фонды (без подвижного состава)	147,74	-	14,8	339,2	46,5

Привязан

Инд. №

503-1-84.13.91

ПЗ

Лист
13

2.5. Технико-экономические показатели

Таблица 2.9. Начало

Показатели	По проекту	по аналогу Т1503-I-76.12.89	ТЭП и СНП	Отраслевые прогнессивные показатели	По заданию на проектирование
I	2	3	4	5	6
Списочное количество подвижного состава, всего, ед	10	10			10
в т.ч. ЗИЛ-431410	5				5
КамАЗ-5320	5				5
Годовой пробег автомобилей, тыс.км	425,5				
Часы работы за год, тыс.час	22,7				
Годовой объем работ по ТО и ТР, всего, чел.час	5397		$\frac{2199}{6491^*}$		
Количество работающих, всего, чел.	19		14/19*		
в том числе:					
- водителей	11		10		
- производственных рабочих	3		2/3*	3	
- вспомогательных рабочих	1		1		
- ПСО	4		4*		
- ИТР	-		1		
Количество рабочих постов, ед.	2		2	2	
Площадь участка, га	0,189				
Плотность застройки, %	64				
Общая площадь зданий, м ²	435,6		$\frac{1168,5}{640,5^*}$		

Привязан			
Име. №			

503-I-84.13.91

ПЗ

Лист

14

Таблица 2.9. Продолжение

I	2	3	4	5	6
Строительный объем зданий, всего, м3	3173,5	<u>6763,9</u> 3543,0*			
Площадь производственно-складских помещений, м2	291,2	432	303		
Площадь вспомогательных помещений, м2	96	182	143		
Площадь открытой стоянки, м2	245	-	410		
Установленная мощность токоприемников, квт	123,69				
Годовой расход:					
- электроэнергии, тыс. квт.час	98,69	194/98,7*			
- воды, м3	736	875			
- тепла, Гкал	732,6	2076/844*			
Трудовые затраты на строительство, тыс. чел. час	12,49	16,92			
Сметная стоимость строительства, тыс.руб., всего	147,74				
в том числе:					
- строительно-монтажные работы	118,7				
- оборудование	29,04				
Из общей стоимости стоимость строительства здания, всего, тыс.руб.	135,87	<u>173,1</u> 135,93*			
в т.ч. СМР	110,94	<u>152,7</u> 111,0*			
Эксплуатационные затраты, тыс.руб.	131,7				
Основные производственные фонды, тыс.руб.	251,54				
в том числе подвижной состав	103,8				

Привязан

Инв. №

503-1-84.13.91

ЛЗ

Лист

15

Таблица 2.9. Продолжение

	1	2	3	4	5	6
Оборотные средства, тыс. руб		10,4				
Расход основных строительных материалов:						
- цемент, приведенный к М-400, т		106,2	183,78			
- сталь, приведенная к кл.А-1 и С38/23, т		29,42	36,4			
- лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3		27,85	53,18			
<u>Удельные показатели</u>						
Коэффициент технической готовности подвижного состава, коэф.		0,93			0,89	
Уровень автоматизации и механизации производственных процессов, ТО и ТР автомобилей, %		10				10
Коэффициент сменности основного оборудования		1,0				1,0
Количество производственных рабочих на 1 млн. км. пробега, чел.		7,05		7,05		
Количество рабочих постов на 1 млн. км. пробега, ед.		4,7		4,7		
Площадь производственно-складских помещений на 1 автомобиль, м2		29,1	43,2	30,3		29,5
Площадь вспомогательных помещений на 1 автомобиль, м2		9,6	18,2	14,3		
Площадь открытой стоянки на одно место хранения, м2		30,6		51,2		

Ина. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Ина. №			

503-1-84.13.91

ПЗ

Лист
16

Таблица 2.9. Продолжение

I	2	3	4	5	6
Площадь территории на I автомобиль, м ²	189,0				
Электровооруженность I-го работающего (кроме водителей), квт	41,2				
Стоимость строительства на I автомобиль, тыс.руб.	14,8				
в том числе СМР	11,9				
Стоимость строительства здания на I автомобиль, тыс.руб.	13,59	13,59*			14,6
в том числе СМР	11,09	11,1*			12,4
Производительность труда I-го работающего, тыс.руб.	8,5			6,9	5,0
Количество обслуживаемых автомобилей на I производственного рабочего, ед.	3,3	3,3			3,3
Трудоемкость строительства, чел.час					
- на I автомобиль	1249	1692			1450
на I млн.руб. СМР	112583	152432*			
Расход основных строительных материалов:					
а) на I автомобиль					
- цемент М 400, т	10,6	18,4			15,0
- сталь, кл.А1 и С38/23, т	2,94	3,6			7,3
- лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м ³	2,8	5,3			3,8
б) на I млн.руб. СМР					
- цемент М 400, т	957,3	1203,5			
- сталь, кл.А1 и С38/23, т	265,3	238,4			

Привязан

Инв. №

503-I-84.13.91

ПЗ

Лист
17

Альбом I

Таблица 2.9. Окончание

I	2	3	4	5	6
- лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3	251,0	348,3			

Примечания:

1. ж - показатели приведены в сопоставимый вид.
2. Учитывая, что гараж не является самостоятельной хозрасчетной единицей и его работа предусматривается в составе предприятия нетранспортного назначения, показатели доходов, экономической эффективности не определяются.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязки			
Инд. №			
503-I-84.13.9I			Лист
ПЗ			18

Копировал

Формат А4

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

При разработке проекта использованы следующие нормативные и руководящие документы:

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Минавтотранс РСФСР, 1986;
- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-86 ;
Минавтотранс РСФСР ;
- Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей ВСН 01-89 ;
Минавтотранс РСФСР
- Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ. Минавтотранс РСФСР, 1989г. ;

3.1. Основные положения

Планировочные решения и расчет производственной программы выполнены для грузовых автомобилей ЗИЛ-431410 - 5 ед. и КамАЗ-5320 - 5 ед.

В гараже производятся следующие работы: ЕО, ТО-I, ТО-2 и текущий ремонт автомобилей на базе готовых узлов и агрегатов, отремонтированных на специализированных предприятиях, а так же шиномонтажные работы и зарядка аккумуляторных батарей.

Выполнение работ по ремонту аккумуляторных батарей, станочных, кузнечно-рессорных, столярных, обойных и окрасочных работ предусмотрено по кооперации на базовых предприятиях.

В состав гаража входит производственное здание с закрытой стоянкой и встроенными служебно-бытовыми помещениями, а также очистные сооружения оборотного водоснабжения.

Привязан			
Инв. №			
503-I-84.13.91			Лист
ПЗ			19

В производственной части здания расположены: пост мойки, участок Ю и ТР, кладовая, мастерская, бытовые и служебные помещения. В проекте предусмотрена возможность выполнения сварочных работ на отдельном посту снаружи здания на территории гаража.

3.2. Режим работы предприятия

Работа автомобилей на линии - 305 дней в году и временем пребывания автомобилей в наряде - 8,0 ч. в сутки, со среднесуточным пробегом 150 км. Категория условий эксплуатации - П.

Производство обслуживания и ремонта подвижного состава - 257 дней в году в одну смену.

3.3. Производственная программа

Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава рассчитана по коэффициенту простоя (табл. 3.1). Нормативы межремонтного пробега, периодичности и трудоемкости воздействий приняты по ОНТП-ОИ-86 и откорректированы с учетом категории условий эксплуатации, количества и типа подвижного состава, холодного климатического района (зона Сибири).

Производственная программа

Таблица 3.1
(Начало)

Показатели	По маркам подвижного состава			Всего
	ЗИЛ-4314	КамАЗ-5320		
I	2	3	4	
I. Списочный парк, ед.	5	5		10
2. Продолжительность работы подвижного состава в году, дней	305	305		

Привязки			
Инд. №			

503-I-84.13.91	ПЗ	Лист 20
----------------	----	------------

Таблица 3.1.
(Продолжение)

I	2	3	4
3. Среднесуточный пробег единицы подвижного состава, км	150	150	
4. Коэффициент корректировки периодичности:			
- капитального ремонта - КР	К1	0,9	0,9
	К2	-	-
	К3	0,8	0,8
результрующий	К _п ^к	0,72	0,72
- Технического обслуживания - ТО	К1	0,9	0,9
	К3	0,9	0,9
результрующий	К _п ^{то}	0,81	0,81
5. Периодичность воздействий, км			
- КР	216000	216000	
- ТО-2	12960	12960	
- ТО-1	3240	3240	
- Ежедневного обслуживания ЕО	150	150	
6. Коэффициенты корректировки трудоемкости:			
- ТО	К2	-	-
	К4	1,35	1,35
результрующий	К _{то}	1,35	1,35
- ТР	К1	1,1	1,1
	К2	-	-
	К3	1,2	1,2
	К4	1,35	1,35
	К5	1	1
результрующий	К _{тр}	1,78	1,78
Привязан			
Инв. №			
503-1-84.13.91			ПС
			Лист 21

Альбом I

Таблица 3. I.
(Продолжение)

I	2	3	4
7. Трудоемкость воздействий, чел. ч.			
- ТО-2	19,4	21,6	
- ТО-I	4,86	5,4	
- ЕО	0,35	0,47	
- ТР на 1000 км. пробега	0,55	9,8	
8. Коэффициент технической готовности	0,88	0,88	
9. Годовой пробег подвижного состава, тыс. км	212,75	212,75	415,5
10. Годовое количество воздействий:			
- КР	I	I	
- ТО-2	18	18	
- ТО-I	55	55	
- ЕО	1418	1418	
II. Суточное количество воздействий			
- ТО-2	0,07	0,07	0,14
- ТО-I	0,21	0,21	0,42
- ЕО	5	5	10
- ТР	I	I	2
12. Годовой объем работ по ТО и ТР, чел. ч.			
- ТО-2	350	390	740
- ТО-I	267	297	564
- ЕО	567	666	1233
- ТР	1319	2085	3404
Всего	2503	3438	5941

Привязан

Инд. №

503-I-84.13.91

ПЗ

Лист

22

Таблица 3. I.
(Окончание)

I	2	3	4
I3. Годовой объем работ по ТО и ТР, выполняемый в проектируемом предприятии, чел. ч.			
- ТО-2	350	390	740
- ТО-I	267	297	564
- ЕО	567	666	1233
- ТР	1205	1655	2860
Всего	2389	3008	5397
I4. Эффективный годовой фонд времени, ч			1840
I5. Количество производственных рабочих, чел.			3

3.4. Рабочие посты и места хранения подвижного состава

Для выполнения уборочно-моечных работ предусмотрен пост мойки автомобилей, оснащенный шланговой моечной установкой.

Для обслуживания и ремонта автомобилей проектом предусмотрен специализированный пост, оборудованный подъемником и талью электрической.

Работа на посту ТО и ТР выполняется в I смену, на посту мойки по возвращению подвижного состава с линии.

Заправка автомобилей топливом осуществляется на автозаправочных станциях общего пользования.

Хранение автомобилей предусмотрено на открытой площадке на 8 машино-мест, при этом в проекте рекомендуется использование

Привязан			
Имп. №			

503-I-84.13.9I

I3

Лист
23

электроподогрева двигателей для обеспечения их запуска в холодный период года. Кроме того, используются для хранения посты мойки и обслуживания автомобилей по мере окончания работ на этих постах.

3.5. Штаты предприятия

Количество производственных рабочих согласно расчетам составляет 3 чел..

Учитывая специфику и условия работы филиала, а так же необходимость надзора и поддержки в технически исправном состоянии здания и инженерного оборудования, количество вспомогательных рабочих в гараже принято минимально-необходимое, т.е. 1 человек.

Численность водителей определена по количеству автомобилей, режиму их работы и составляет 1 чел.

Управление гаражом в соответствии с "Нормативами численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных предприятий, ЦЭНТ, М. 1988" осуществляется неосвобожденным бригадиром.

Таблица 3.2

Сводная штатная ведомость

Категория рабочих	Всего, в т.ч. по сменам			Группа произв. процессов
	чел.	I	II	
Производственные рабочие:				
- слесарь-авторемонтник	2	2		Iв
- слесарь-мойщик автомобилей	I	I		2в
Вспомогательные рабочие	I	I		3б
Водители	II*	9		Iб
Пожарно-сторожевая охрана	4*	I	I	Iа
Всего	19*	14	I	I

* включая подсменных

Привязан			
Инв. №			

503-I-84.13.9I

ПЗ

Лист

24

3.6. Специализация и кооперация производства

В соответствии с производственным назначением гараж специализирован на выполнении следующих работ:

- выполнение работ ЕО, включающего производство уборочно-моечных работ;
- организации межсменного хранения подвижного состава;
- производство в плановом порядке работ ТО-I и ТО-2 автомобилей;
- выполнение постовых работ ТР.

Для обеспечения нормальной производственной и хозяйственной деятельности гаража проектом предусматривается его кооперация через базовое предприятие со следующими промышленными предприятиями и региональными производствами:

- с автотранспортным предприятием, где могут производиться окрасочные, кузнечно-рессорные, слесарно-механические, агрегатные и другие работы;
- с центральными складами оборотных агрегатов, узлов, деталей и материалов в части организации материально-технического снабжения;
- с предприятиями системы вторчермета, использующими в своем производстве металлолом и другие отходы проектируемого предприятия.

3.7. Краткое описание производственного процесса ТО и ремонта автомобилей

При выезде на линию водители на местах хранения проверяют наличия воды, топлива и масла в автомобиле и получают путевые документы у бригадира.

Все водители работают на самоконтроле.

По возвращению с линии автомобилей водители сдают путевые документы бригадиру, а подвижной состав подвергается мойке и устанавливается на места хранения.

Привязан			
Инв. №			

503-I-84. I3.9I

ПЗ

Лист

25

Альбом I

Автомобили, которые по графику должны пройти ТО-I или ТО-2, а так же нуждающиеся в ремонте после мойки устанавливаются на пост обслуживания в участках ТО и ТР.

Технологическое и подъемно-транспортное оборудование гаража. позволяет:

- выполнять операции ежедневного обслуживания;
- проверять техническое состояние систем питания и электрооборудования с помощью переносных приборов;
- выполнять контрольно-регулирующие и смазочные работы;
- производить монтаж и демонтаж колес, подкачку шин, замену отдельных деталей, узлов и агрегатов, выполнение операций текущего ремонта.

Пост мойки оснащен шланговой моечной установкой для струйной мойки и щеткой для домыва автомобилей. В холодный период года мойка автомобилей производится подогретой водой.

Пост обслуживания и ремонта автомобилей оснащен подъемником-комплексом передвижных стоек для проведения работ "снизу" автомобиля и электрической талью для снятия, транспортировки и установки на автомобиль отдельных узлов и агрегатов, а также гайковертом и тележкой для замены колес. В участке ТО и ТР предусмотрены стенд для перемонтажа колес и вулканизатор для ремонта камер, проверка камер предусмотрена мыльным раствором.

Смазочные работы выполняются передвижными средствами.

Ремонт снятых с автомобилей узлов и деталей производится в помещении мастерской, оснащенной необходимым оборудованием, где так же производится и подзарядка аккумуляторных батарей в специальном шкафу.

Для хранения запасных частей и узлов установленной номенклатуры предусмотрено помещение кладовой.

Для обеспечения производства сжатым воздухом проектом предусмотрена разводка сети сжатого воздуха с питанием от компрессора.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Примечан			
Изм. №			

503-I-84.13.91	ПЗ	Лист 26
----------------	----	------------

3.8. Механизация производства

Для повышения производительности труда и улучшения условий труда проектом предусматривается механизация и автоматизация ряда производственных процессов:

- для мойки автомобилей применяется шланговая моечная установка высокого давления;
- применены приборы для инструментального контроля (диагностирования) технического состояния без разборки агрегатов, узлов и систем автомобилей;
- механизировано выполнение постовых работ ТО и ТР применением подъемника, электрической тали, гайковертов и тележек;
- автоматизировано управление зарядкой аккумуляторов и компрессорной установки;
- автоматизировано управление воздушно-тепловыми завесами на воротах и зависит от режима открывания ворот и температуры воздуха в зоне ворот.

Ожидаемый в результате применения вышеперечисленных мероприятий уровень механизации производства - 10%.

3.9. Научная организация труда и управление производством

Технологические процессы и организация работ по обслуживанию и ремонту автомобилей разработаны на основе руководящих документов НИИАТ и ОНТП-ОИ-86.

Проектом предусмотрена бригадная форма организации труда - в гараже создается одна комплексная бригада с руководством ею бригадиром, выбираемым из числа наиболее квалифицированных рабочих.

Привязан			
Инв. №			

503-1-84.13.91	ПЗ	Лист 27
----------------	----	------------

Бригадир осуществляет распределение работ между членами бригады, контролирует выполнение работ и несёт ответственность за выполнения плановых заданий и качество работ.

Организация бригадной формы труда обеспечивает внутреннюю кооперацию и разделение труда, обуславливающие достижение высокой производительности и качества работ.

Профессионально-квалификационный состав рабочих предприятия:

- слесарь-авторемонтник - 6 разряд - 2 чел.
- вспомогательный рабочий - 4 разряд - I чел.
- (слесарь электрик-сантехник) - 4 разряд. - I чел.

Режим работы в течении недели и месяца строится с учетом следующих требований:

- продолжительность рабочего периода не должна превышать 6 дней в неделю;
- дневная, недельная и месячная норма продолжительности рабочего времени не должна превышать установленные законом нормы.

Структура управления гаражом принята с учетом функционального назначения и подчиненности его базовому предприятию. Руководство гаражом, оформление текущей документации осуществляется администрацией промышленного (базового) предприятия в состав которого входит гараж. Информационная и руководящая связь предприятия обеспечивается по телефону.

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

503-I-84. I3.9I

ПЗ

Лист

28

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, СВЯЗ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

4.1. Исходные данные

Проект электроснабжения гаража на 10 грузовых автомобилей с открытой стоянкой разработан на основании:

- задания на разработку типового проекта;
- заданий на электроснабжение потребителей технологического и санитарно-технического разделов проекта.

4.2. Электроснабжение

Электроснабжение гаража предусматривается от низковольтных сетей, от двух независимых источников по техническим условиям, получаемым при привязке.

По надежности электроснабжения нагрузки гаража, в основном, относятся к потребителям III категории, за исключением потребителей пожарной сигнализации, которые относятся к I категории.

Напряжение силовой сети 380/220В.

Коэффициент мощности равен 0,73. Для доведения коэффициента мощности до нормируемой величины устанавливается конденсаторная установка мощностью 100 кВАр с использованием одной ступени регулирования.

В качестве силовых распределительных шкафов приняты шкафы серии ШРІІ с предохранителями. В качестве пусковой аппаратуры для электрооборудования приняты магнитные пускатели серии ПМЛ и шкафы управления комплектной поставки с технологическим оборудованием.

Распределительные сети выполняются кабелем АВВГ, КГ, проводом АПВ, ПВ2.

Кабели прокладываются открыто с креплением скобами, по трассу, провода в трубах и гибких вводах.

Привязан			
Инв. №			
503-I-84. I3.9I			Лист
ПЗ			29

4.3. Электрические нагрузки

Установленная мощность потребителей электроэнергии составляет 155,69 кВт.

В том числе:

- силовое электрооборудование - 147,49 кВт
- электроосвещение - 8,2 кВт

Средняя нагрузка за максимально загруженную смену - 84,2 кВт.

Годовой расход электроэнергии - 98,69 МВтч

4.4. Электроосвещение

Проектом предусматривается три вида освещения:

- рабочее освещение, обеспечивающее нормированную освещенность в помещениях;
- аварийное (эвакуационное) освещение, обеспечивающее эвакуацию работающих при выходе из строя рабочего освещения;
- ремонтное освещение напряжением 42В.

Нормируемые освещенности выбраны в соответствии с нормами СНиП П.4-79. Напряжение сети общего и аварийного освещения 380/220В, напряжение у ламп - 220В.

В качестве источников света рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения приняты светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Щитки освещения приняты типа ПР8500. Питающая и распределительная сети выполняются кабелем АВВГ.

4.5. Молниезащита

В соответствии с классификацией зданий и сооружений по молниезащитным мероприятиям здание гаража относится к сооружениям III категории, поэтому проектом предусматривается молниезащита с использованием железобетонных конструкций зданий и фундаментов.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №2

Привязан			
Изм. №2			
503-I-84.13.91			Лист
ПЗ			30

4.6. Автоматизация

Проектом предусматривается:

- автоматическое управление приточными системами П1, П2, П3;
- автоматическое управление в зависимости от температуры в зоне ворот и дистанционное отключение воздушно-тепловых завес У1....У4;
- отключение вентиляции при пожаре.

Индексы в обозначениях аппаратуры, установленной по месту, и кабелей соответствуют номерам электроприемников по разделу ЭМ.

4.7. Связь и сигнализация

Проектом предусматриваются следующие виды связи и сигнализации:

- городская телефонная связь;
- городская радиотрансляция;
- пожарная сигнализация.

4.8. Городская телефонная связь

Городская автоматическая телефонная связь предусматривается путем установки телефонных аппаратов.

Для подключения телефонных аппаратов, устанавливаемых в помещении, предусмотрено:

- распределительная сеть - кабелем ТПП;
- абонентская сеть - проводом ТРП 1х2х0,5

Подключение телефонных аппаратов к существующим телефонным сетям осуществляется по техническим условиям при привязке проекта.

Привязки			
Инв. №			

503-I-84.13.9I	ПЗ	Лист
		3I

Альбом I

4.9. Городская радиотрансляция

Городская радиотрансляция в здании гаража предусматривается с помощью установки однопрограммных абонентских громкоговорителей мощностью 0,15 Вт.

Распределительная и абонентская сети выполняются проводом ПТТЖ 2х1,2 с установкой универсальных коробок УК-П.

Подключение радиоточек к существующим устройствам радиотрансляционной сети осуществляется по техническим условиям радиотрансляционного узла при привязке типового проекта.

4.10. Пожарная сигнализация

Проект установки пожарной сигнализации выполнен по технологическому заданию и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара и извещения о пожаре дежурного персонала.

В качестве станции пожарной сигнализации применяется устройство приемно-контрольного типа с размещением его в комнате охраны.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязки			
Инв. №			

503-1-84.13.91	ПЗ	Лист 32
----------------	----	------------

5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Архитектурно-строительная часть проекта разработана на основании технологического задания и в соответствии с требованиями СНиП П-89-90; 2.01.02-85; 2.09.02-85; 2.09.04-87; ВСН 01-89.

5.1. Схема генерального плана

Земельный участок для размещения гаража на 10 грузовых автомобилей с открытой стоянкой располагается в населенном пункте с примыканием к автодороге, обеспечивающей подъезд к территории гаража.

Схемой генплана предусматривается размещение на участке здания гаража, открытой стоянки на 8 автомобилей, площадки для сварочных работ и очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей.

Схема генплана решена с учетом действующих СНиП и других нормативных документов.

Проезды, площадки и тротуары предусмотрены с асфальтобетонным покрытием.

Вертикальная планировка участка решается при привязке проекта и предполагает увязку планировочных отметок с отметками примыкающей автодороги.

Отвод ливневых и талых вод предусматривается по лоткам проезжей части в дождеприемники и далее, после очистных сооружений, подбираемых при привязке проекта, в сеть ливневой канализации, или по согласованию, на рельеф.

Территория, свободная от застройки и дорожного покрытия, озеленяется с устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников.

Участок строительства гаража принят со спокойным рельефом, грунтовые воды отсутствуют, грунты непучинистые и непрасадочные.

Привязан			
Инв. №			
503-I-84.13.91			Лист
ПЗ			33

5.2. Объемно-планировочные решения

Здание гаража включает в себя производственные помещения и встроенные служебно-бытовые помещения.

Здание одноэтажное с размерами в плане 18,0х18,0м, шаг колонн - 6,0м, высота до низа несущих конструкций - 6,0 м.

Степень огнестойкости - П.

Над рядом помещений на отметке 3,300 размещена венткамера.

Производственные помещения с категорией "В" отделены от других помещений огнестойкими перегородками I типа, а также огнестойкими дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.

Все помещения обеспечены эвакуационными выходами.

Для организации питания работающих предусмотрена комната приема пищи с необходимым набором оборудования.

Естественное освещение рабочих мест в производственных помещениях обеспечивается через оконные проемы.

Расчет нормативных площадей служебно-бытовых помещений приведен в таблице 5.1.

Расчет оборудования бытовых помещений приведен в таблице 5.2

Обоснование площадей

Т а б л и ц а 5.1.

№ пп	Наименование помещений	Кол-во расчетных единиц	Площадь, м ²	
			по нормам	по расчету
1	Комната бригадира	1	6,0	6,5
2	Комната охраны	1	6,0	6,5
3	Комната приема пищи	6	12,0	12,8
4	Фойе-водительская		12,0	26,3

Привязан

Инв. №

503-1-34. 13.91

13

Лист

34

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Т а б л и ц а 5.2.

№ пп корпуса	Наименование	Местоположение бытовых помещений	Группа производственных процессов	К-во ра-ботающ.		Кол-во единиц оборудования					
				Всего	В наиболее многочисленную смену	Шкафы для хранения домашн. одежды 500x330	Шкафы для хранения спец. одежды 500x330	Душевые сетки	Умывальники	Унитазы и писсуары	Умывальники при уборных
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

М у ж ч и н ы

Здание га-ража

ИВ	2	2	2	2	0,4	0,05					
ЗБ	I	I	I	I	0,2	0,05					
	I	I	I	I	0,33	0,1					
ИВ	II	9	II	II	0,18	0,64					
П С О	IA	4	I								
Итого:		19	14	15	1,11	0,84	I				I
Принято: Шкафы	МД	33,3	-	6 шт	2	I	I				I
	МД	33,2	-	6 шт							

Копировать

503-Г-84.13.91

Формат А4

ПЗ

35

Изм. №	Примечания

5.3. Конструктивные решения

Габаритные схемы и параметры проектируемого здания удовлетворяют требованиям ГОСТ 23838-89.

Здание гаража запроектировано с применением сборных железобетонных конструкций по каркасной конструктивной схеме с шагом колонн 6 м, с фермами пролетом 18 м, с плитами покрытия 3х6 м.

Прочность и устойчивость здания обеспечивается колоннами, жестко заделанными в фундаменты, и диском покрытия.

Фундаменты под колонны запроектированы монолитными железобетонными столбчатыми по серии I.412.I-6 и I.412.I-4.

Фундаментные балки приняты по серии I.415-I-2 вып. I.

Колонны сборные по серии I.423.I-3/88; I.427.I-3 и шифр Н-89-IV.

Фермы по серии I.463.I-3/87.

Плиты покрытия железобетонные комплексные по серии I.465.I-10/82 на основе плит по ГОСТ 22701.I-77, ГОСТ 22701.5-77.

Плиты перекрытия по серии I.442.I-2, вып. I.

Стеновые панели по серии I.030.I-I.

Перегородки гипсокартонные по серии I.431.9-24.

Антикоррозионную защиту выполнять в соответствии со СНиП 2.03.II-85.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Принят			
Изм. №			

503-I-84. I3.9I

ПЗ

Лист
36

6. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Типовой проект теплоснабжения, отопления и вентиляции разработан в соответствии со СНиП 2.04.05-86, СНиП 2.09.04-87, ГОСТ 12.1.005-76, ОНТП-01-86.

Проект разработан для температуры наружного воздуха минус 40⁰С, расчетная летняя температура составляет плюс 22⁰С.

Продолжительность отопительного периода - 245 суток.

Средняя температура отопительного периода минус 10,0⁰С.

6.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение здания гаража с открытой стоянкой предусматривается от внешних тепловых сетей:

Теплоноситель - вода с температурами 150+70⁰С.

Приготовление горячей воды осуществляется в водоподогревателях, температура воды - 60⁰С.

Подключение здания гаража к внешним сетям осуществляется через индивидуальный тепловой пункт (ИТП). В ИТП устанавливается узел управления и распределения тепла, приборы учета тепла и автоматики.

Из низших точек трубопроводов и оборудования ИТП предусматривается дренаж через трап в канализацию.

Все горячие поверхности оборудования и трубопроводов покрываются антикоррозионным покрытием: масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021 в один слой с последующей изоляцией матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 50мм ровингом (жгутом) или из стеклянных комплексных нитей толщиной 30мм.

Покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ.

Привязан			
Инв. №			
503-1-84.13.91			Лист
ПЗ			37

6.2. Стопление

Отопление производственных помещений гаража в нерабочее время осуществляется местными нагревательными приборами, в рабочее время - местными нагревательными приборами и воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией.

Отопление остальных помещений - местными нагревательными приборами.

Система отопления запроектирована однотрубная приточная с нижней разводкой.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы типа РСГ.

Теплоносителем для систем отопления и теплоснабжения calorиферов здания гаража является вода с температурами $150^{\circ}\text{C}(T_1)$ - $70^{\circ}\text{C}(T_2)$.

6.3. Вентиляция

Вентиляция в здании гаража запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная. Основными вредностями, выделяющимися в производственных помещениях, являются окись углерода, окислы азота, пары бензина, серной кислоты, водород.

Местная вытяжная вентиляция предусмотрена от оборудования, выделяющего вредности.

У наружных ворот поста мойки и участка ТО и ТР предусматриваются воздушно-тепловые завесы.

Воздухообмены в производственных помещениях приняты из условия растворения вредностей до предельно-допустимых концентраций и по местной вытяжке, а во вспомогательных помещениях - по кратностям в соответствии со СНиП 2.09.04-87.

Подача приточного воздуха осуществляется в участке ТО и ТР в рабочую зону, в остальных помещениях - в верхнюю зону.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			
503-I-84. I3.9I			Лист
ПЗ			38

Расчетные тепловые потоки

№ пп	Наименование потребителя	Тн ⁰ С	Расчетный тепловой поток, <u>МВт</u>					
			<u>Гкал/ч</u>					
			Отопле- ние	Венти- ляция	Воздуш- но-теп- ловые завесы	Техно- логи- ческие нужды	Горячее водосна- бжение	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Здание гаража с открытой стоянкой	-40	<u>0,0557</u> 0,048	<u>0,3066</u> 0,2643	<u>0,2175</u> 0,1875	<u>0,1218</u> 0,1050	<u>0,0306</u> 0,0264	<u>0,7323</u> 0,6312

Конспект

503-1-84.13.91

ЛЗ

39

Формат А4

Проезд	
Инд. №	
Лист	

Удаление воздуха осуществляется непосредственно от технологического оборудования, в помещениях участка ТО и ТР из верхней и нижней зон поровну, в остальных помещениях из верхней зоны.

6.4. Использование тепловых вторичных энергетических ресурсов

В соответствии с "Методикой оценки целесообразности и экономической эффективности утилизации тепловых вторичных энергетических ресурсов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха" (ЦНИИ Промзданий, 1985 год) выполнен расчет, который показал, что экономический эффект от внедрения систем утилизации тепла отсутствует, срок окупаемости систем превышает нормативный (8 лет).

Использование вторичных энергетических ресурсов проектом не предусматривается.

6.5. Автоматизация отопительно-вентиляционных установок

Для систем вентиляции проектом предусмотрена следующая автоматика:

- автоматическое регулирование температуры подаваемого в помещение воздуха или воздуха в помещении;
- защита caloriferов от замораживания;
- контроль параметров воздуха и теплоносителя;
- блокировка клапана наружного воздуха и клапана на теплоносителе с электродвигателем вентилятора;
- автоматическое включение и выключение, а также блокировка электродвигателя агрегата ПА-2124 с технологическим оборудованием;
- централизованное отключение всех систем при возникновении пожара;

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Приняван			
Име. №			

503-I-84.13.91

ПЗ

Лист
40

- работа воздушно-тепловых завес по сигналам датчиков температуры установленных в районе ворот.

6.6. Материал воздуховодов, тепловая изоляция, антикоррозионная защита трубопроводов, воздуховодов, оборудования

Воздуховоды приточных и вытяжных систем металлические круглого сечения толщиной стали согласно СНиП 2.04.05-86.

Воздуховоды системы ВЗ, транспортирующие воздух, содержащий пары кислоты покрываются изнутри грунтом ХСО10 в два слоя эмалью ХСЭ-2 в четыре слоя и лаком ХСЛ в два слоя.

Транзитный воздух системы ВЗ покрывается огнезащитным вспучивающимся покрытием ВПМ-2 толщиной 4мм.

Вентилятор системы В2 транспортирующий воздух с содержанием взрывоопасных веществ предусмотрен во взрывозащищенном исполнении.

Подающие трубопроводы систем теплоснабжения диаметром до 50мм изолируются ровингом (жгутом) из стеклянных комплексных нитей толщиной 30мм, диаметром 50 и более шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты в оплетке из нити стеклянной толщиной 50мм.

Покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ.

Перед изоляцией на трубопроводы наносится антикоррозионное покрытие масляно-битумное в два слоя по грунту ГФ-021 в один слой. Неизолированные трубопроводы окрашиваются краской БТ-177 по грунту лаком БТ-577.

Привязан			
Инв. №			
503-1-84.13.91			Лист
ПЗ			41

7. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Проект водопровода и канализации выполнен на основании:
 - нормативных документов СНиП 2.04.01-85; 2.04.02-84;
 2.04.03-85; СН 478-80.

7.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения принят кольцевой водопровод. Напор в сети 30м.

Проектом предусмотрена объединенная хозяйственно-питьевая производственно-противопожарная система водоснабжения.

Ввод водопровода выполнен диаметром 60х2,5мм в канале тепло-сети в помещении индивидуального теплового пункта. На вводе устанавливается водомерный узел с водомером ВСКМ 5/20 и обводной линией.

Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов диаметром 50мм с расходом 5 л/с (2 струи по 2,5л каждая).

Внутренняя сеть водопровода выполнена из стальных водогазопроводных оцинкованных труб под накатку резьбы диаметром 15+50мм.

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на внутривозвращающей кольцевой сети гаража. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/сек.

7.2. Горячее водоснабжение

Горячая вода на хозяйственно-питьевые нужды здания готовится в водоподогревателе в помещении индивидуального теплового пункта.

Сеть горячего водоснабжения проектируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб под накатку резьбы диаметром 15+25мм.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

503-I-84.13.91

ПЗ

Лист
42

7.3. Канализация

Отвод бытовых сточных вод от здания гаража принят в наружную сеть канализации предприятия.

В здании гаража запроектированы отдельные системы канализации:

- бытовая;
- обратное водоснабжение от мойки автомобилей;
- внутренние водостоки.

Бытовая канализация проектируется для отвода бытовых стоков от санитарных приборов со сбросом в сеть канализации предприятия и выполняется из пластмассовых канализационных и асбестоцементных труб.

Производственная канализация запроектирована для отвода случайных сточных вод из помещения индивидуального теплового пункта и выполняется из пластмассовых канализационных труб.

Стоки от мойки машин проходят очистку на очистных сооружениях для сточных вод от мойки автомобилей производительностью 1,5 л/с по типовому проекту. 902-2-416.86 и используются повторно.

В осенне-зимний период обратная вода проходит через водоподогреватель. Температура нагрева воды 40°.

Внутренние водостоки запроектированы для удаления дождевых и талых вод с кровли здания в наружную сеть дождевой канализации гаража. Сеть водостоков запроектирована из чугунных канализационных труб и асбестоцементных напорных труб.

Отвод и очистка дождевых стоков с территории гаража решаются при привязке проекта.

Привязан			
Инв. №			

503-I-84.13.9I

ПЗ

Лист

43

Таблица 7.1.

Альбом I

Наименование системы	Потребный напор м	Расчетный расход				Примечание
		м ³ /сут	м ³ /час	л/с	при похоре л/с	
I	2	3	4	5	6	7

I. Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный

а) Хозяйственно-питьевые расходы:

- производственные и вспомогательные рабочие	13	0,1				
- ПСО		0,064	1,30	0,55	0,15	
- водители		0,17				
- душевые		1,0				

б) Производственные расходы

6	0,7	0,35	0,2	-		
---	-----	------	-----	---	--	--

Пополнение оборотной системы

в) Пожаротушение:

- внутреннее из пожарных кранов	2I	-	-	-	5	
- наружное из пожарных гидрантов		-	-	-	10	

Всего:

	2,03	1,65	0,75	15,15		
--	------	------	------	-------	--	--

г) Полив территории:

- озеленение	13	1,97	-	-	-	
- проезды		0,46	-	-	-	

Итого

	4,46	1,65	0,75	15,15		
--	------	------	------	-------	--	--

2. Обратное водоснабжение. IO

	6,0	3,0	1,25			
--	-----	-----	------	--	--	--

3. Канализация

- бытовая	-	1,33	1,3	2,15		
- дождевая	-	-	-	3,88		

Привязан

Инва. №

503-I-84. I3.9I

ПЗ

Лист
44

**8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДОЕМОВ, ПОЧВЫ
И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
НЕОЧИЩЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И ПРО-
МЫШЛЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ**

Организация оборотного водоснабжения от мойки автомобилей резко сокращает потребление свежей воды и исключает сброс сточных вод в водоем, для чего на территории гаража предусматривается устройство очистных сооружений.

Для предотвращения попадания в почву дождевых загрязненных вод на территории гаража предусматривается твердое покрытие проездов и площадок.

Очистка дождевых вод на локальных очистных сооружениях решается при привязке проекта.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются производственные процессы, связанные с техническим обслуживанием, текущим ремонтом и мойкой грузовых автомобилей.

Вентиляционными установками местной и общеобменной вентиляции выбрасываются в атмосферу окись углерода, окислы азота, бензин, пары серной кислоты.

Воздух, удаляемый от точильно-шлифовального станка, очищается от пыли в пылеулавливающем агрегате ПА-2Г2М.

Количество вредных веществ, выделяющихся в помещениях поста мойки, участков ТО и ТР, определяется в соответствии с ОНТП-01-86.

Количество вредных веществ, выбрасываемых системами местных отсосов, определяется технологической частью проекта.

Количество вредных веществ, параметры выбросов вредных веществ, координаты источников, необходимые для расчета на ЭВМ рассеивания вредных веществ при привязке проекта, приведены в таблице 8.1.

За начало системы координат принят угол здания гаража А/І.

Привязан			
Инв. №			
503-І-84. ІЗ.9І			Лист
ПЗ			45

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Альбом 1

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу

Т а б л и ц а 8.1

Производство	Цех, участок	Источники выделения вредных веществ			Число источников выброса	№ источника на карте-схеме	Высота источника выброса м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса		
		Наименование	Количество	Наименование источника выброса (труба)					W м/с	V м3/с	T °C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гараж на 10 грузовых автомобилей с открытой стоянкой	Участок и ТР	Автомобили КАМАЗ-5320 и ЗИЛ-4314	I	труба	I	I	II	0,2	6	0,181	70
		То же	I	То же	I	2	II	0,2	II	0,344	24
		"	I	"	I	3	II	0,45	10,5	1,65	24
		Шкаф для зарядки аккумуляторов	I	"	I	4	12,5	0,45	3	0,472	24

Компьютеризация

503-1-84.13.91

Формат А4

Инв. №

Привязки

13

46

Лист

Продолжение таблицы 8.1

Координаты точечного источника на карте-схеме, м		Выделения и выбросы вредных веществ г/с				
X	y	Окись углерода	Окислы азота	Углеводороды	Пары бензина	Аэрозоль серной кислоты
		С учетом газоочистки	С учетом газоочистки	С учетом газоочистки	С учетом газоочистки	С учетом газоочистки
		Без газоочистки	Без газоочистки	Без газоочистки	Без газоочистки	Без газоочистки
I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
16	3	0,1542	0,028	0,021	-	-
15,5	9	-	-	-	0,00586	-
16	15	0,0308	0,0056	-	-	-
7,1	13,5	-	-	-	-	0,000024

Копирован

503-Г-84.13.91
13
47

Имя. №						
Примечания						
Лист						

Формат А4

Инь. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Альбом I

Продолжение таблицы 8.1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
Гараж на 10 грузовых автомобилей	Пост-мойки	Автомобиль КамАЗ-5320	3	Крышный вентилятор	2	5	7	0,5	7,3	1,4	24
		Автомобиль ЗИЛ-4314	2			6	7	0,63	7,7	2,394	24

Исх. № 503-1-84.13.91

503-1-84.13.91

113

48

Инь. №		Примечание
Лист	48	

Сторона А2

Продолжение таблицы 8.1

I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
0,85	I3,5	<u>-</u> 0,0191	<u>-</u> 0,00491	-	-	-
0,85	7,5	<u>-</u> 0,0327	<u>-</u> 0,00839	-	-	-

Копирован

503-I-84, I3.91

Формат А4


I3

Приказ				
Име. №				

Лист
49

Альбом I

КАРТА - СХЕМА

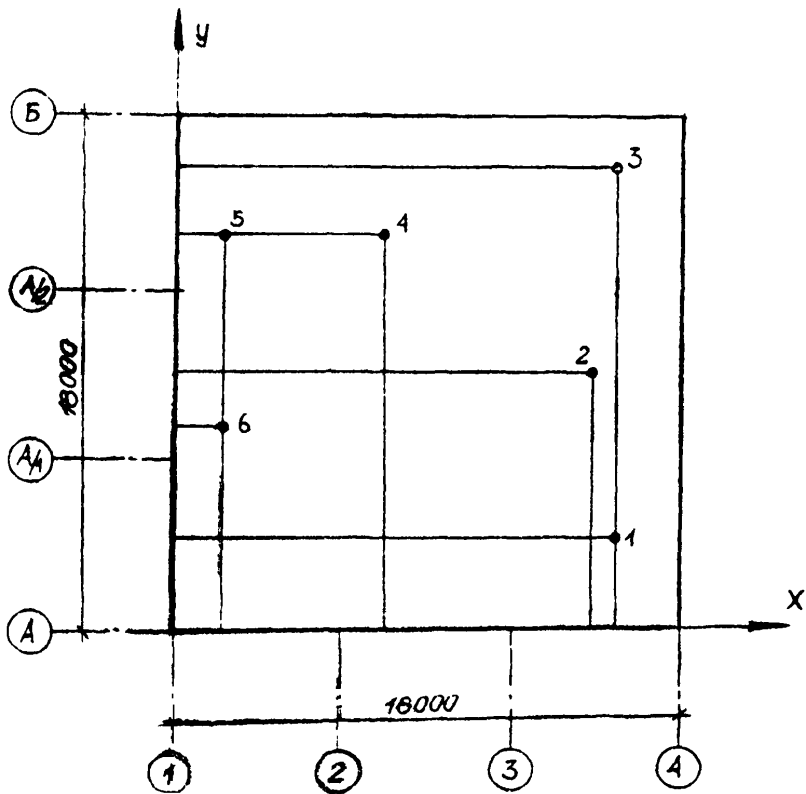

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

503-1-84, 13.91	ПЗ	Лист 50
-----------------	----	---------

Копирефил

Формат А4

9. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

9.1. Пояснительная записка

Основными нормативными документами при определении стоимости явились:

- ЕРЕР для 8 территориального района;
- Прейскуранты оптовых цен оборудования, введенных в действие с 01.01.82 г.;
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

При определении стоимости строительства использован аналог - типовый проект 902-2-416.86 "Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей".

Привязан			
Инв. №			

503-1-84.13.91

ПЗ

Лист

51

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взм. инв. №

Альбом I

9.2. Сводный сметный расчет
к типовому проекту гаража на 10 грузовых автомобилей с открытой
стоянкой. Стены панельные

Составлен в ценах 1984г.

№ пп	№ смет и рас- четов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономи- ческие показатели		
			строи- тель- ных работ	мон- таж- ных работ	обору- дование мебели и инвен- таря	прочих затрат	всего	наим. един. изм.	К-во един. изм.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГЛАВА 2 - Основные объекты строительства										
I	I	Гараж на 10 грузо- вых автомобилей с открытой стоянкой	100,92	10,02	24,93		135,87	ав- том.	10	13587
		Итого:	100,92	10,02	24,93		135,87			
ГЛАВА 6 - Наружные сети и сооружения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения										
	2	2	Очистные сооруже- ния оборотного водоснабжения	7,76	-	4,11	11,87			7913
			Итого:	7,76		4,11	11,87			
			Итого по главам:	108,68	10,02	29,04	147,74			

Колонки

503-1-84.13.91

Изм. №	Проценты

ПС

Формат А4

52

53

Ю. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Рекомендации по организации строительства гаража разработаны согласно СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".

Сметная стоимость строительства - 226,96 тыс.руб., в том числе строительно-монтажных работ - 183,98 тыс.руб.

Объем здания гаража - 3173,5м³.

Производство основных строительно-монтажных работ принято с учетом следующих основных положений:

- обеспечение максимального уровня комплексной механизации строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работ;
- широкое внедрение средств механизации, применение наиболее совершенных приспособлений, инвентаря и инструмента;
- применение метода максимально возможного совмещения по времени выполнения всех видов строительных и монтажных работ.

Ведомость объемов основных строительных,
монтажных и специальных строительных работ

Таблица Ю. I. Начало

Наименование	Объем СМР			
	Всего	В т.ч. по кварталам		
		II	III	IV
I	2	3	4	5
Земляные работы:				
- выемка, м ³	500	500		
- насыпь, м ³	470	470		
Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций, м ³	115,7	55,6	40,2	19,9

Привязан			
Инв. №			

503-I-84. I3. 9I

ПЗ

Лист

53

Альбом I

Таблица Ю.І. Окончание

I	2	3	4	5
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций, м3	247,4	85,1	162,3	
Заполнение оконных проемов, м3	46,5			46,5
Заполнение дверных проемов, м2	25,2			25,2
Устройство перегородок:				
- гипсокартонные листы, м2	586		386	200
Устройство полов:				
- линолеум, м2	38			38
- мозаичное покрытие, м2	47			47
- бетонные плиты, м2	42			42
Устройство кровли:				
- рулонной, м2	346		346	
Отделочные работы:				
- масляная окраска, м2	754			754
- известковая окраска, м2	1571			1571
- облицовка стеклоплиткой, м2	146			146
- штукатурные работы, м2	54			54
Изоляционные работы:				
- обмазка битумом, м2	546	200	346	
- цементная стяжка, м2	435	30	340	65
- рубероид, м2	184		184	
Монтаж стальных конструкций, т	8,4	1,8	6,6	
Кирпичная кладка, м2	16,7		16,7	

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

503-I-84. I3.9I

ПЗ

Лист

54

Ведомости потребности в строительных
конструкциях, изделиях, материалах

Таблица 10.2.

Наименование	Всего	В т.ч. по кварталам		
		II	III	IV
I	2	3	4	5
Арматура, т	1,7	0,9	0,8	
Бетон, м3	118	56,7	41	20,3
Щебень, м3	37		31,4	5,6
Песок, м3	35,1	27,5	-	7,6
Лес, м3	27,9	4,0		23,9
Цемент, т	31,5	16	10,5	5
Раствор, м3	10,1	3,0	5,4	1,7
Кирпич, тыс.шт.	6,6		6,6	

10.1. Календарный план строительства

Срок строительства гаража составляет - 8 месяцев, в том числе подготовительный период - 1 месяц, согласно СНиП I.04.03-85 ("Изменение № 4", стр.192, п.3, применен метод экстраполяции).

Привязан

Инв. №

503-I-84.13.91

ПЗ

Лист

55

Таблица 10.3.

Наименование зданий и сооружений	Сметная стоимость тыс. руб.		Распределение капитальных вложений и объемов СМР по кварталам		
	Всего	В т.ч. объем СМР	II	III	IV
I	2	3	4	5	6
Здание гаража	135,87	110,94	43,92/ 34,38	64,31/ 56,12	27,64/ 20,44
Очистные сооружения оборотного водоснабжения	11,87	7,76			11,87/ 7,76
Всего:	147,74	118,70	43,92/ 34,38	64,31/ 56,12	39,51/ 28,20

В основной период предусмотрено строительство зданий и сооружений по экспликации, инженерных сетей, постоянных дорог, благоустройство территории.

В подготовительный период предусматривается демонтаж или перенос существующих сетей, разборка имеющихся на площадке зданий и сооружений, вертикальная планировка участка, строительство или установка временных зданий и сооружений, прокладка сетей противопожарного водопровода, строительство трансформаторной подстанции (если она предусмотрена проектом) для обеспечения площадки энергией.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан		
Инд. №		
503-I-84.13.91		Лист
		56

10.2. Потребность в кадрах

Число работающих на строительстве определено на основании среднегодовой выработки работающих, стоимости строительно-монтажных работ и составляет 10 человек. Количество отдельных категорий работающих определено по расчетным нормативам для составления проектов организации строительства и составляет:

- рабочих - 8 чел.
- ИТР и служащих - 1 чел.
- МОП и охрана - 1 чел.

Обеспечение строительства кадрами осуществляется за счет постоянных кадров подрядной строительной организации.

10.3. Земляные работы

Перед началом строительства необходимо выполнить инженерную подготовку: сделать вертикальную планировку, выполнить мероприятия по защите оснований сооружений от замачивания водой. Для разработки котлованов и траншей применяется экскаватор емкостью ковша 0,5м³. Добор грунта не должен превышать в котлованах 7%, в траншеях - 3% от общего объема работ. Грунт необходимый для обратной засыпки, отодвигается бульдозером на расстояние до 50м, остальной грунт вывозится автосамосвалами. Обратная засыпка грунта производится бульдозером 80 л.с. с уплотнением грунта пневмотрамбовками.

10.4. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции

Производство бетонных работ вести с максимальным уровнем механизации. Укладка бетона в конструкции должна производиться с применением вертикального транспорта.

Монтаж опалубки и арматуры производится краном, обеспечивая максимальную производительность работ.

Привязан			
Инв. №			

503-I-84.13.9I

ПЗ

Лист
57

Опалубка принимается щитовая, инвентарная сборно-разборная. Арматура и опалубка должны быть очищены от грязи и мусора. Во время дождя, снегопада бетонируемый участок должен быть защищен от попадания воды в бетонную смесь с помощью натягивания полиэтиленовой пленки.

10.5. Сборные железобетонные конструкции

Сборные железобетонные конструкции, поступающие на стройплощадку, должны отвечать требованиям, действующих ГОСТов и технических условий. Перед началом монтажных работ производится инструментальная проверка отметок в плане фундаментов. Тяжелые элементы следует укладывать ближе к краю для возможности их подъема на малом вылете стрелы. Строповка элементов конструкций должна обеспечить их подъем и подачу к месту монтажа в положение, соответствующее проектному. Монтаж сборных железобетонных конструкций выполняется монтажными кранами, грузоподъемность которых должна соответствовать весу конструкций. В процессе монтажа должна быть обеспечена устойчивость смонтированных элементов до сборки закладных деталей и замоноличивания стыков.

Монтаж конструкций здания гаража осуществляется пневмоколесным краном МКП-25 (\angle стр. = 17,5 м, \angle гуська = 7 м).

10.6. Производство работ в зимних условиях

Земляные работы

С целью сокращения времени и затрат на производство земляных работ в зимний период организация и выполнение этих работ должны осуществляться преимущественно в теплое время года. При разработке грунта в зимнее время земляные работы нужно начинать с рыхления грунта.

Привязан			
Име. №			

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

503-I-84.13.9I

ПЗ

Лист

58

Разработка должна вестись непрерывно во избежание промерзания разрыхленного грунта. В случае вынужденного перерыва в работе разрыхленный грунт необходимо утеплять. Производство работ при отрицательной температуре наружного воздуха производить в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции

Способы производства работ в зимнее время должны обеспечивать получение в заданные сроки бетона проектной прочности. При невозможности добиться требуемой прочности бетона применять выдерживание бетона по способу "термоса" с применением ускорителей твердения бетона; обогрев паром или горячим воздухом в тепляках; электроподогрев бетона.

Производство работ вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Сборные железобетонные конструкции

Монтаж конструкций из сборного железобетона в зимний период производить согласно СНиП 3.03.01-87.

Замоноличивание стыков сборных конструкций при отрицательной температуре наружного воздуха производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Перечень рекомендуемой монтажной оснастки и инвентаря

Таблица Ю.4. Начало

Наименования, назначения, основные параметры

Траверсы грузоподъемностью 3т для монтажа колонн.
Клинья инвентарные винтовые для выверки колонн.
Передвижной контейнер для инструмента и приспособлений.

Привязан			
Име. №			

503-I-84. I3. 9I

ПЗ

Лист

59

Таблица 10.4. Окончание

Наименования, назначения, основные параметры

Рулетка стальная РС-50
 Теодолит типа Т-10
 Нивелир типа НВ-1
 Ломик монтажный
 Инвентарное ограждение
 Инвентарная приставная лестница
 Строп 4-х ветвевый универсальный
 Канат пеньковый для оттяжки
 Страховочные стальные канаты
 Строп 2-х ветвевый для подъема стеновой панели
 Отвес-рейка для выверки вертикальной панели
 Щетка стальная для зачистки закладных деталей
 Упор для временного крепления перегородок
 Захват рамочный для колонн
 Пневматический шприц для подачи мастики в стык

10.8. Потребность в строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах

Потребность в основных машинах определена исходя из объемов работ, подлежащих выполнению, и установленных ежегодных норм выработки; второстепенных машин - по расчетным нормативам на 1 млн.руб. годового объема строительно-монтажных работ.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

503-1-84.13.91

ПЗ

Лист

60

Перечень строительных машин и механизмов
Таблица 10.5.

Наименование строительных машин	Марка	Потребность шт
Экскаватор	ЭО-3322	1
Бульдозер	ДЗ-42	1
Пневмограбловка	И-57	1
Пневмоколесный кран	МКП-25	1
Автосамосвалы	КамАЗ-5311	2
Бортовые машины	КамАЗ-5320	2
Полуприцеп-панелевоз	НАМИ-790	1

10.9. Временные здания и сооружения

Потребная площадь временных зданий и сооружений определена по расчетным нормативам для выполнения проектов организации строительства.

Таблица 10.6. Начало

Наименование помещений	Потребная площадь, м ²
------------------------	-----------------------------------

I. Помещения санитарно-бытового назначения:

гардеробная	4,8
умывальная	0,4
сушилка	1,2
помещения для обогрева рабочих	0,6
помещение для приема пищи	2,7
уборная	0,5
Итого:	10,2

Привязан			
Инв. №			

503-1-84.13.91

ПЗ

Лист
61

Таблица 10.6. Окончание

Наименование помещений	Потребная площадь, м ²
П. Помещения административного назначения:	
контора	2
Итого:	2
Ш. Здания складского назначения:	
склад отапливаемый	2,4
склад неотапливаемый	4,2
навес	7,6
Итого:	14,2

10.10. Требования по технике безопасности

Мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии представлены в виде проектных соображений по основным вопросам охраны труда и производственной санитарии на строительной площадке и сводятся к следующим основным положениям:

- во избежание доступа посторонних лиц, территория строительной площадки ограждается временным ограждением, что предусмотрено в работах подготовительного периода;
- до начала основных работ на стройплощадке должны быть сооружены внутривозрадные дороги, используемые на период строительства, обеспечивающие свободный доступ транспорта к строящимся объектам;
- на территории строительной площадки должны быть установлены указатели проездов и проходов;
- опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время;

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

503-I-84. I3.9I

ПЗ

Лист

62

- проезды, проходы и погрузо-разгрузочные площадки необходимо регулярно очищать от мусора, строительных отходов и ничем не загромождать;

- в местах переходов через канавы и траншеи должны быть установлены мостики шириной не менее 0,8м с перилами высотой 1м;

- производство строительно-монтажных работ в темное время суток допускается только при достаточном освещении в соответствии с "Нормами электрического освещения строительных и монтажных работ" СН 80-81;

- строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

Ю. II. Стройгенплан

Стройгенплан решает вопросы размещения временных зданий и сооружений, складирования материалов и конструкций, временных дорог, инженерных сетей, основных монтажных кранов, устройство временного ограждения, сооруженного в подготовительный период. Временные здания и сооружения расположены на свободных площадках, что позволяет осуществлять их эксплуатацию в течение всего периода строительства без разборки, передвижки и переноса. Удовлетворение требованиям техники безопасности и пожарной охраны осуществляется путем соблюдения установленных разрывов между зданиями и устройством проездов для пожарных машин вокруг строящихся зданий. (СНиП Ш-4-80).

Привязан			
Инв. №			

503-1-84.13.91


ПЗ

Лист

63

Альбом I

Схема стройгенплана

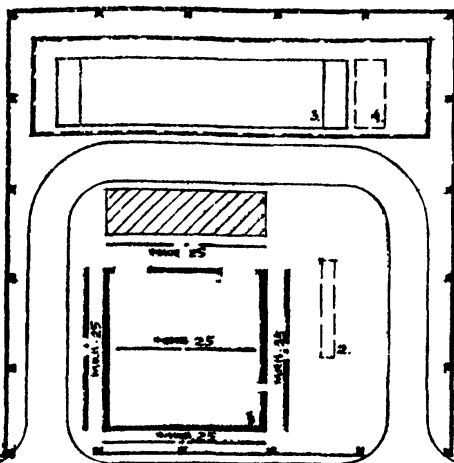

Экспликация зданий и сооружений

№ по ген-плану	Наименование
1	Гараж на 10 грузовых автомобилей
2	Очистные сооружения оборотного водоснабжения
3	Открытая стоянка на 8 автомобилей
4	Площадки для сварочных работ

Привязки

Ивл. №2			







503-1-84.13.91

ПЗ

Лист

64

Условные обозначения:

-  - здания проектируемые
 - площадка для размещения временных зданий и сооружений
 - открытые площадки складирования
 - временное ограждение территории строительства
 - временные автодороги
 - ходовая линия монтажных кранов

Примечание:

Монтаж сборных конструкций производится отдельным методом: сначала устанавливаются колонны, затем конструкции покрытия, стеновые панели.

Привязан			
Инв. №			

503-1-84.13.91


ПЗ

Лист

65

Альбом I

СХЕМА ГЕНПЛАНА

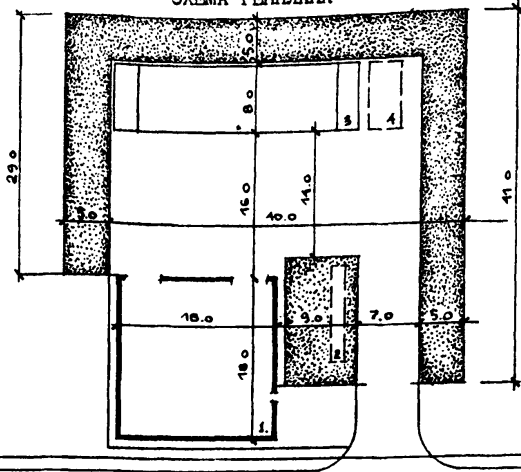

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ по ген-плану	Наименование	Примечание
I	Здание гаража	
2	Очистные сооружения оборотного водоснабжения	т.п.902-2-416.86
3	Открытая стоянка на 8 автомобилей	
4	Площадка для сварочных работ	

Площадка участка - 0,189га
 Плотность застройки - 64%

Привязки			
Имя, №			

Имя, № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

503-I-84. I3.9I

ПЗ

Лист

66

О Т П Е Ч А Т А Н О
в АП СИБТИПРОЕКТ
630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/1
Выдано в печать " 6 " II 1992 г.
Заказ 52 Тираж 150
Цена руб. коп.
