

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)

# Т И П О В Ы Е ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ К А Р Т Ы

РАЗДЕЛ 07

Альбом 07.29

МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ

Цена 0-72

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

А Л Ь Б О М 07. 29

### МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ

1. Установка газовых плит	Стр. 2 - 10
2. Установка газовых проточных водонагревателей	Стр.11 - 22
3. Монтаж трубопроводов внутреннего газопровода	Стр.23 -32
4. Пневматическое испытание внутреннего газопровода	Стр.33- 38

07.29.01

## УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ

### I. Область применения

Карта применяется при установке газовых плит.

### II. Техничко-экономические показатели монтажного процесса

1. Трудоемкость установки плиты - 2-х конфорок. 4-х конфорок.
 

0,76	0,93
------	------
2. Выработка на одного рабочего в смену:
 

а) в физических величинах (компл.	10,5	8,5
б) в денежном выражении (в рубл.)	134,0	157,0

### III. Организация и технология монтажного процесса

1. Газовые плиты доставляют на объект в обрешетке или контейнерах в полном комплекте и поднимают к месту установки автогидроподъемником (см. лист I) или вертикальным строительным подъемником (см. лист 2) за один день до их установки. Для удобства принятия груза с подъемного механизма, с внутренней стороны помещения, к окну, на уровне подоконника, устанавливают козлы шириной 250-300 мм.

2. Установка плит производится после окончания монтажа газопроводов и полной готовности всех строительных и подготовительно-отделочных работ, т.е. перед последней окраской помещения.

3. Подготовка рабочего места при установке газовых плит предусматривает:

Установка газовых плит		ТТК 7.04.05.01	
1968	Пояснительная записка	А.А.А.А. III	Лист

07.29.01

а) освобождение места установки от посторонних предметов;

б) обеспечение естественным или искусственным освещением.

4. Монтажное положение плиты в случае подключения ее к подводимому газопроводу на уровне рамп и установки отключающего крана сбоку на расстоянии не менее 400 мм приведено на листе 3.

5. Монтажное положение плиты, подключаемой к подводимому газопроводу обычным способом (стояк за плитой), приведено на листе 4.

6. График производства работ приведен на листе 6.

#### IV. Организация и методы труда рабочих

1. Установка газовой плиты выполняется звеном в составе:

слесаря-сантехника 5 разряда,

" " 3 "

2. Последовательность рабочих операций при установке газовой плиты (см. лист 5):

- подноска и установка плиты на место,
- выверка плиты по уровню,
- присоединение газопровода к плите,
- установка на место горелок и конфорок (перед пуском газа в сеть).

Установка газовых плит

ТТК  
1.04.05.01

Пояснительная записка

Лист  
II

1968

Проектный институт  
Проектная организация  
Инженер  
С. Гадкин  
С. Юркович  
А. Сорокин  
В. Байс  
А. Сорокин  
Т. Мухоморова

07.29.01

## У. Материально-технические ресурсы

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Плита газовая в полном комплекте | - 1 комп. |
| 2. Трубная заготовка                | - 1 "     |
| 3. Бедила свинцовые                 | - 10 гр.  |
| 4. Ден чесанный                     | - 5 "     |

## УІ. Набор инструментов и приспособлений

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Бородок слесарный 120 мм ГОСТ 7214-54                                 | - 1 шт. |
| 2. Зубило слесарное 200 мм ГОСТ 7214-54                                  | - 1 "   |
| 3. Ключ трубный рычажный А-1 ИКТИ 6813-39                                | - 1 "   |
| 4. То же, № 2  | - 2 "   |
| 5. То же, разводной до 19 мм ГОСТ 7275-62                                | - 2 "   |
| 6. Молоток слесарный 800 гр ГОСТ 2310-54                                 | - 2 "   |
| 7. Отвертка 250х1,5 ГОСТ 5423-54   | - 2 "   |
| 8. Плоскогубцы комбинированные 200<br>ГОСТ 5547-52                       | - 1 "   |
| 9. Уровень металлический 300 мм ГОСТ 9416-60                             | - 1 "   |
| 10. Метр складной металлический ГОСТ 7253-54                             | - 1 "   |
| II. Ящик инструментальный переносный<br>ВНИИ МОНТАЖСПЕЦСТРОЯ ММСС СССР - |         |

**УП. Техника безопасности**

1. Состояние инструмента должно соответствовать п.п.4.18 - 4.21 СНиП III-A.II-62 "Техника безопасности в строительстве".
2. Подъем и перемещение оборудования должно производиться с соблюдением требований отдела 23 СНиП "а III-A.II-62.

## Установка газовых плит

TIK  
T04.05.01


## Пояснительная записка

Answer	Two
III	

1968

07.29.01

Проектно-сметная организация	Зам. за инженера	Инженер	Инж. проект	В. Вое
Проектно-сметная организация	Нач. отдела	С. Дотарачный	Инж. проект	А. Савваткин
Проектно-сметная организация	Инж. специалист	А. Грингауз	Ст. техник	Т. Юшков

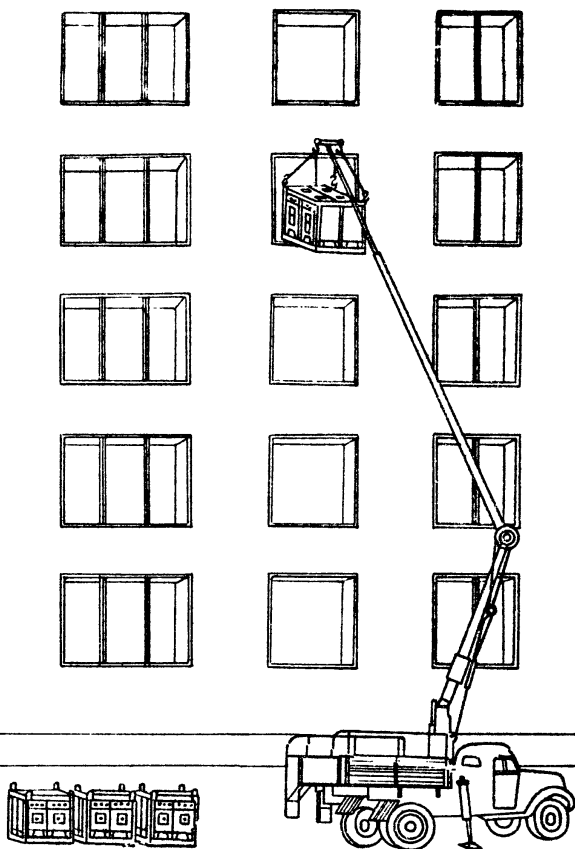


# Установка газовых плит.

1968 Подъем плит в контейнере к месту установки автогидроподъемником.

Т.Т.Н.  
7.09.01

Лист  
III  
1

07.29.01

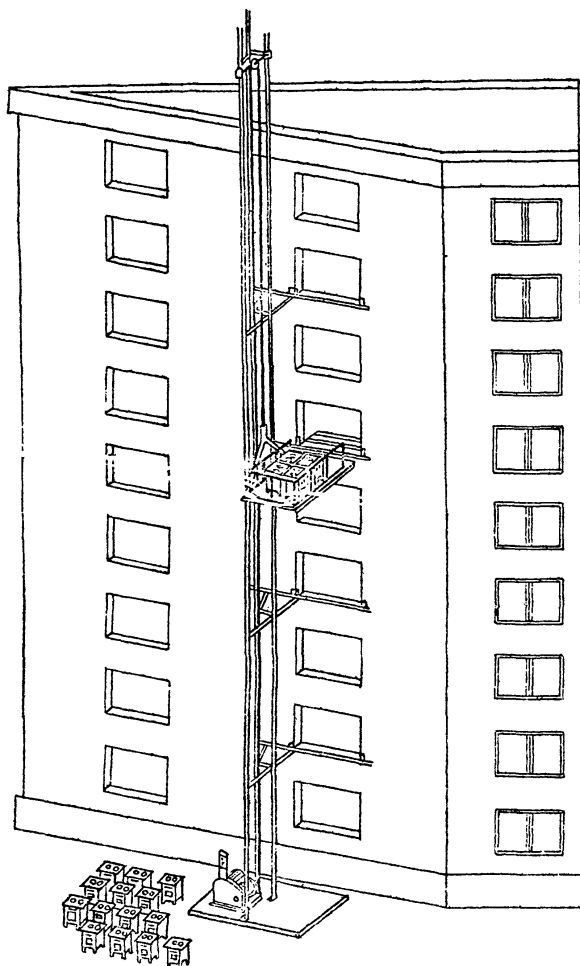


Нач. отдела	С. Деморачук	Дир. группы	А. Савин	Ассистент	А. Савин
Пр. специалист	А. Пригодуз	Ст. техник	Т. Юшкова		

Установка газовых плит		ТТК 704.05.01	
1968	Повъем плит к месту установки вертикальным подъемником	А. 660	Лист III 2

Проектный институт	Мин. хим. маш. инд.	И. И. Сидоров	Сл. инж. проекта	86	Б. Вайс
Проектпроектирование	Нач. отдела	<i>А. С. Деморский</i>	Рук. группы	<i>Ю. А. Грингауз</i>	Л. Соломатин
	Сл. специалист	<i>А. Грингауз</i>	Ст. техник	<i>М. Юшкова</i>	М. Юшкова



1968	Установка газовой плиты	ТТК
Монтажное положение плиты		7.04.05.01
(стояк сбоку плиты)		А. 1360м
		лущет
		3

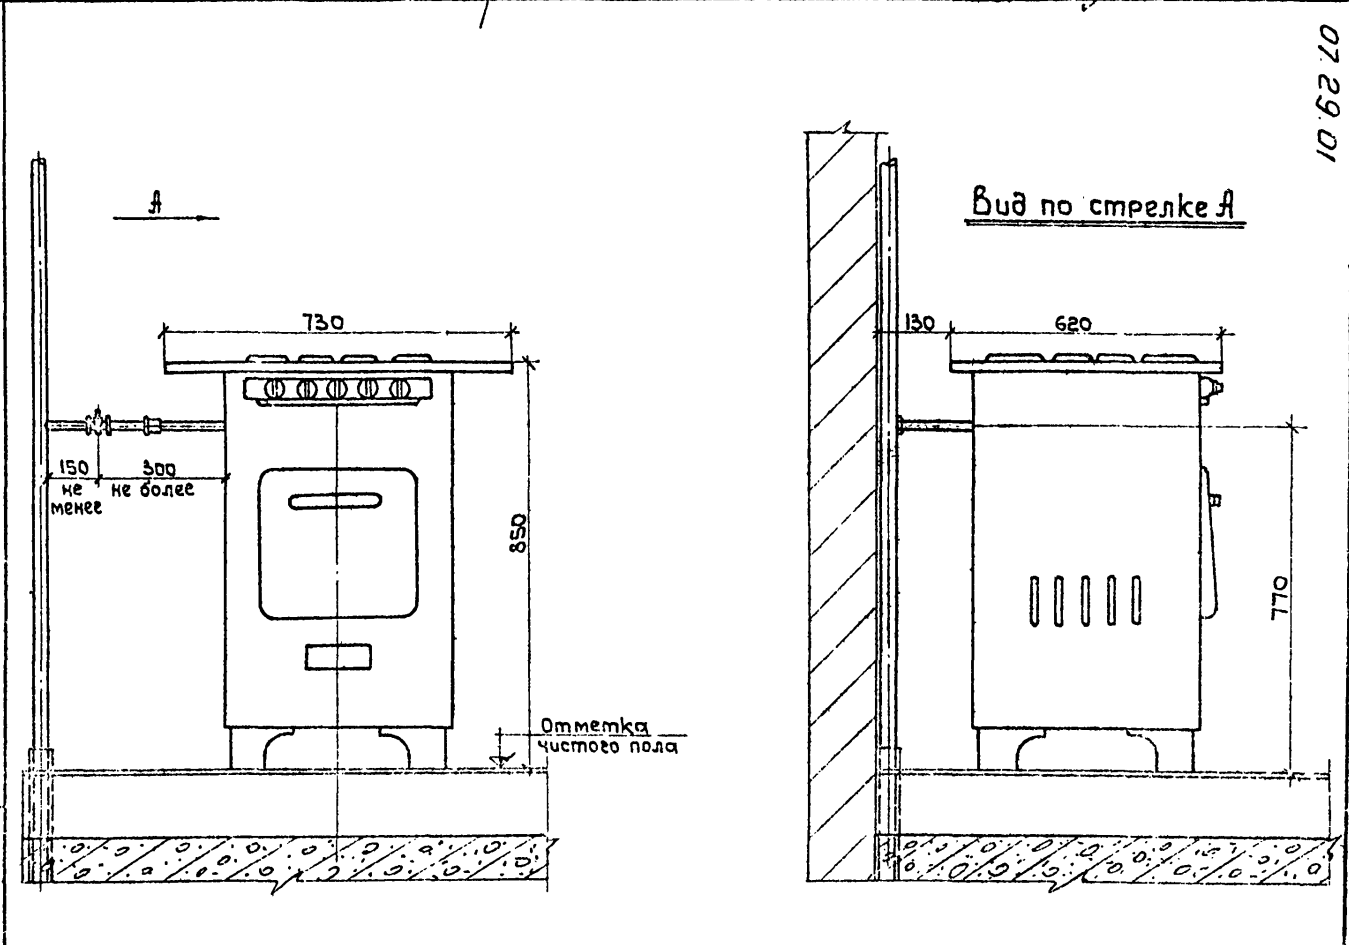



Проектный институт	Зам. гл. инжен.	<i>Г. Рабкин</i>	Г. Рабкин	Зл. инж. проекта	<i>Б. Вайс</i>	Б. Вайс
Проектпроектирования	Нач. отдела	<i>С. Доморацкий</i>	С. Доморацкий	Рук. группы	<i>Л. Соломатин</i>	Л. Соломатин
	Зл. специалист	<i>М. Юскова</i>	Я. Зринская	Ст. техник	<i>М. Юскова</i>	М. Юскова

1968	Установка газовых плит		ТК
	Монтажное положение плиты		7.04.05.01
	(срок за плиту)		Добом
			л.с.м
			III
			4

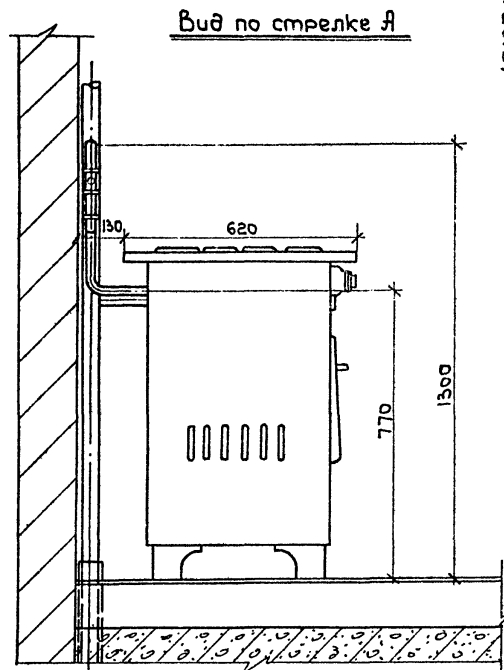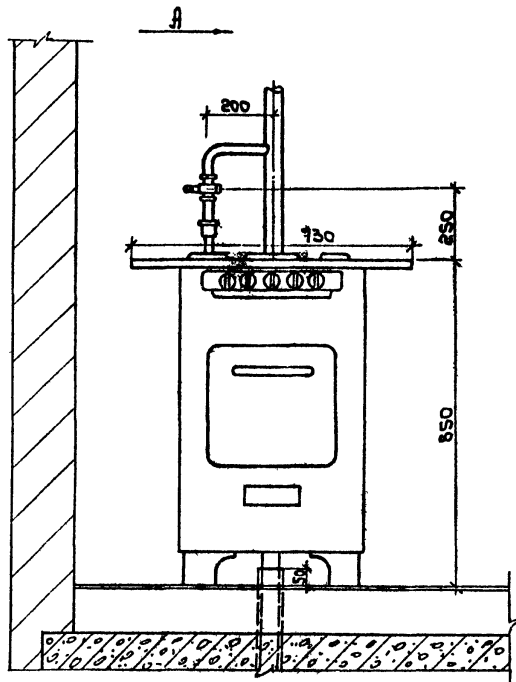


07.29.01

Проектный инс. пункт	Зам. гл. инженер.	<i>Григорьев</i>	Г. Рабкин	Гл. инж. проекта	<i>84</i>	Б. Вайс
Проект пром. вентиляция	Нач. отдела	<i>Григорьев</i>	С. Доморацкий	Рук. группы	<i>Р. Доморацкий</i>	Л. Соломатин
	Гл. специалист	<i>Григорьев</i>	А. Грингауз	Ст. техник	<i>Михайлов</i>	Т. Юшкова


1968

Последовательность рабочих операций при установке плиты.


Установка газовой плиты



Подготовка рабочего места

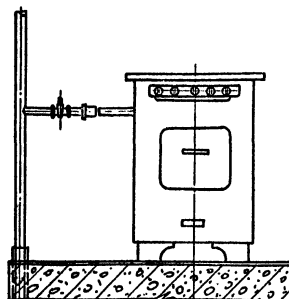

Установка плиты на место с выверкой ее по уровню.

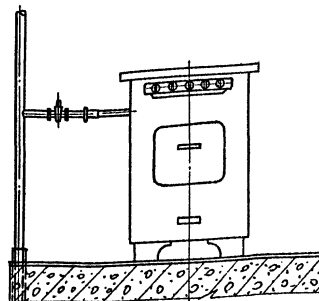

Присоединение газопровода к плите

Примечание:

Зорелки и конфорки устанавливают перед  
пуском газа в плиту

07.29.01

Проектный институт	Зам. гл. инж.	<i>[Signature]</i>	Г. Рабкин	Гл. инж. проекта	<i>[Signature]</i>	Б. Вайс
Проектпроектирования	Нач. отдела	<i>[Signature]</i>	С. Доморацкий	Рук. группы	<i>[Signature]</i>	Л. Соломатин
	Гл. специалист	<i>[Signature]</i>	А. Срингауз	Механик	<i>[Signature]</i>	Л. Стененова

1968

График производства работ

Установка газовой плиты

Л. 04.  
III

07.29.01.

N/N п/п	Операции	Время в чел./час
		1
1	Установка плиты 2-х конфорочной	0,76
2	Установка плиты 4-х конфорочной	0,93

Отпечатано  
в Новосибирском филиале ЦИТИ  
630054 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1  
Выдано в печать: „6“ ноября 1977 г.  
Заказ 2472 Тираж 100
